

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

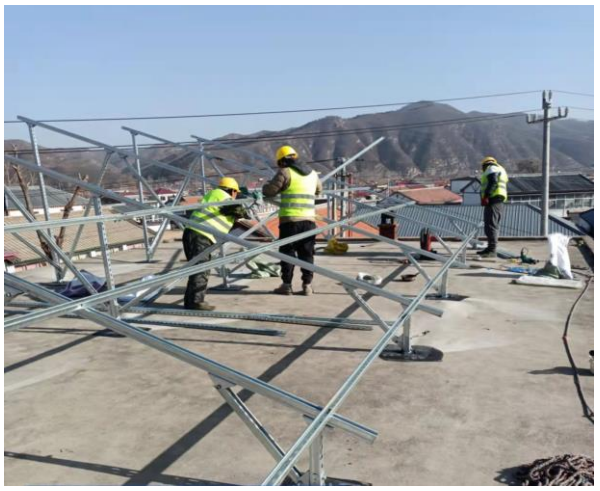
2021 年 11 月第 3 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司		填报周期：2021. 11. 11 至 2021. 11. 17	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、大屯镇支架、组件累计安装完成 62 户；			
2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 128 户；			
3、光伏组件累计到场：			
规格型号		数 量	容 量
455W		106 箱 x31 块/箱=3286 块	1.49513MW
470W		1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
475W		224 箱 x31 块/箱=6944 块	3.2984MW
合计：25.42465MW			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、大屯镇支架、组件安装完成 11 户；			
2、虎什哈镇支架、组件安装完成 12 户。			
三、下周计划主要工作内容			
1、大屯镇支架、组件计划安装 50 户；			
2、虎什哈镇支架、组件计划安装 50 户。			

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时间： 2021 年 11 月 18 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	瓦房支架安装 11 月 11 日星期四	平房支架底座膨胀螺栓拉拔试验 11 月 12 日星期五
照片		

文字描述	平房支架底座防水处理 11月13日星期六	平房屋顶支架安装 11月14日星期日
照片		
文字描述	测量光伏支架镀锌层厚度 11月15日星期一	测量光伏支架镀锌层厚度 11月15日星期一
照片		
文字描述	平房屋顶组件安装完成 11月16日星期二	平房支架底座膨胀螺栓拉拔试验 11月17日星期三
照片		
