

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

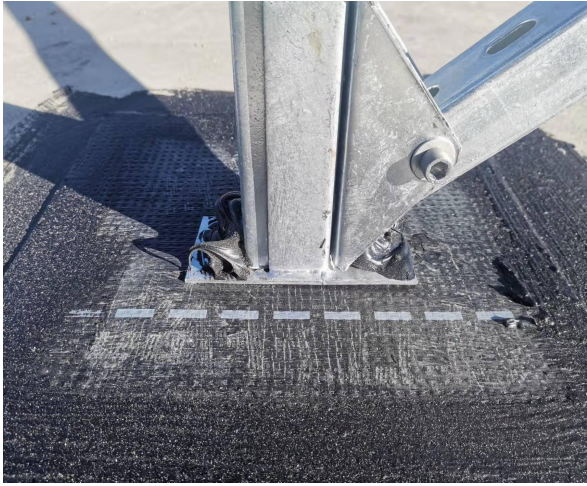
60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2021 年 12 月第 04 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2021. 12. 23 至 2021. 12. 29		
一、项目总体建设进度汇总：			
1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户；			
2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户；			
3、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1. 5015MW
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20. 63112MW
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3. 9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	173 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	97 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	58 台	1028 台
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
大屯镇小城子村平房安装 1 户。			
三、 下周计划主要工作内容			
虎什哈镇、大屯镇计划安装逆变器、并网箱等电气作业 15 户。			

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2021 年 12 月 29 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件存放仓库巡视检查 12 月 23 日星期四	光伏支架底座安装完成 12 月 25 日星期六
照片		

文字描述	光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验 12月26日星期日	光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验 12月26日星期日
照片		
文字描述	光伏支架安装 12月27日星期一	光伏组件安装完成 12月28日星期二
照片		
文字描述	接地极引孔 12月29日星期三	接地极安装 12月29日星期三
照片		
