

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 01 月 14 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	100 天 支架基本安装完成。		
当年完成比例 当前比例	8% 0.8%		
本周下雨天数	0	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、施工前期报审资料提交审核； 2、现场箱变基础测量放样完成； 3、现场配电房柜子摆放位置摸底； 4、6#和 7#楼支墩和支架吊运，7#楼支架安装； 5、第二批预制水泥基础进场 420 套。第二批组件进场 2976 块。		
投资情况	本周完成产值约 29.8 万元。累计完成约 123.60 万元，约占总合同价的 5.68%(按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	下周计划： 1、预制水泥墩、防水卷材、组件和支架进场； 2、屋面减震方案的落实与交底； 3、施工人员进场确认并做好防疫情况登记； 4、春节期间停工和复工时间确定后施工进度计划调整。		
周工作小结	现场新冠疫情防控常态化管理；施工人员安全交底，水泥墩的预制、养护、进场，组件等材料的进场。		
需要协调问题	春节前后的停工和复工具体日期进行确定。根据建设单位意见，节前施工至腊月二十八，节后复工为正月初七。根据这个时间段情况进行施工计划调整。		

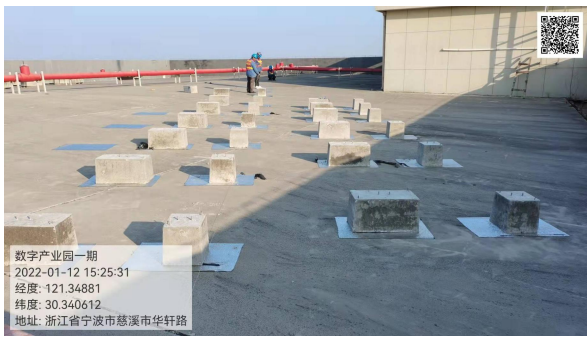
6、目前进度：

- (1) 现场箱变基础测量放样完成；
- (2) 现场电缆井、屋面管线摸底完成；
- (3) 水泥墩预制养护中；组件开始进场；
- (4) 材料、设备供应商资质报审，材料取样与送检；
- (5) 楼顶施工吊运材料开始。

投资情况：上周完成产值约组件 25.45 万元 ($2976 \times 450 \times 1.9$)，支墩 4.35 万元 ($420 \text{套} \times 90 + 164 \times 35$)。累计完成约 123.60 万元，约占总合同价的 5.68% (按合同价 2177.1487 万元计算)

下一步计划：优化施工进度计划，材料和设备供应商资质报审，图纸交底问题汇总，施工人员增加进场和材料进场取样送检，组织安全文明施工。

附现场照片：

文字描述	组件进场	支墩卸货
图片	 数字产业园一期 2022-01-08 14:29:43 经度: 121.348531 纬度: 30.345383 地址: null	 数字产业园一期 2022-01-08 16:04:58 经度: 121.350749 纬度: 30.344565 地址: null
文字描述	定位放线	卷材和支墩安装
图片	 数字产业园一期 2022-01-09 15:21:30 经度: 121.348244 纬度: 30.341127 地址: null	 数字产业园一期 2022-01-12 15:25:31 经度: 121.34881 纬度: 30.340612 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路

文字描述	支墩吊运	支墩吊运
图片	 数字产业园一期 2022-01-12 09:40:01 经度: 121.349106 纬度: 30.340991 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	 数字产业园一期 2022-01-11 12:48:19 经度: 121.348205 纬度: 30.341405 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路
