

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 第一期

项目：南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目		填报周期：2021 年 12 月 27 日—2022 年 01 月 02 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、南通盛世复合材料科技有限公司厂区内屋顶定位放线完成 100%；导轨安装已按图纸设计要求完成约 30%。				
2、电子图已出，纸质版图纸未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	南通盛世复合材料科技有限公司厂区内屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成约 30%。			
6、逆变器及箱变	未开始安装。			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未开始			
9、出图情况	电子图已出，纸质版图纸未见。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件			
	汇流箱	无		
	逆变器			
	并网柜			
	线 缆			
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）6 人/天。吊车一台。			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施工	-	-	-	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题 解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：辛国顺 审核人：_____ 时间：2022年01月02日

工程现场照片（含文字描述）：




项目开工



定位放线



材料吊装

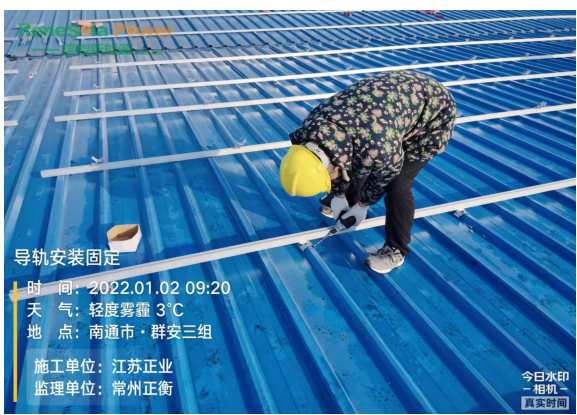

导轨安装固定
