

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第三十三期)

2022. 09. 26-2022. 10. 02



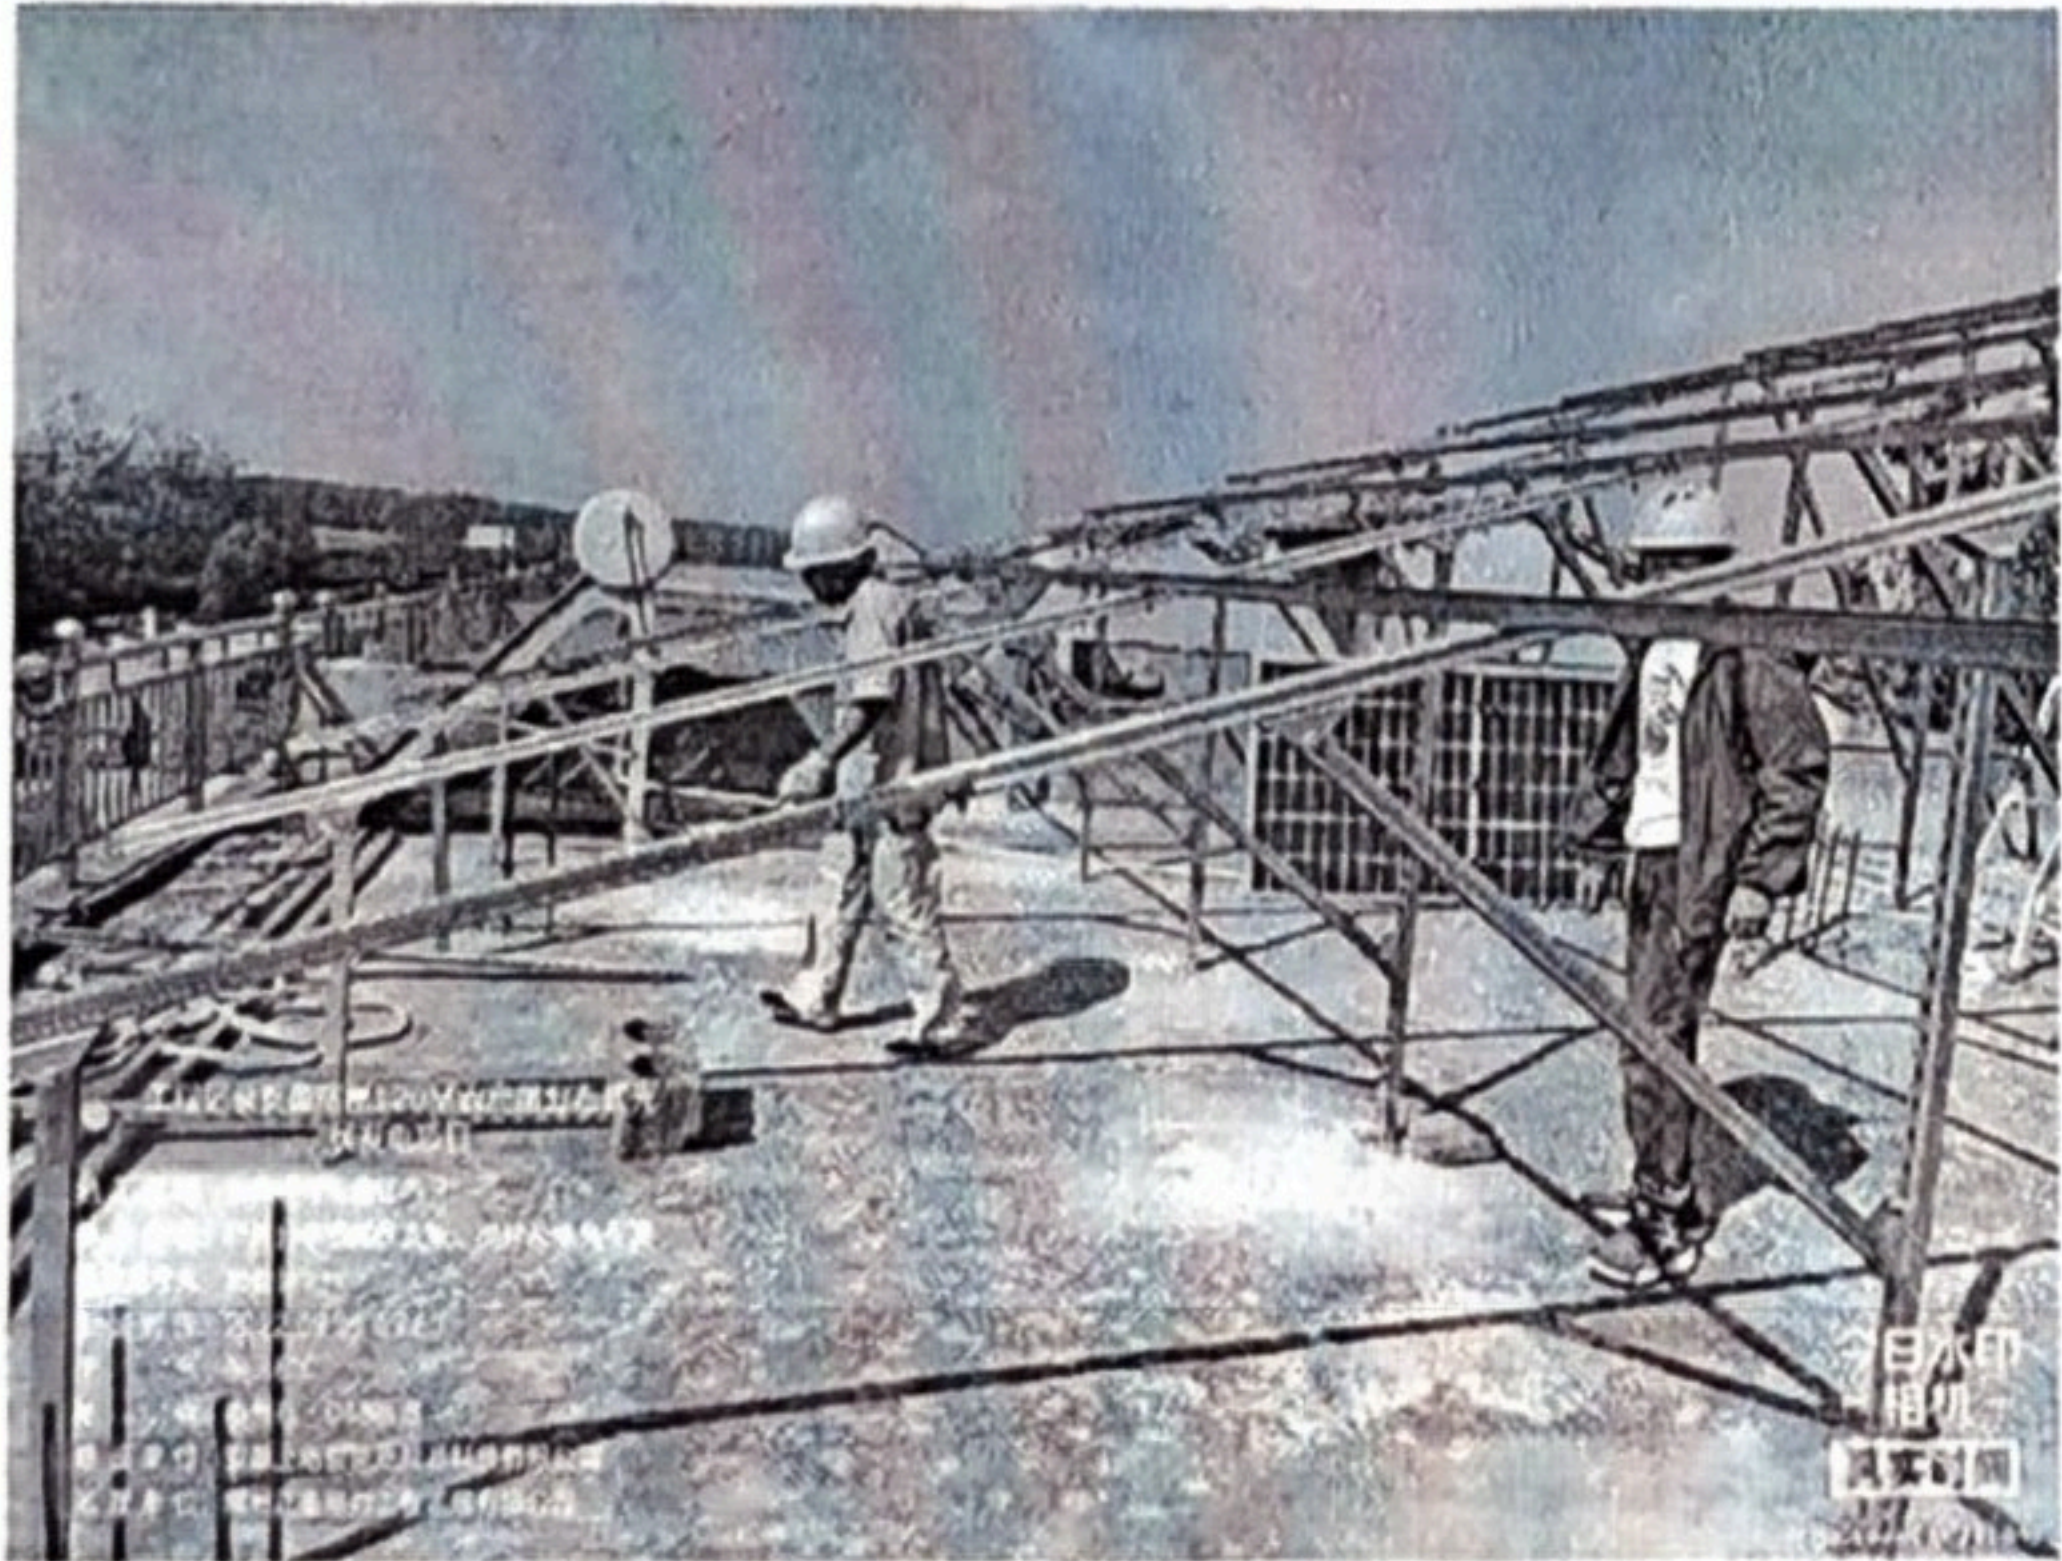
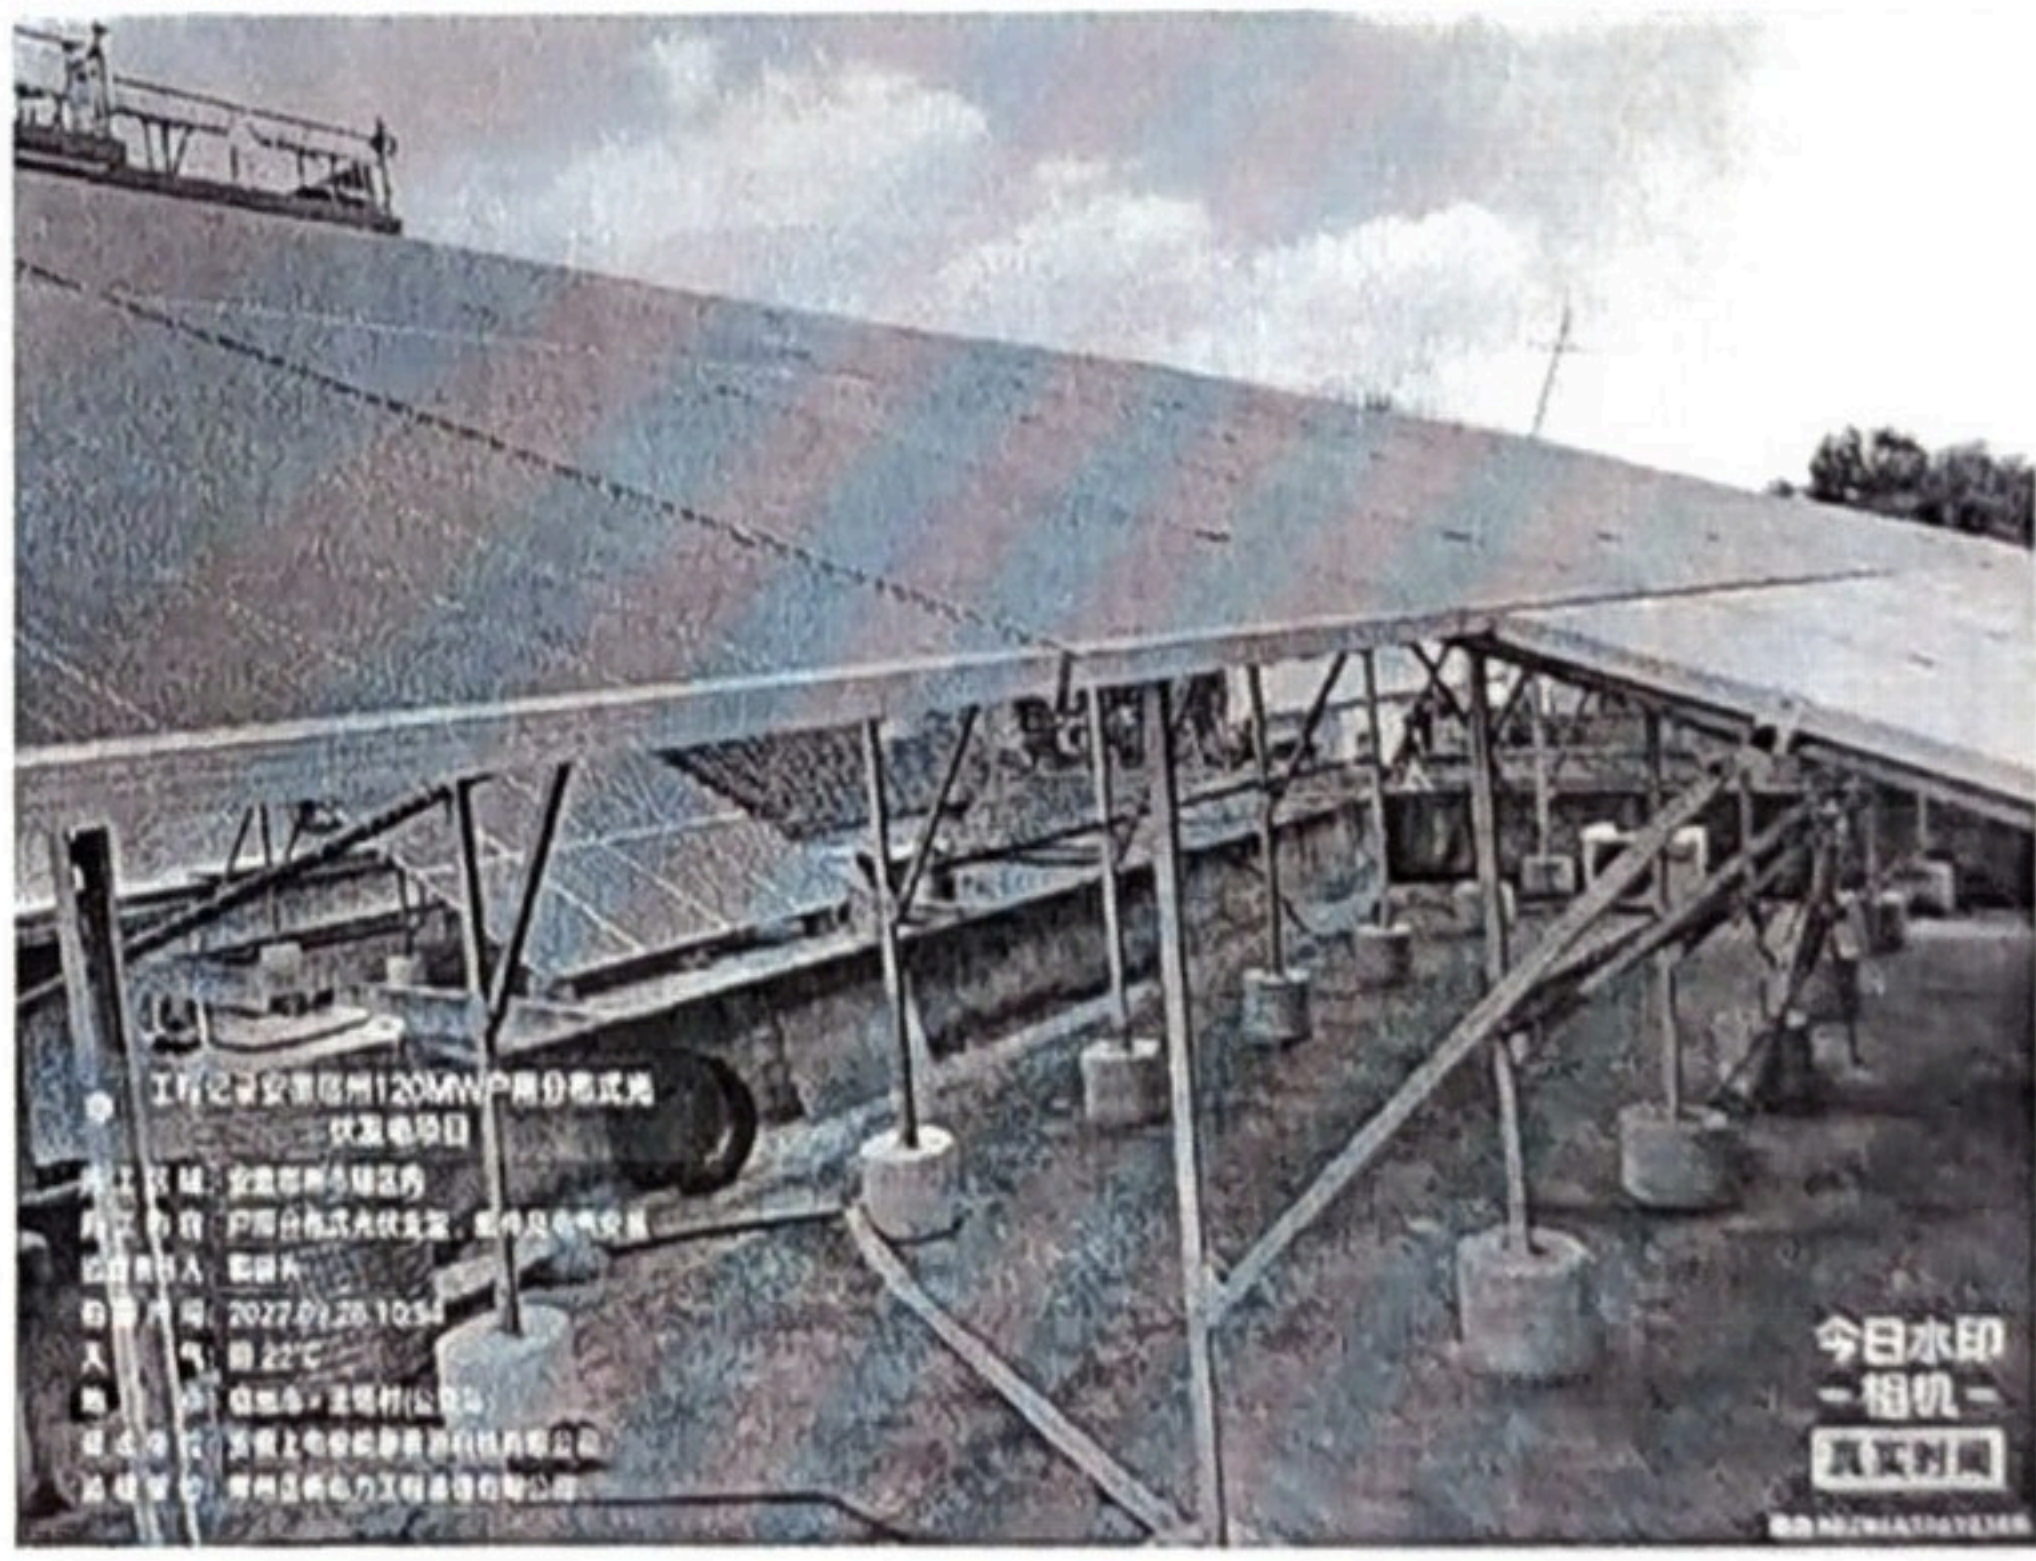
安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 10 月 02 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司		填报周期：2022-9.-26-2022-10-2 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本周完成 103 户，累计安装完成 3669 户，完成率 65.55%。			
2、逆变器、电表箱安装本周完成 100 户，累计安装完成 3534 户，完成率 62.83%。			
3、并网情况:本周并网 2.061MW，累计并网 62.797MW，完成占比 52.33%。			
4、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	中南光电型号 535	片	累计到货 65423 片，累计到货占比 93.46%
组件	亿晶光电型号 540	9504	合同片数 60273，累计到货 20911 片，累计到货占比 37.75%
逆变器		0 台	累计到货 4416 台，累计到货占比 73.60%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	124 吨	累计到货 2561 吨，累计到货占比 66.16%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、 下周计划主要工作内容			
继续全埇桥区.灵璧县.泗县.砀山县光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

