

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第三十六期)

2022. 10. 17-2022. 10. 23



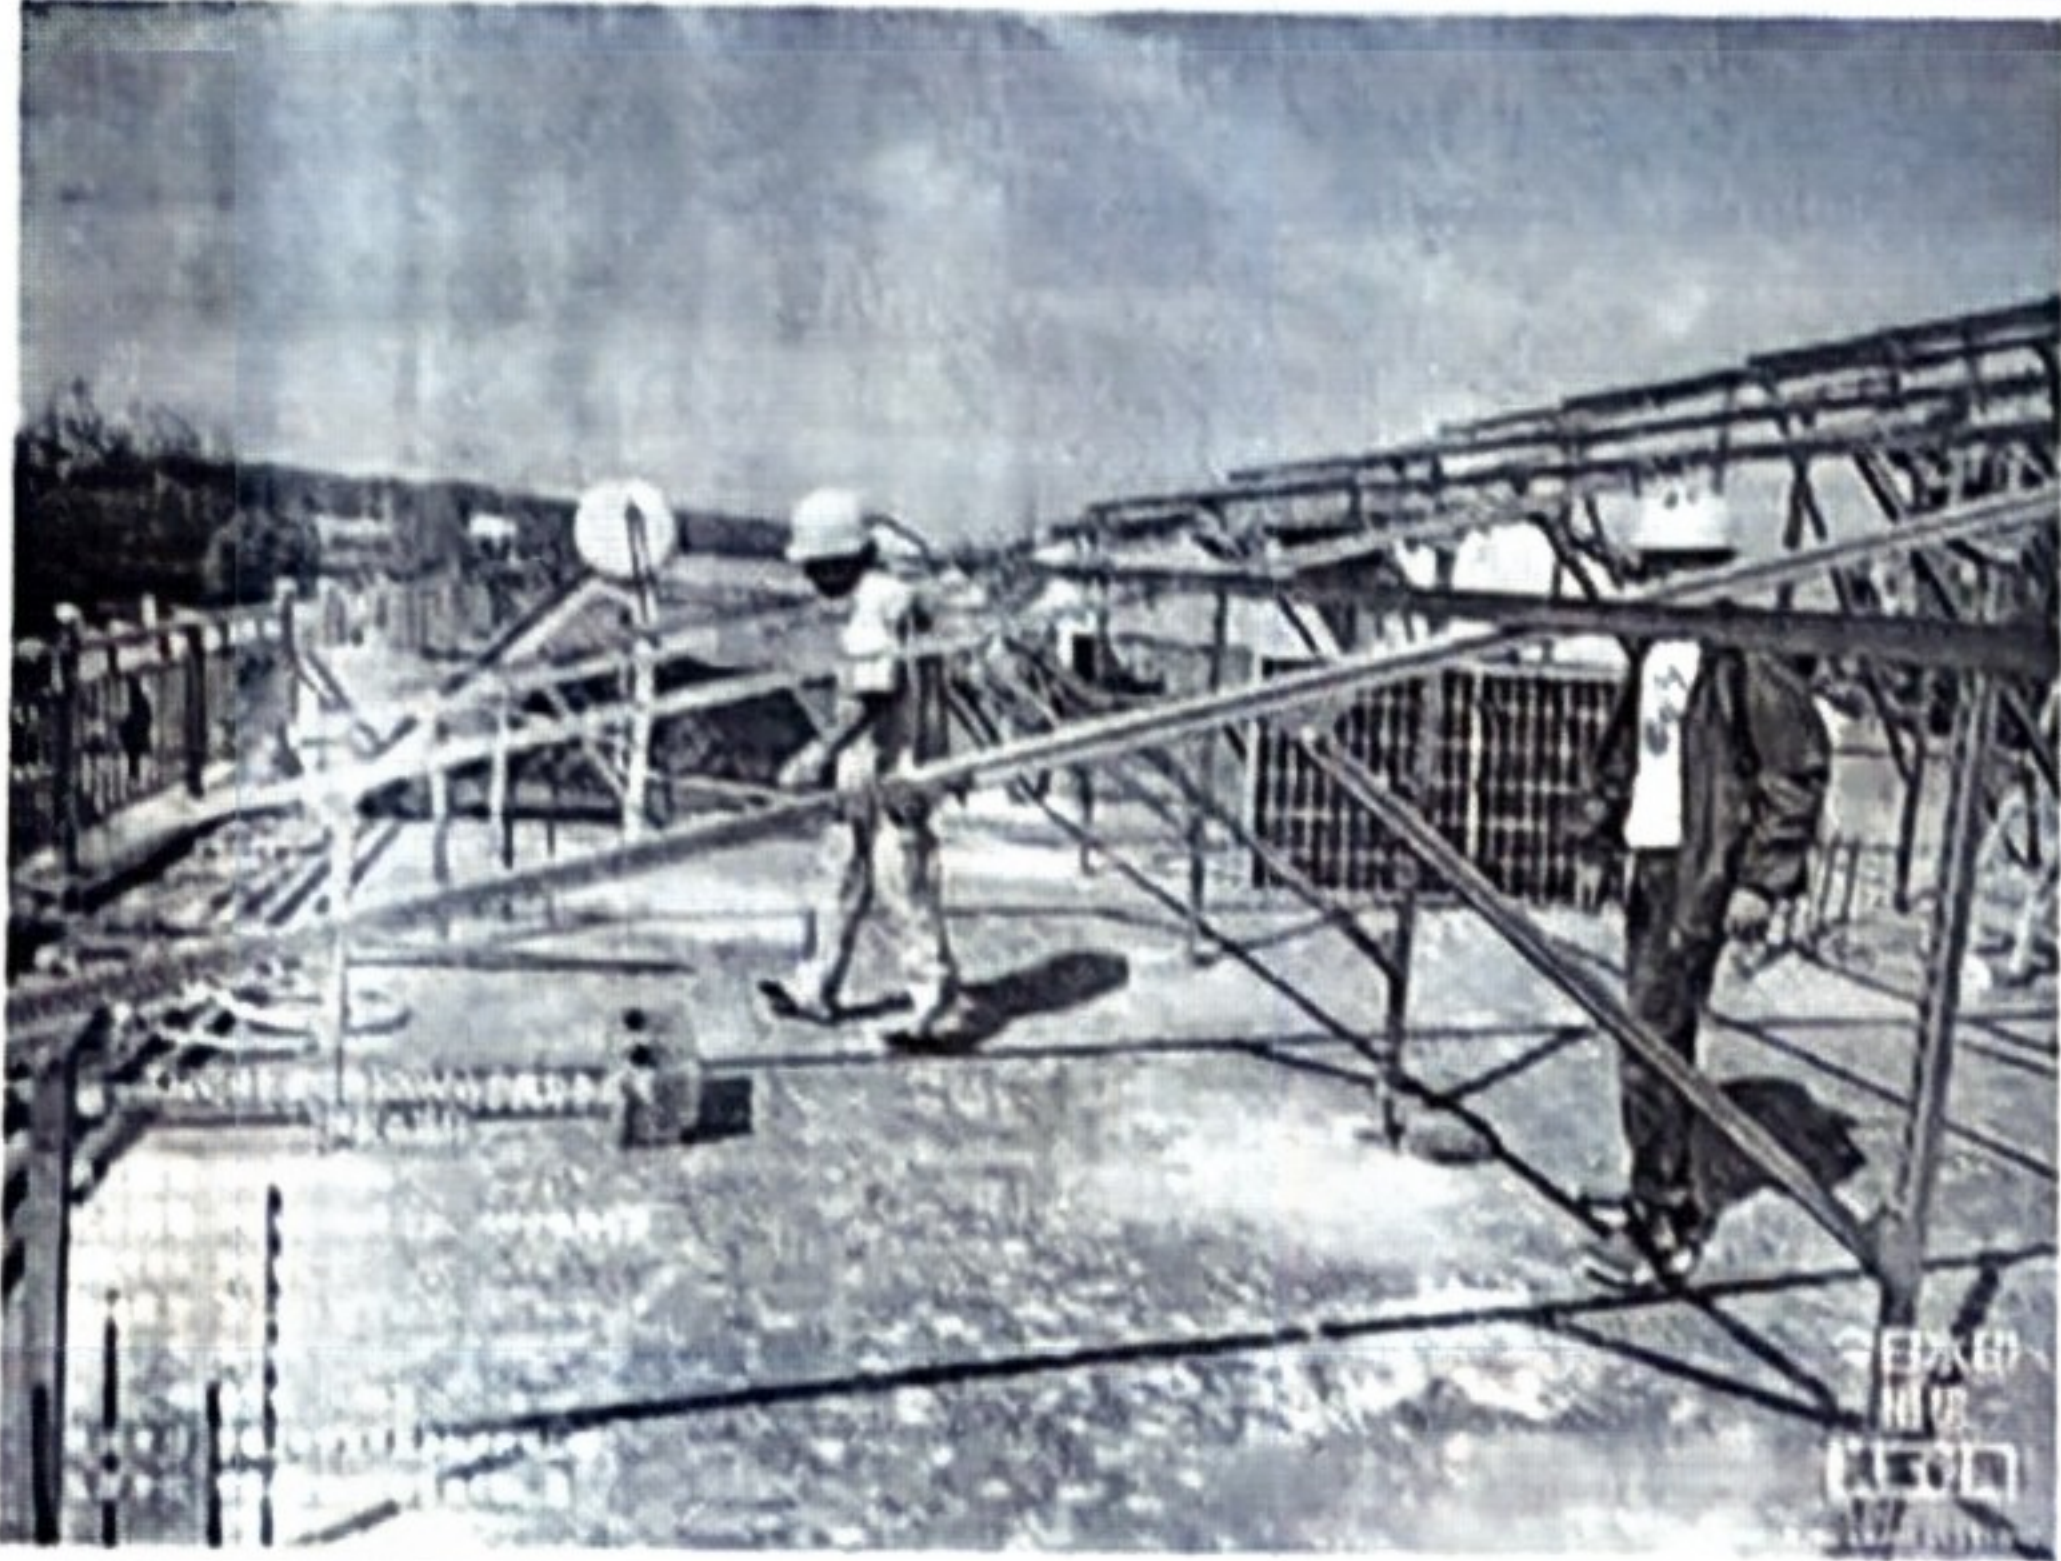
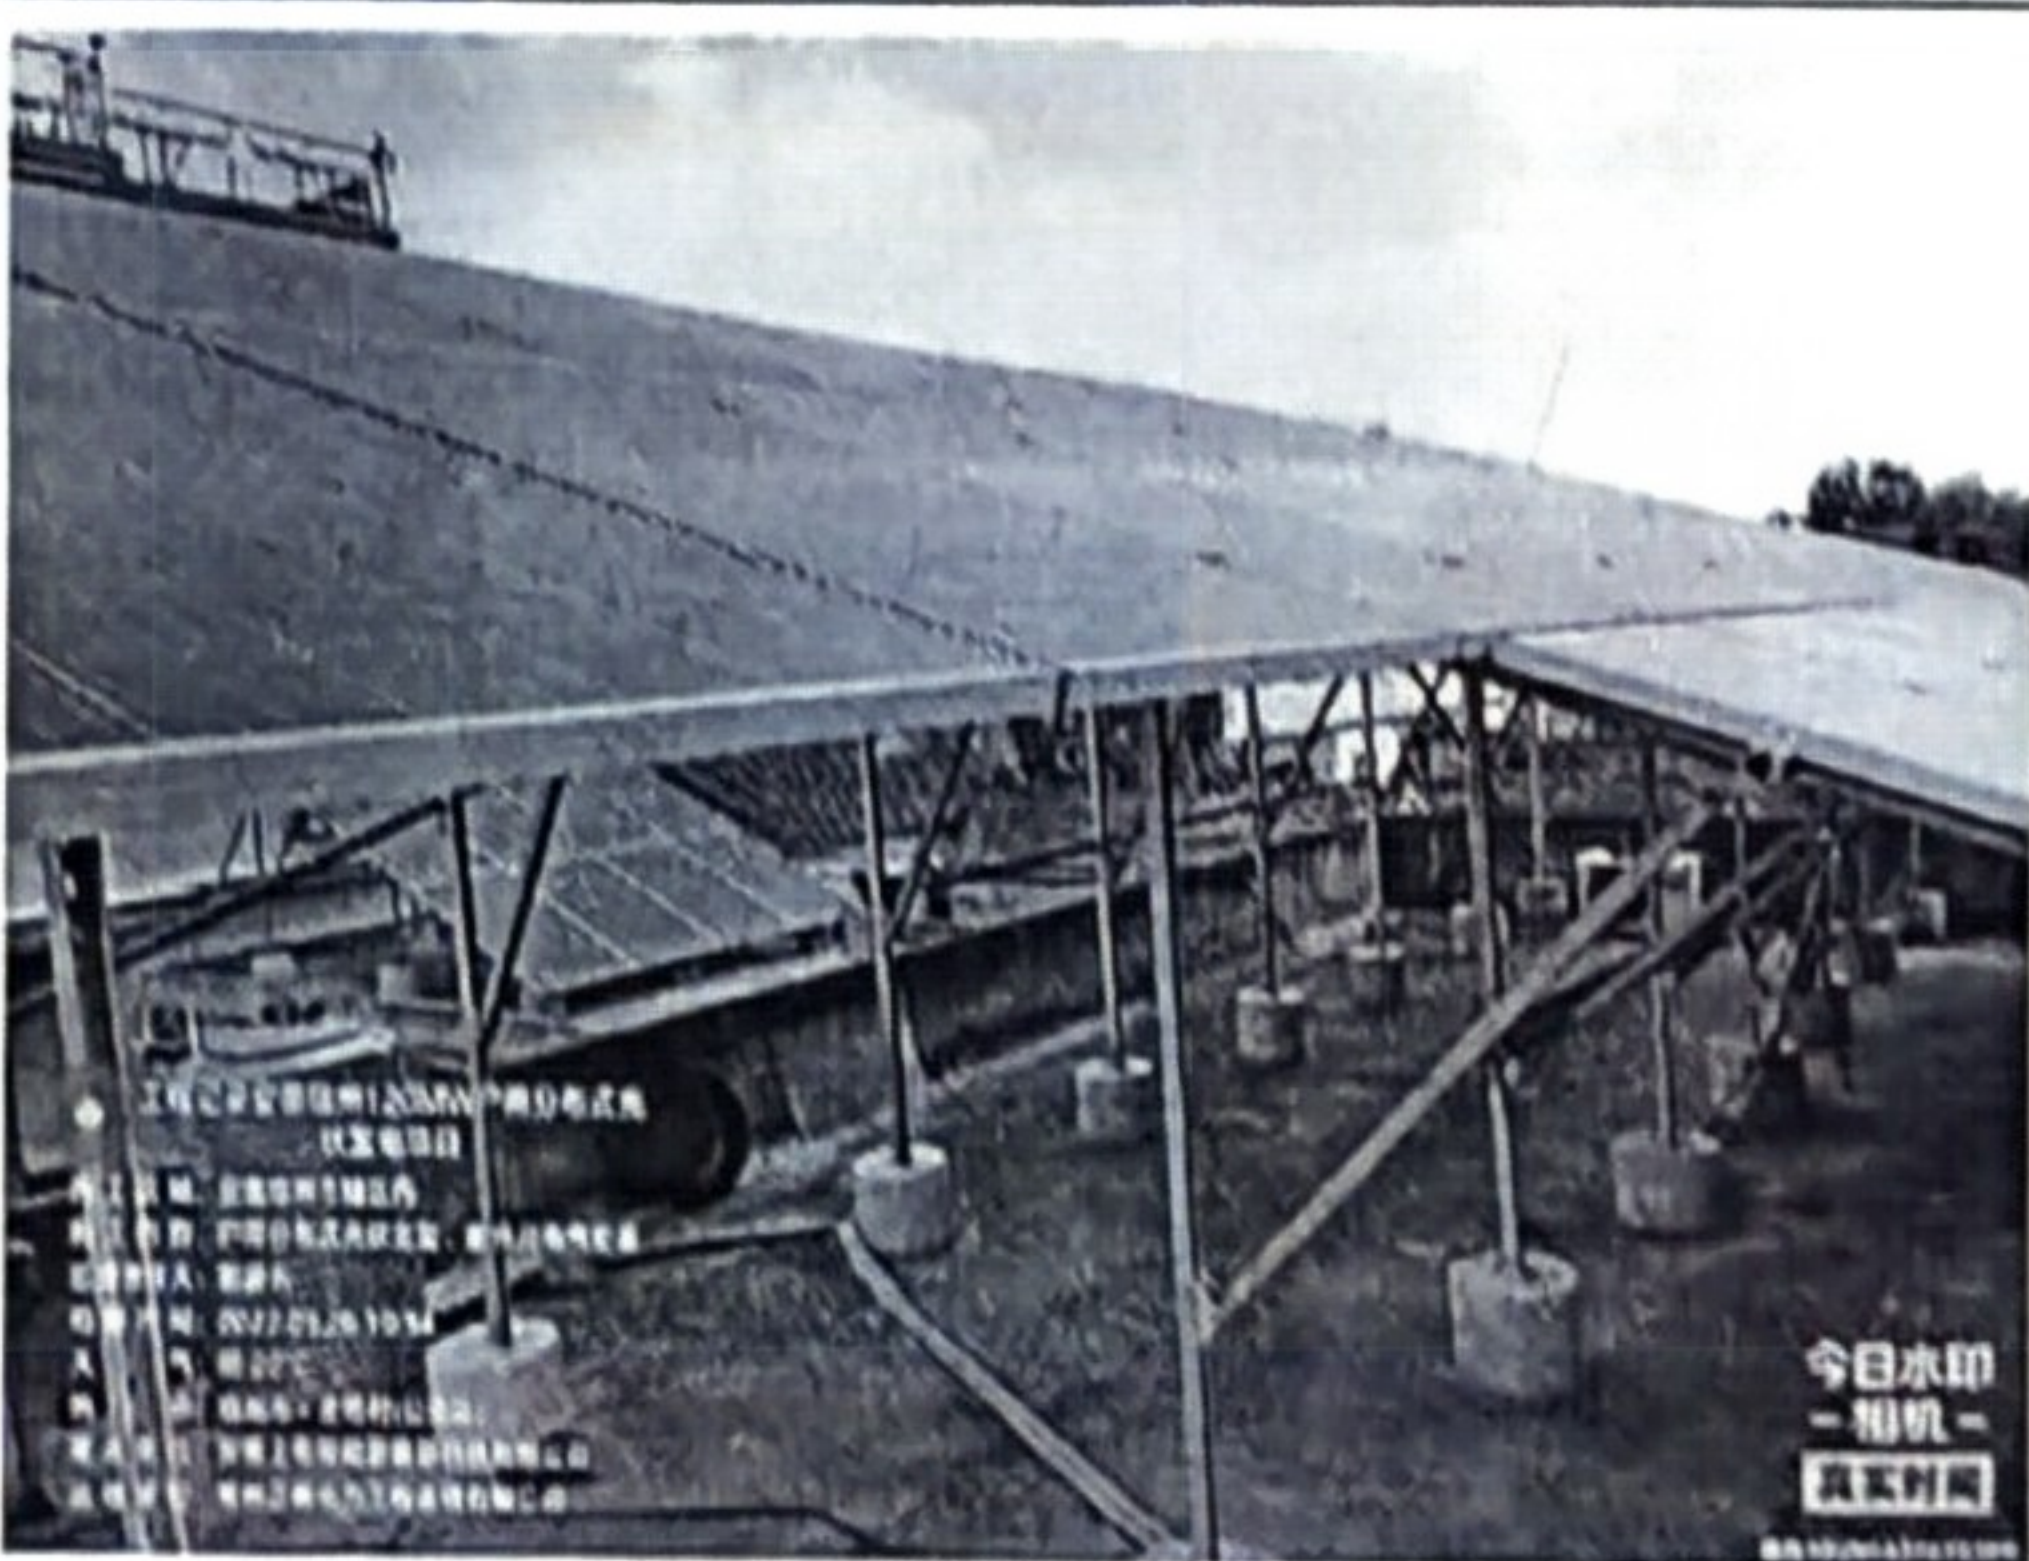
安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

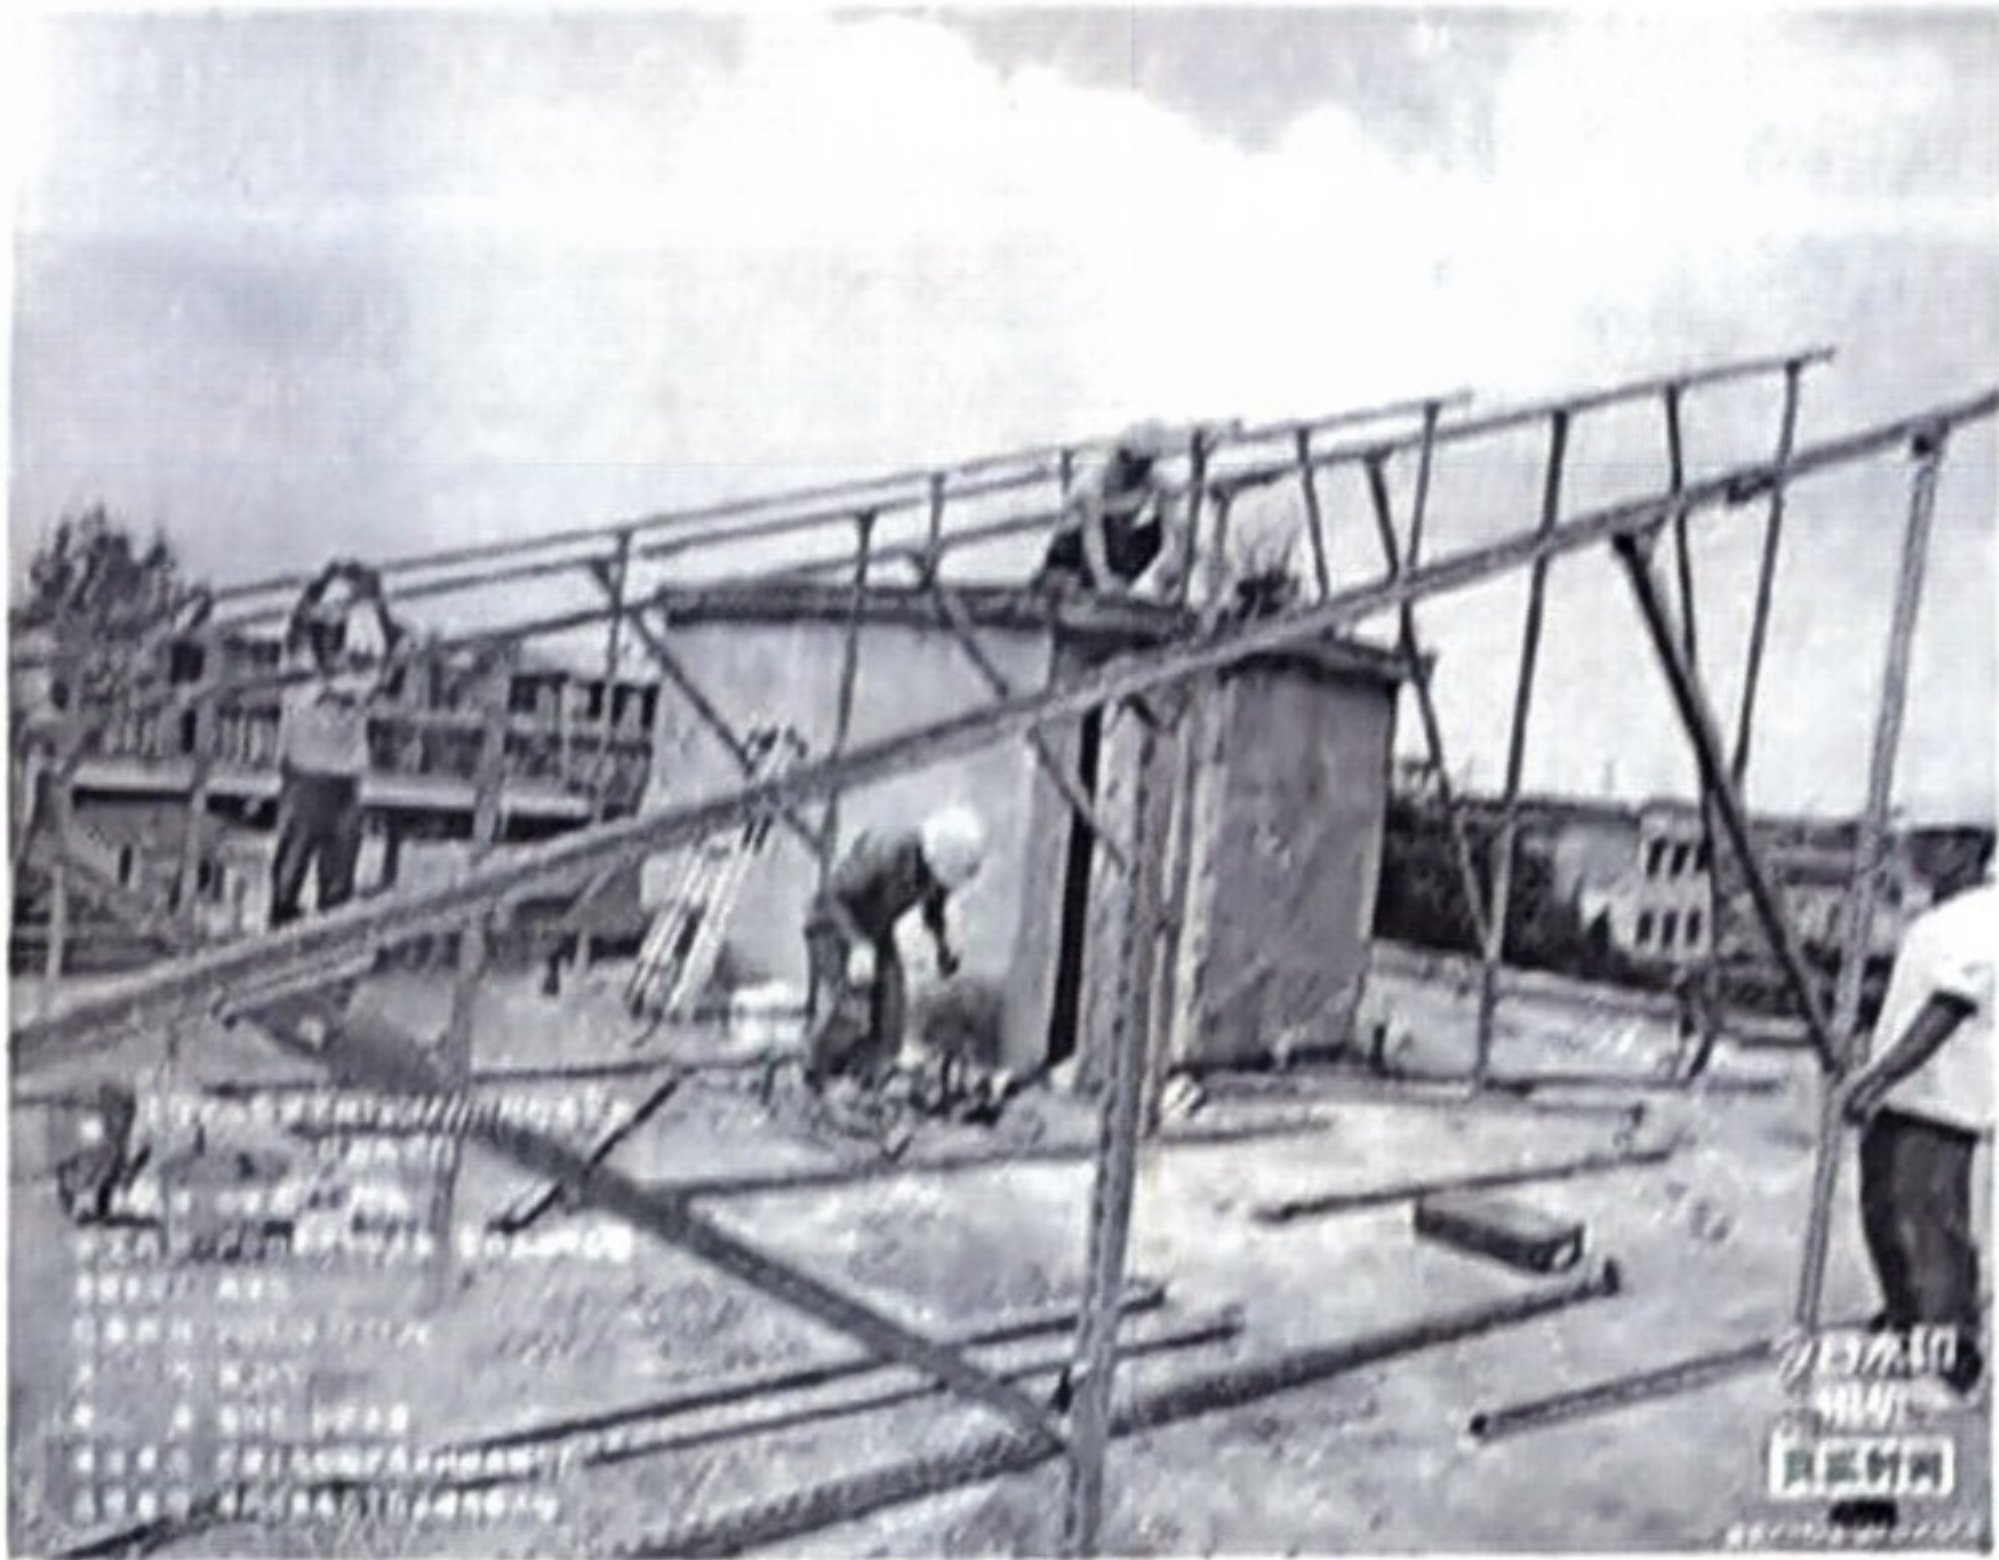
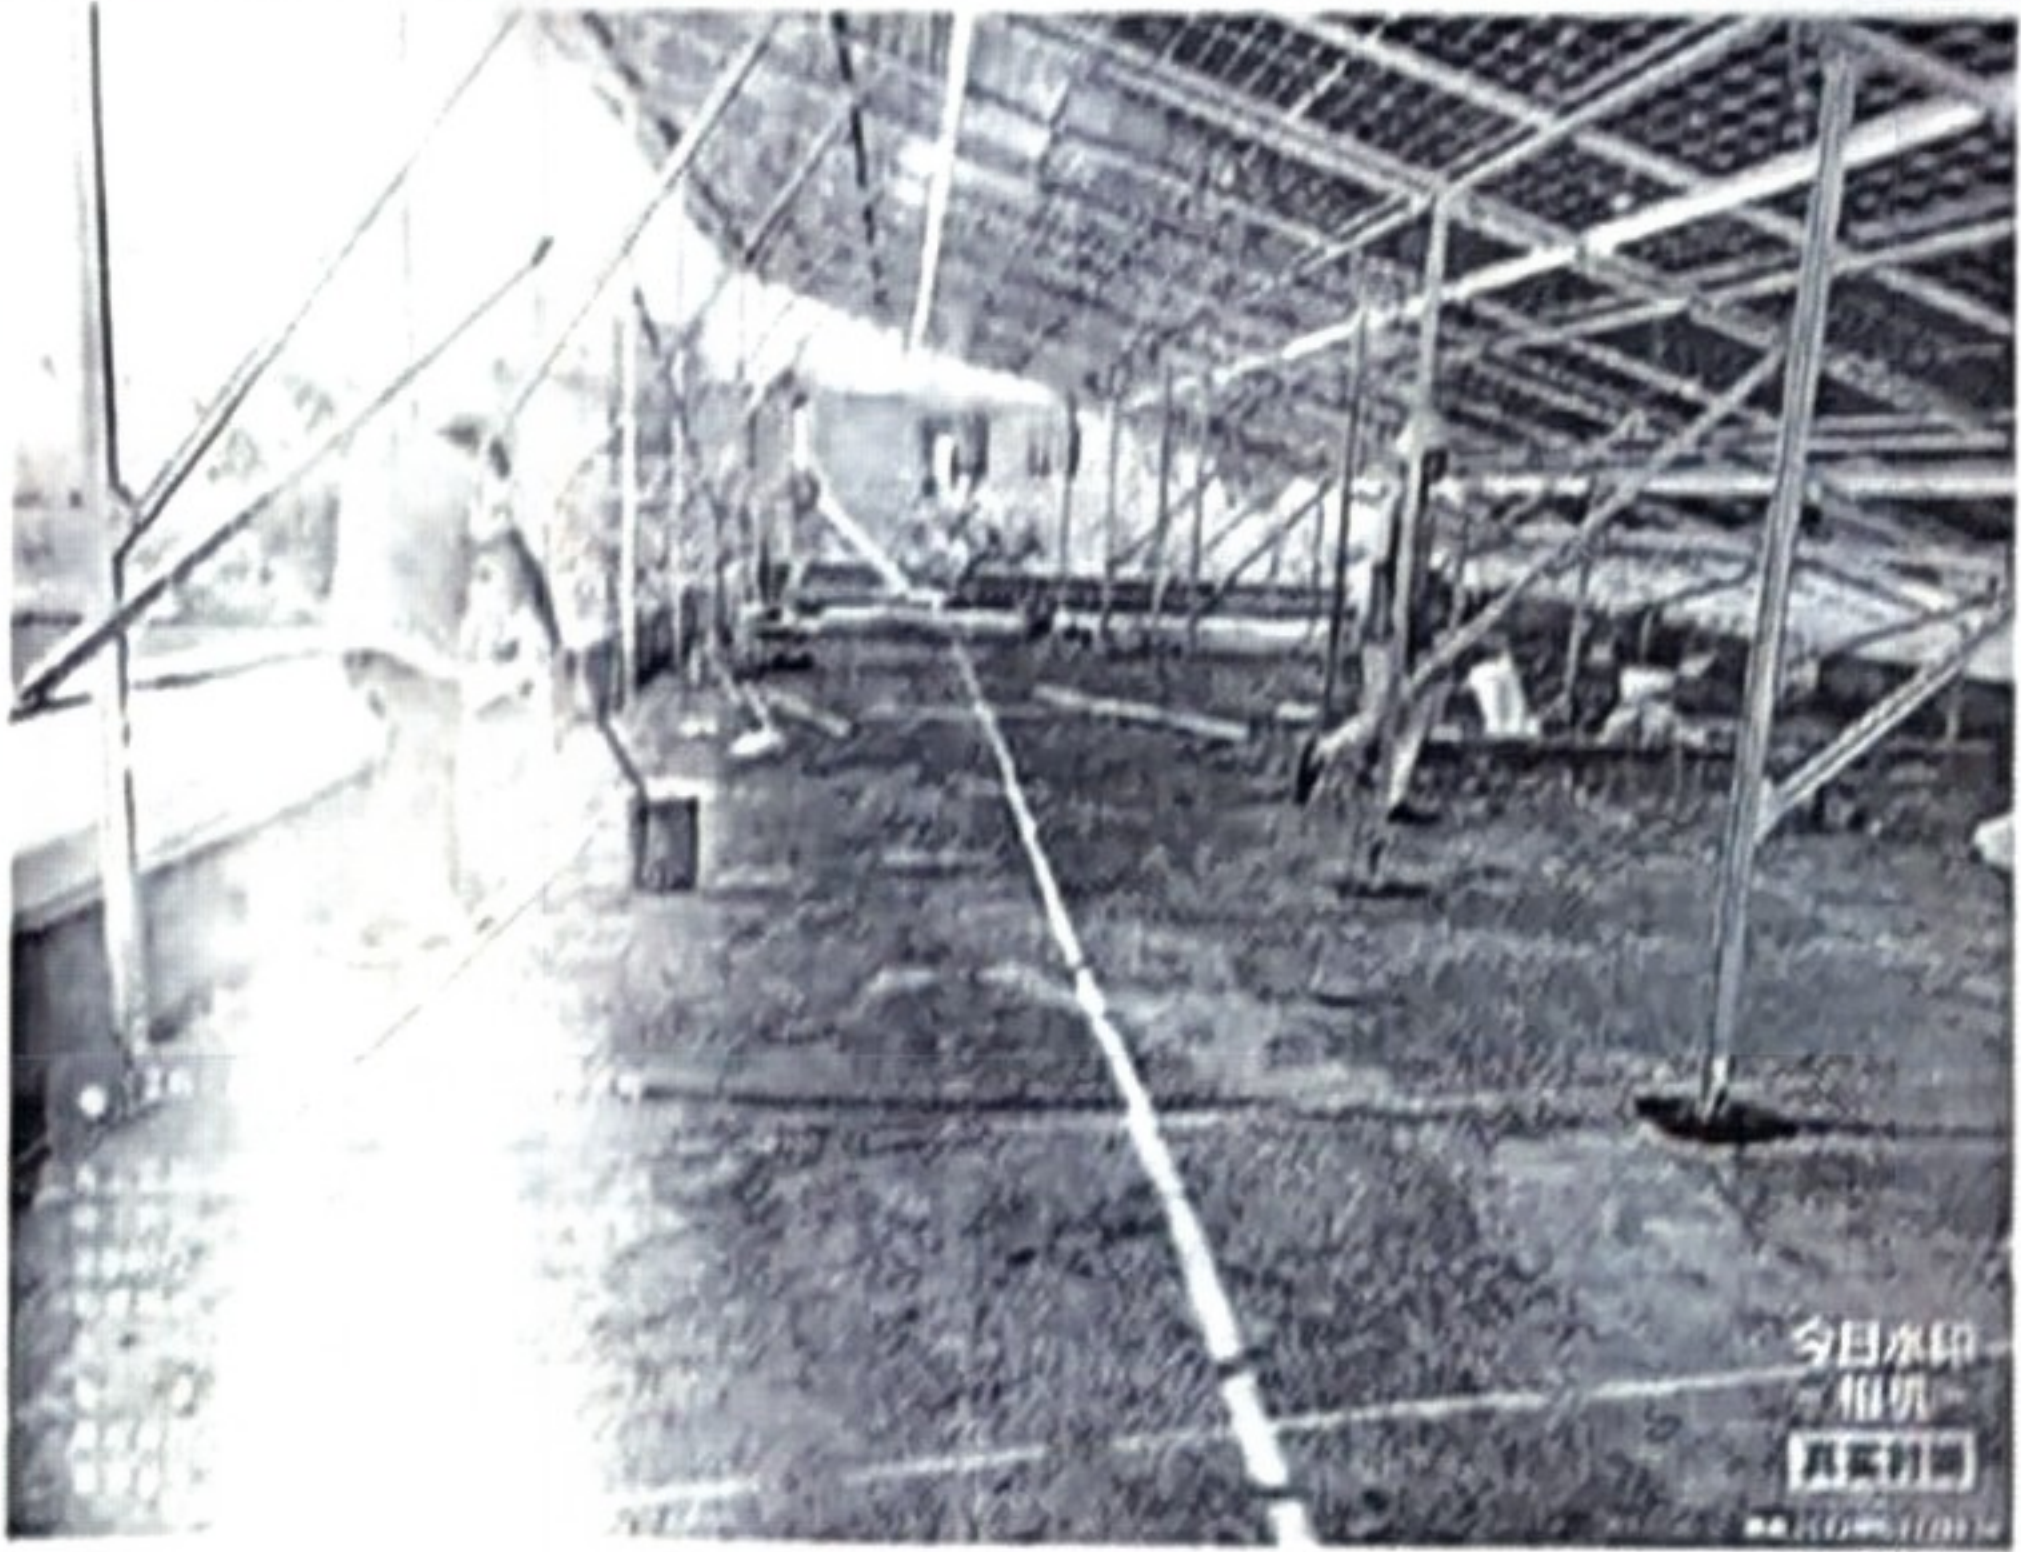
2022 年 10 月 23 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司		填报周期：2022-10.-17-2022-10-23 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本周完成 139 户，累计安装完成 3913 户，完成率 70.06%。			
2、逆变器、电表箱安装本周完成 99 户，累计安装完成 3624 户，完成率 66.42%。			
3、并网情况：本周并网 0.913MW，累计并网 66.229MW，完成占比 55.19%。			
4、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	中南光电型号 535	片	累计到货 65423 片，累计到货占比 93.46%
组件	亿晶光电型号 540	7990 片	合同片数 60273，累计到货 28901 片，累计到货占比 51%
逆变器		0 台	累计到货 4416 台，累计到货占比 73.60%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	6 5 吨	累计到货 2686 吨，累计到货占比 67.85%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、下周计划主要工作内容			
继续全埔桥区、灵璧县、泗县、砀山县光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
