

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第二十五期)

2022. 7. 31-2022. 08. 06



安徽宿州 120MWp 户用分布式用光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 8 月 6 日

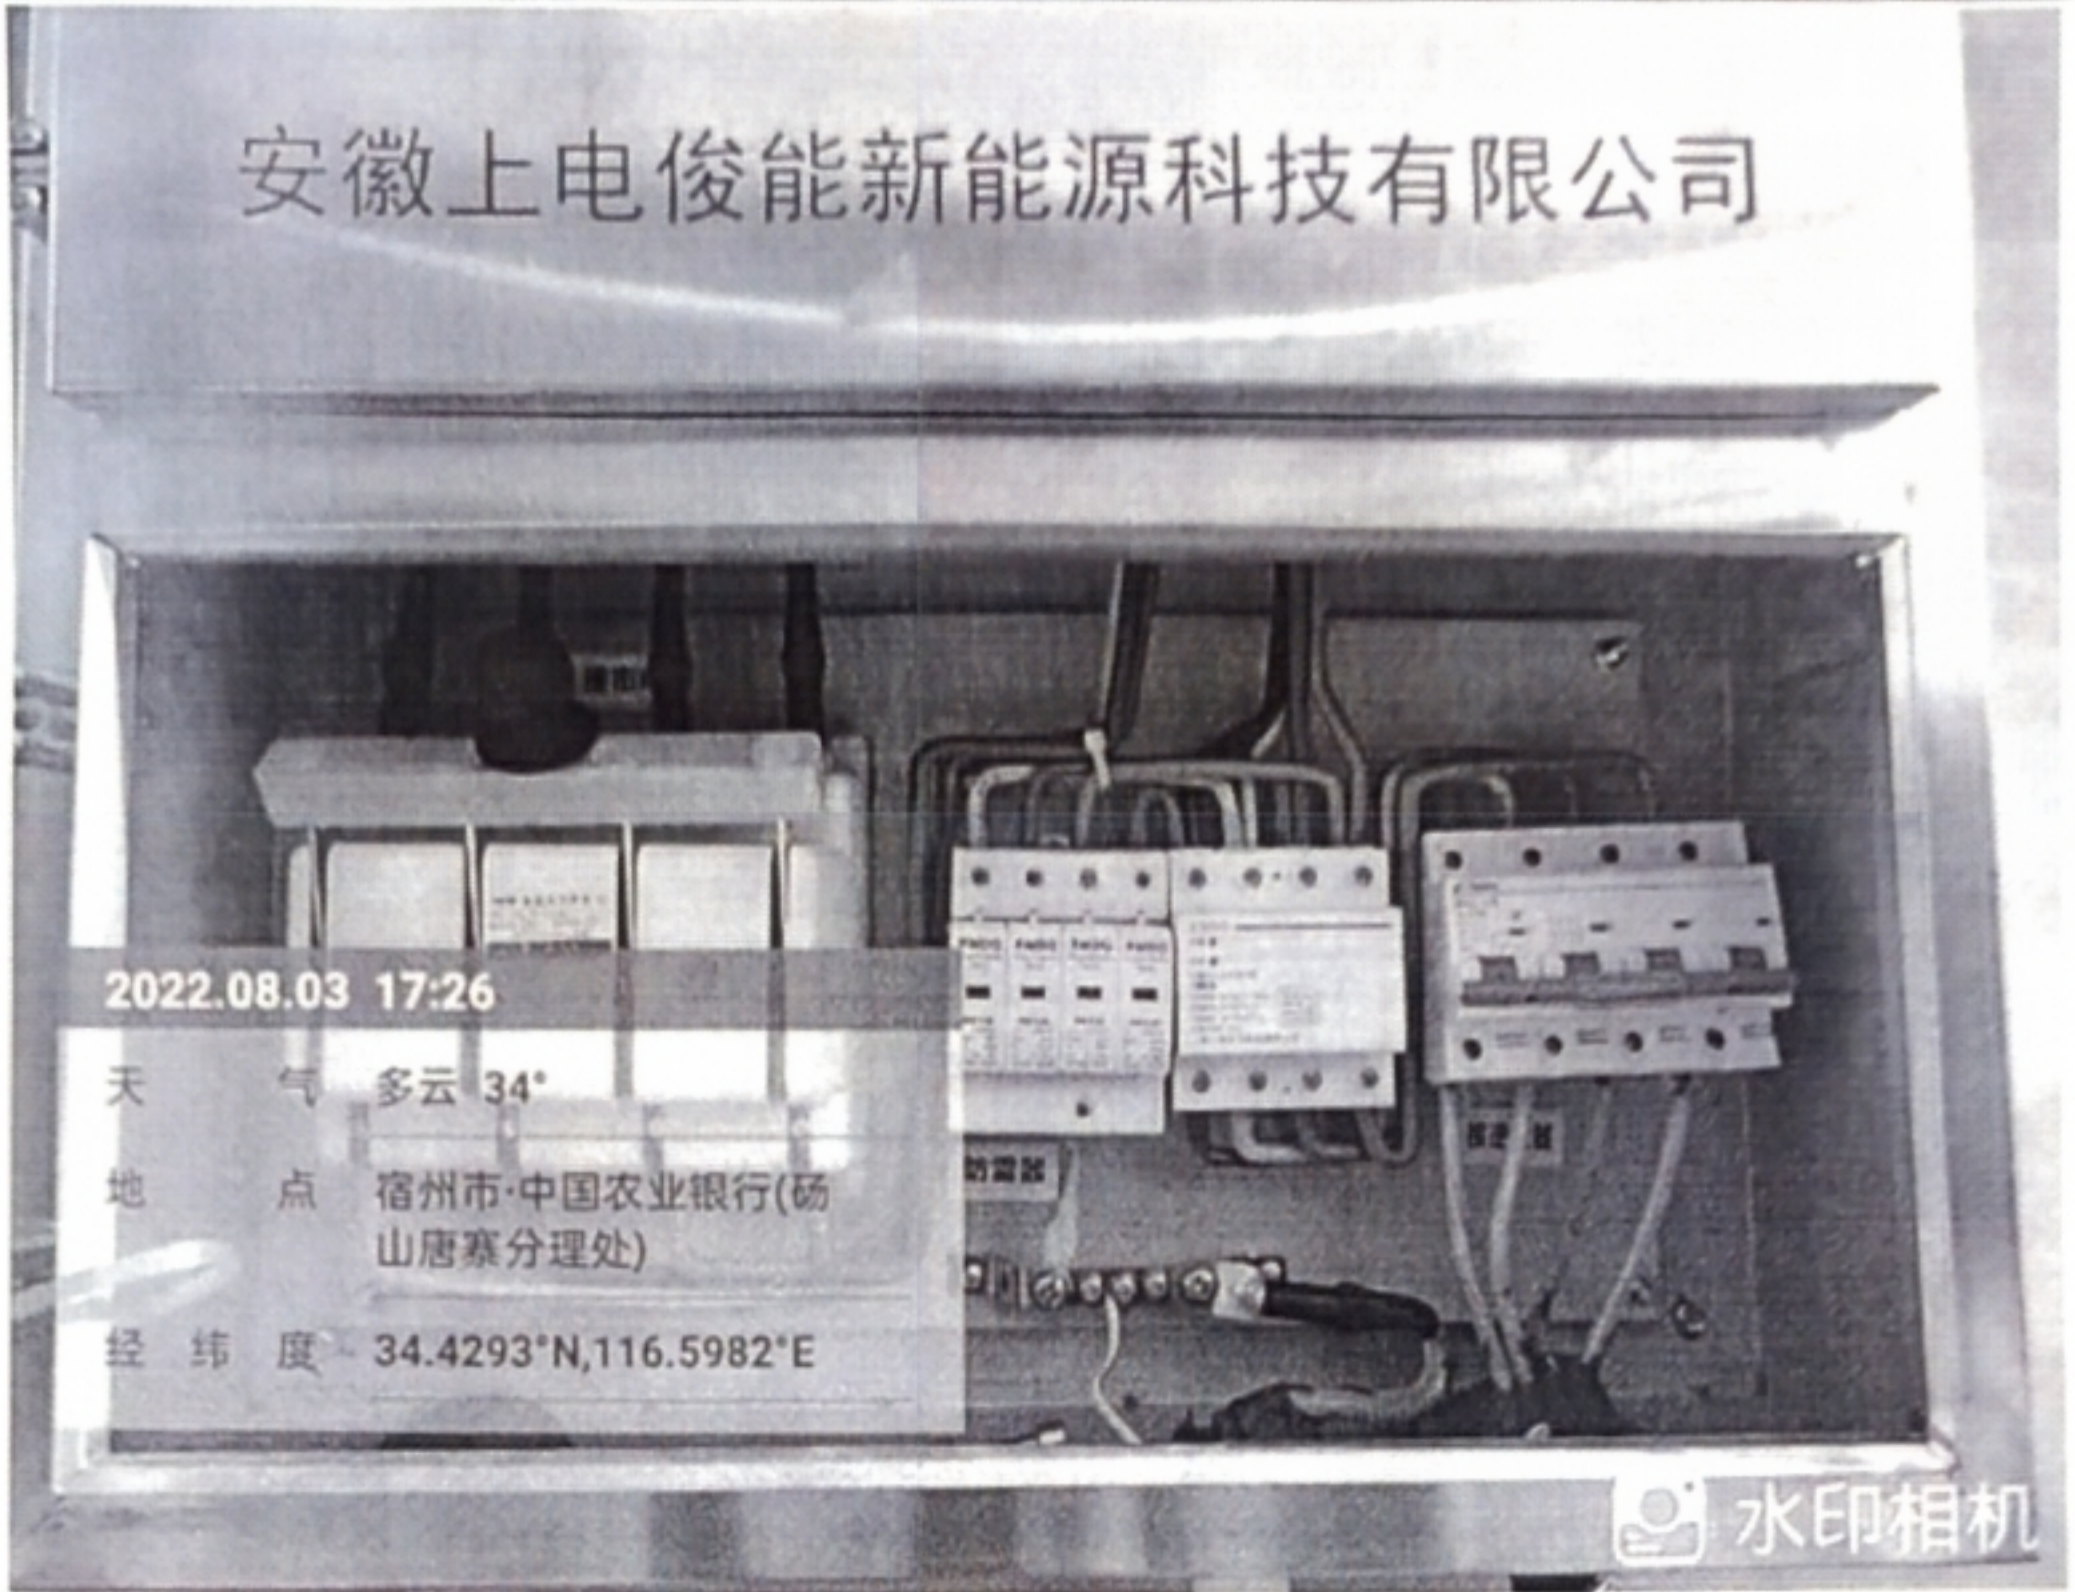
安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022.07.31 至 2022.08.06																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、宿州市支架、组件累计安装完成 3089 户； 2、本周光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">名 称</th> <th style="width: 25%;">规格型号</th> <th style="width: 25%;">数 量</th> <th style="width: 35%;">备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>540w</td> <td>0 块</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>535w</td> <td>0 块</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>0 吨</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>0 台</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	540w	0 块	/	组件	535w	0 块	/	支架		0 吨	/	逆变器		0 台	/
名 称	规格型号	数 量	备 注																		
组件	540w	0 块	/																		
组件	535w	0 块	/																		
支架		0 吨	/																		
逆变器		0 台	/																		
二、本周工程建设工作内容及完成情况 宿州市光伏支架和组件安装完成 14 户。																					
三、 下周计划主要工作内容 1. 宿州下周预计到达班组共计约 15 组，60 人（含支架、组件、电器安装人员）； 2. 宿州市计划安装 50 户，约 1.2mw； 3. 宿州市下周材料使用情况：组件约 2200 片，支架约 35 吨，逆变器 50 台，线缆约 1500 米； 4. 宿州市逆变器、并网箱计划安装 50 户； 5. 宿州市计划并网发电约 50 户，约 1.2mw。																					

填报人： 刘曼曼 审核人： 李平 时 间： 2022 年 8 月 06 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件安装完成
照片	

文字描述	表箱内部封堵
照片	 安徽上电俊能新能源科技有限公司 2022.08.03 17:26 天气 多云 34° 地点 宿州市·中国农业银行(杨山唐寨分理处) 经纬度 34.4293°N,116.5982°E 水印相机
文字描述	接地测试
照片	 2-2000 ICIOR 4105A Digital Earth Tester 2.00 2022.08.03 17:18 天气 晴 34° 地点 宿州市·中国农业银行(杨山唐寨分理处) 经纬度 34.4292°N,116.5986°E

文字描述	电器安装完成
照片	 2022.08.03 17:35 天 气 多云 34° 地 点 宿州市·中国农业银行(碭山唐寨分理处) 经 纬 度 34.4292°N,116.5987°E 水印相机
文字描述	电器安装完成检测
照片	 2022.08.03 17:30 天 气 多云 34° 地 点 宿州市·中国农业银行(碭山唐寨分理处) 经 纬 度 34.4293°N,116.5984°E 水印相机
