

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第二十八期)

2022. 8. 21-2022. 08. 27



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 8 月 30 日

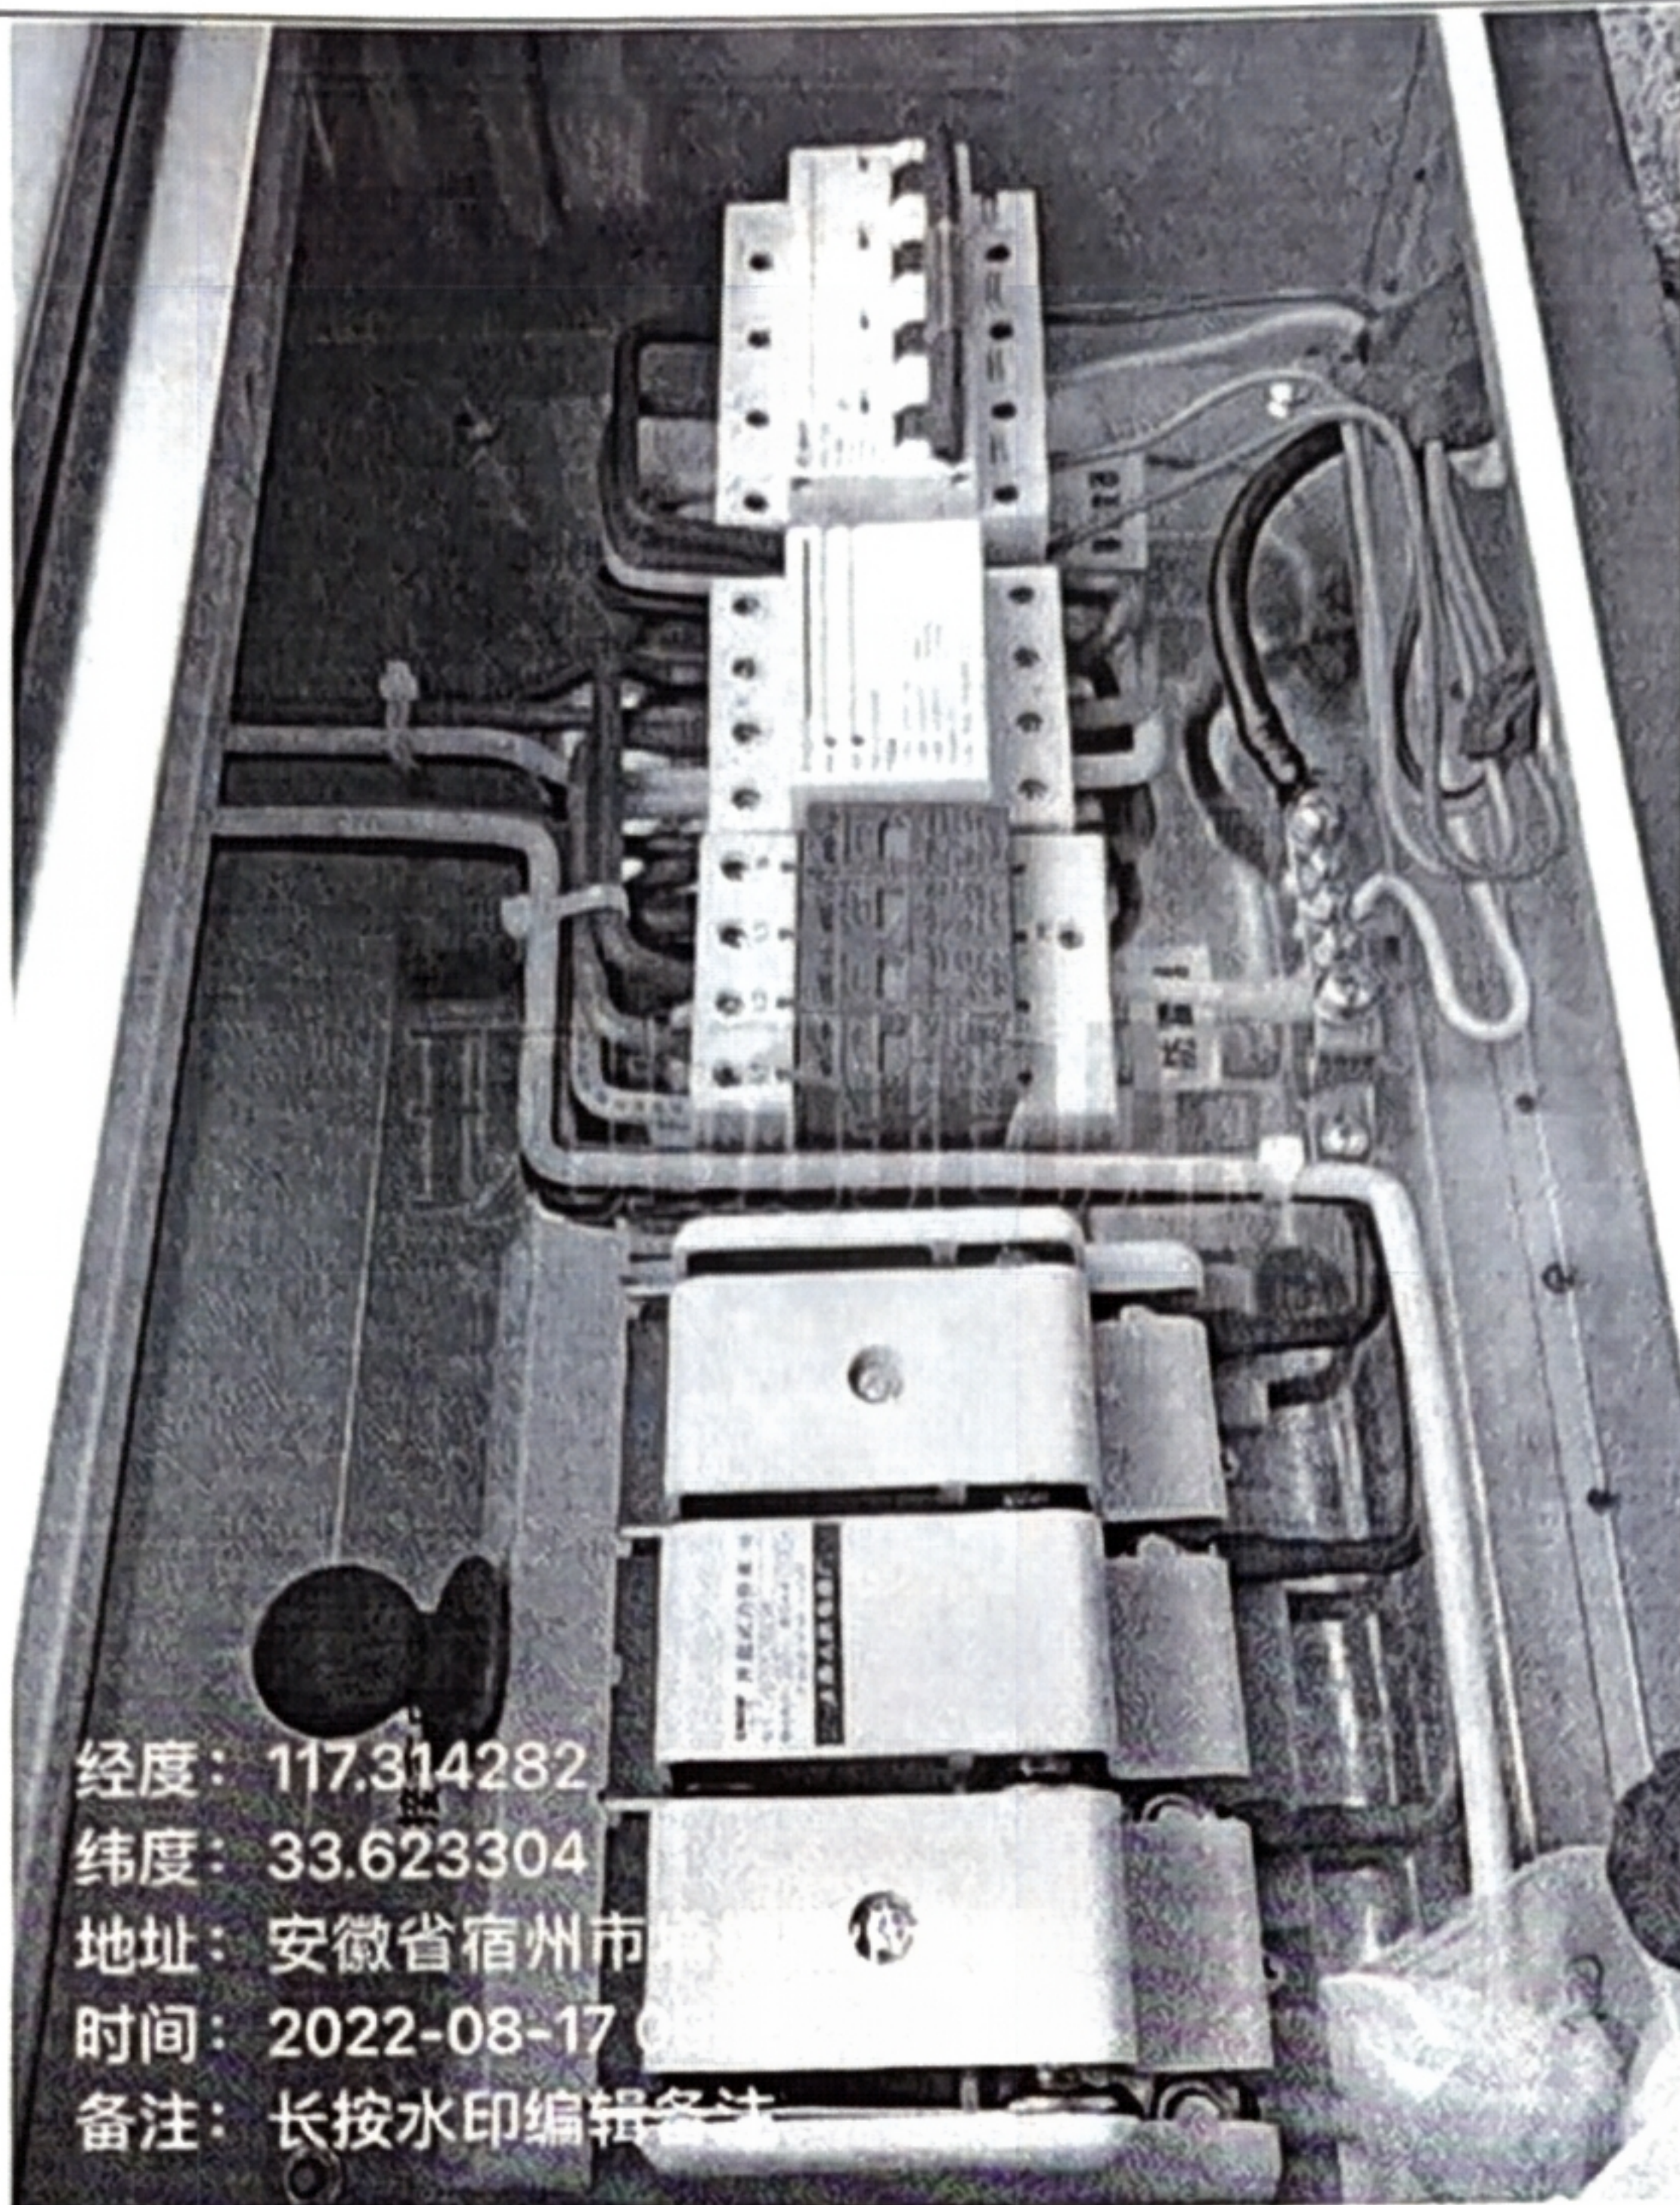
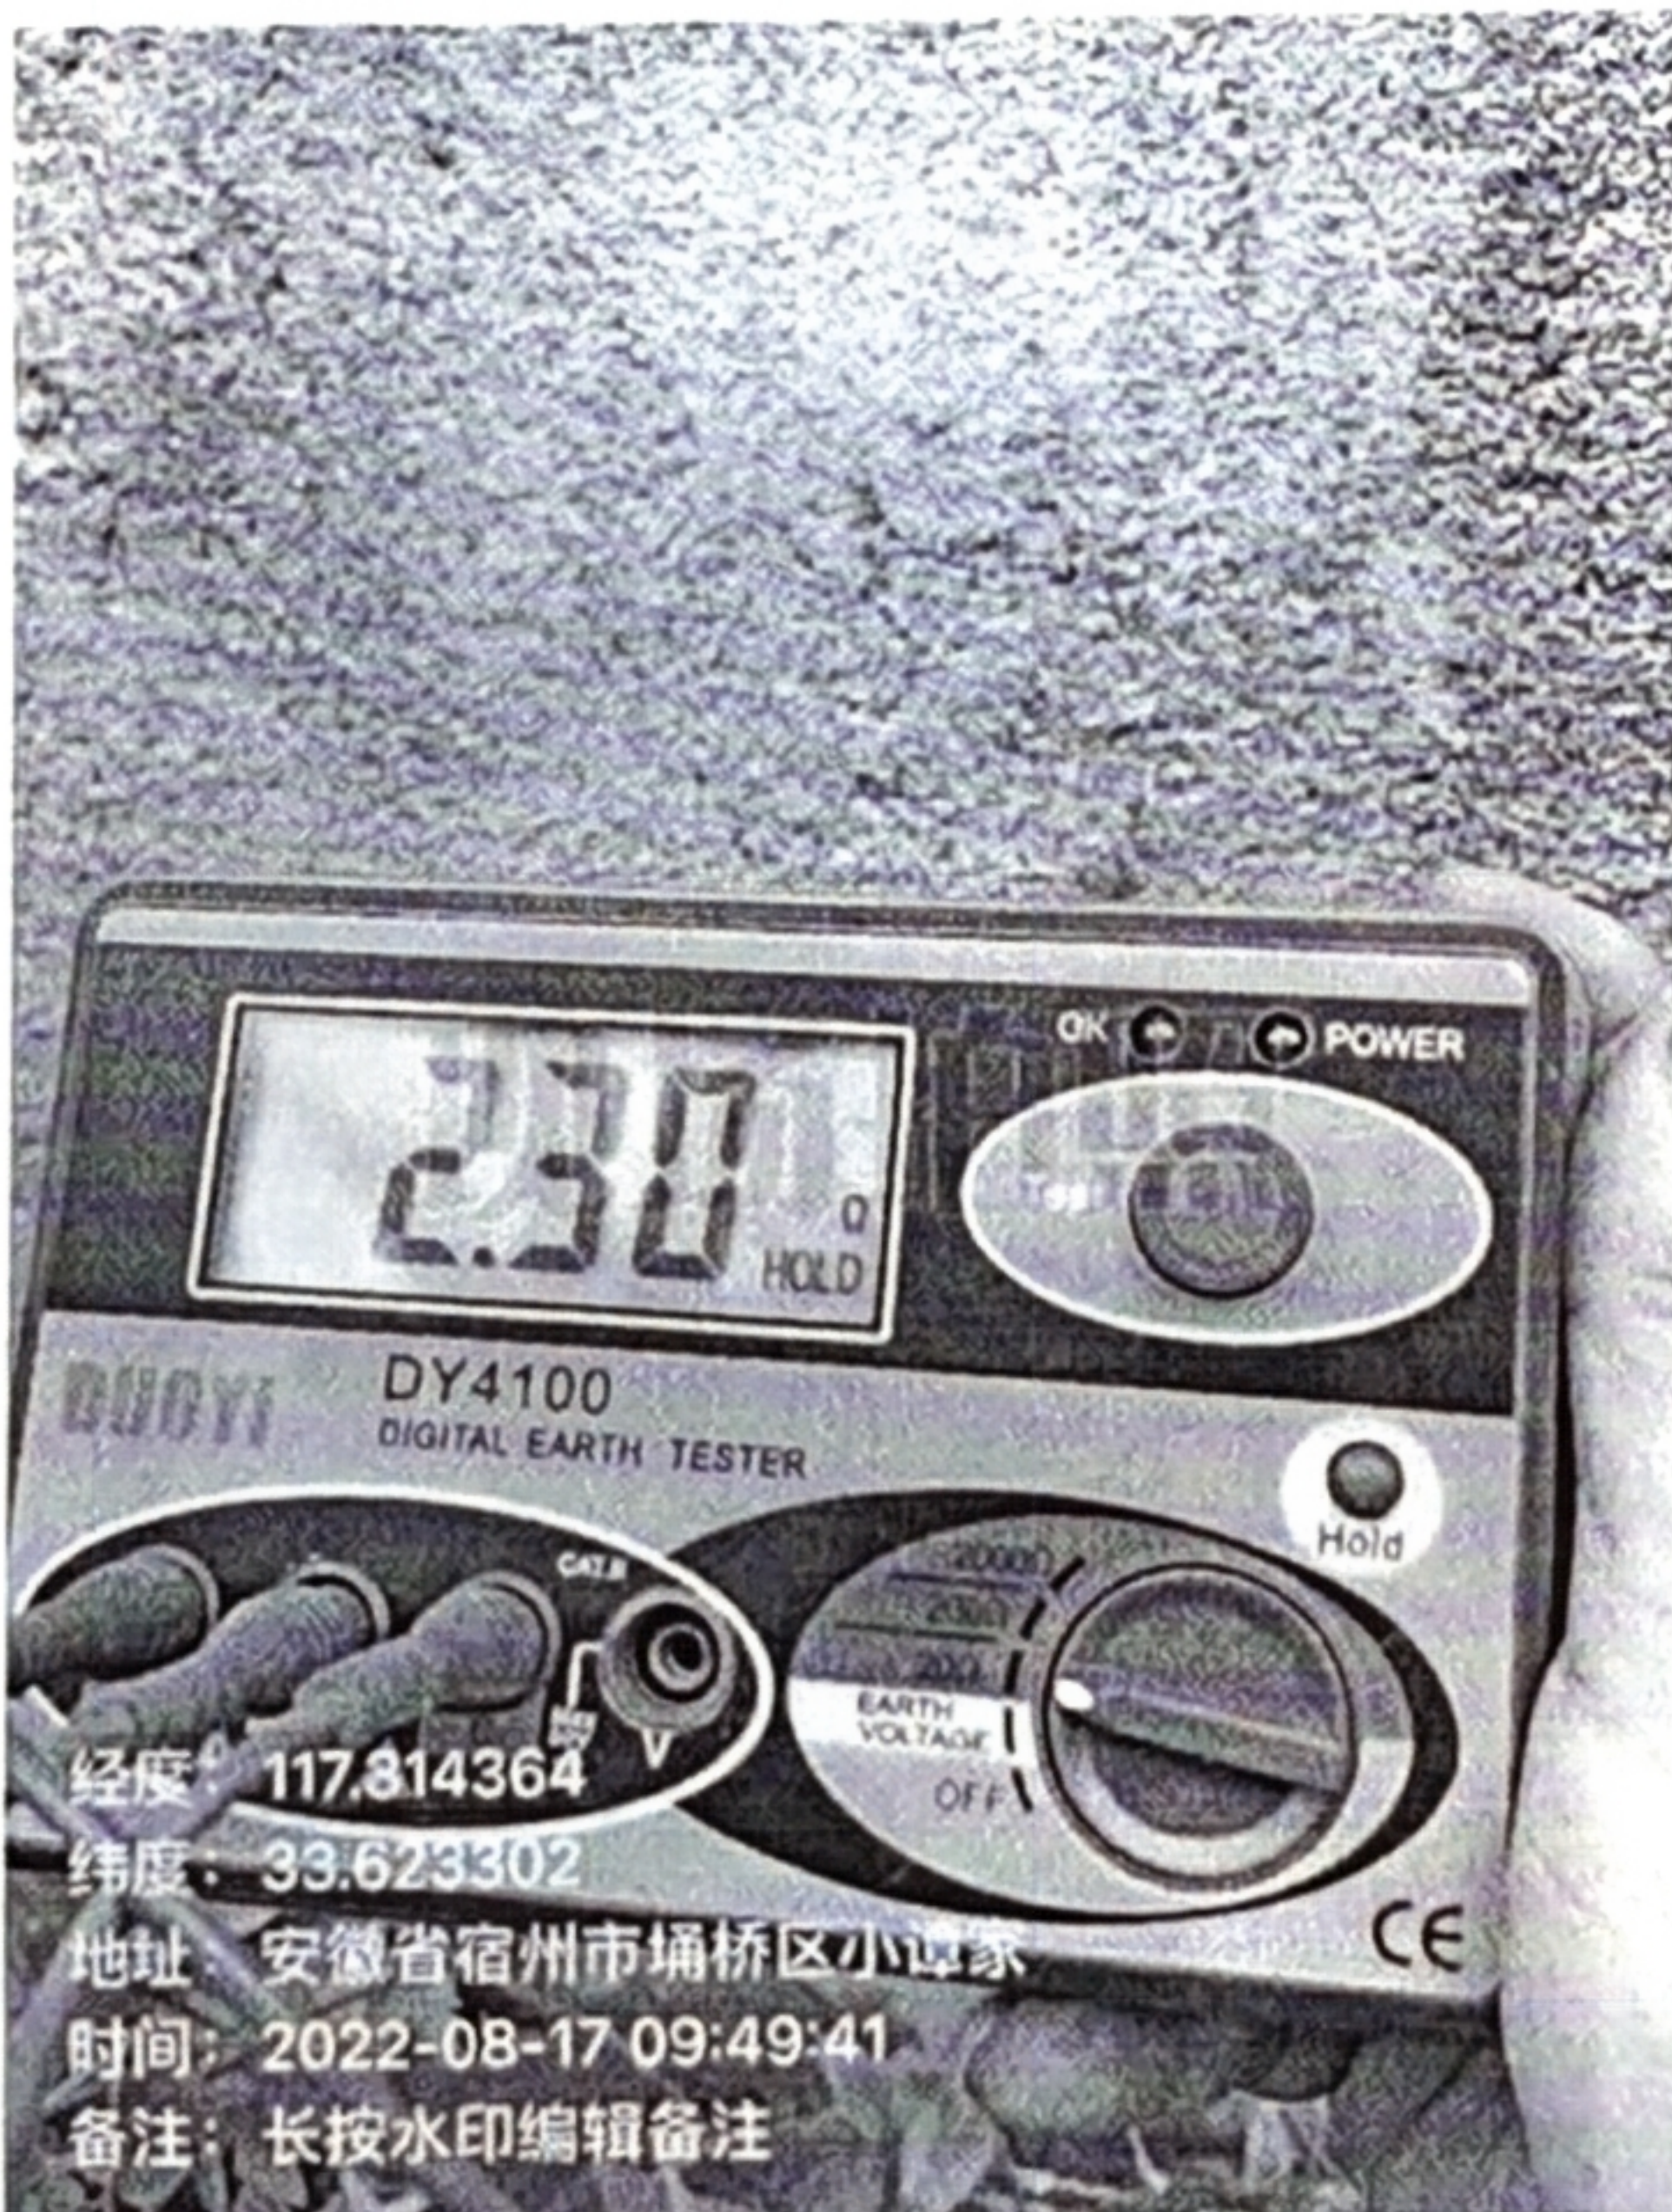
安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

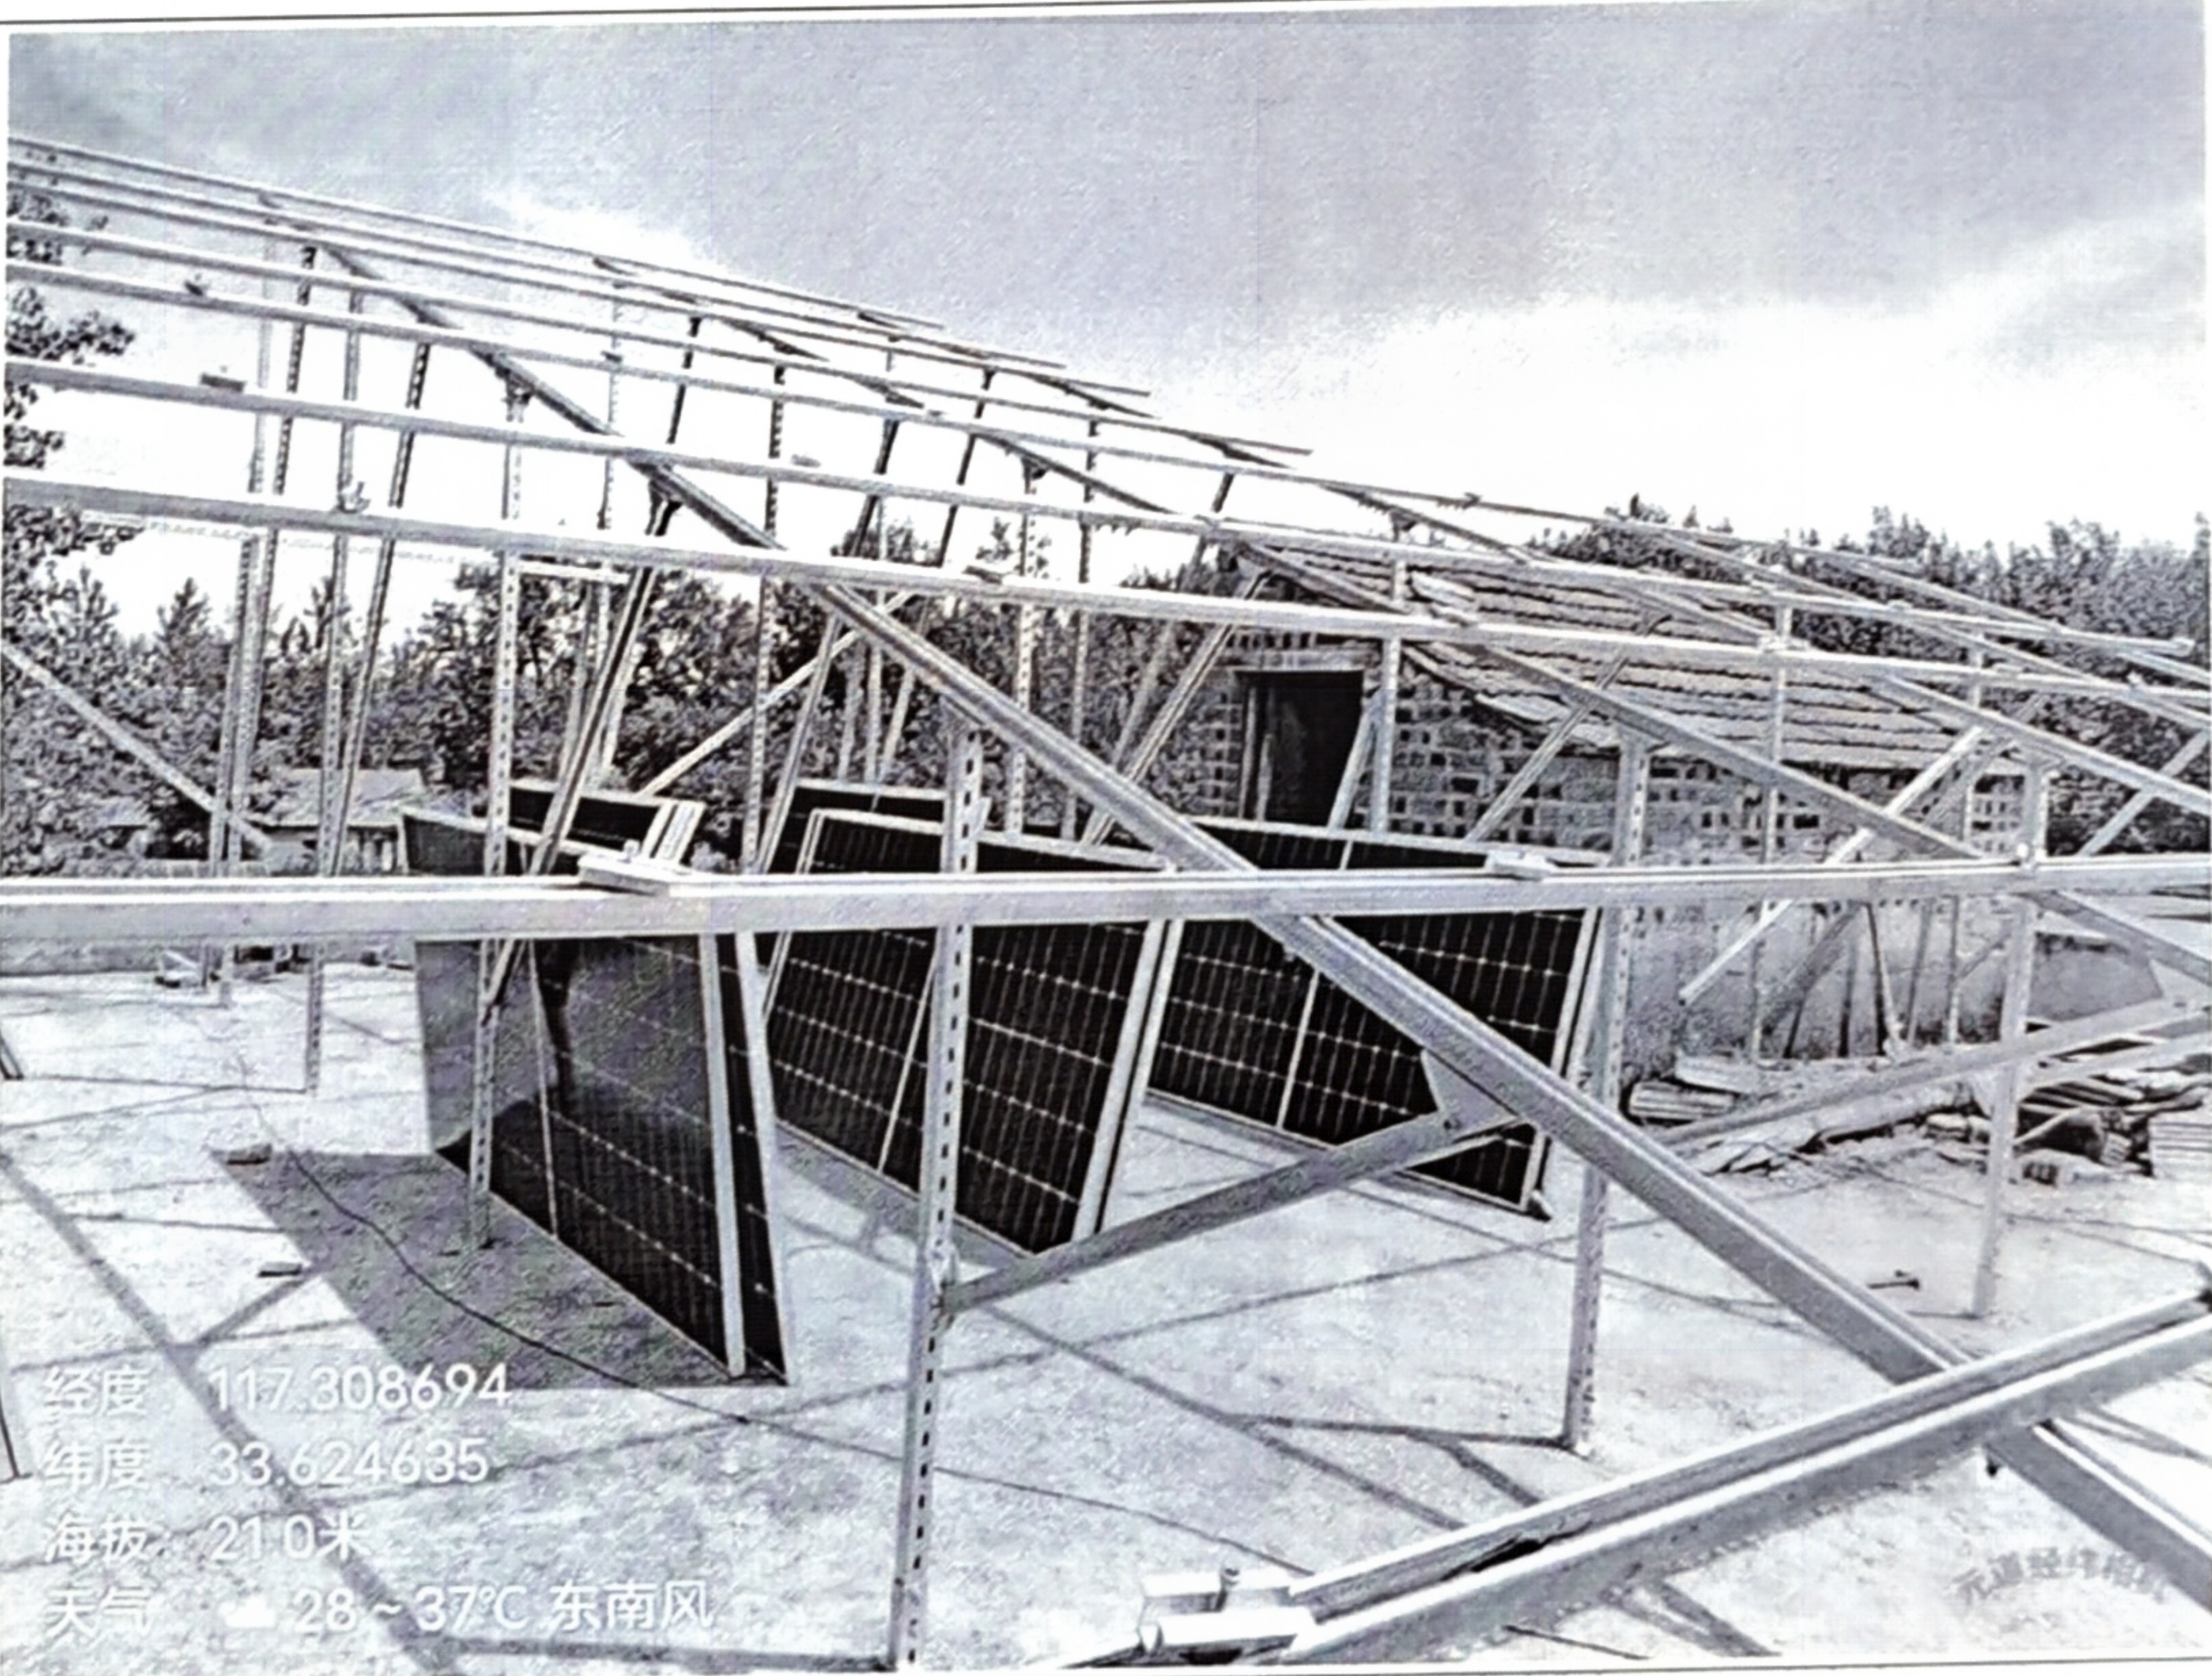
建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022.08.20 至 2022.08.27																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、宿州市支架、组件累计安装完成 3248 户； 2、本周光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">名 称</th> <th style="width: 25%;">规格型号</th> <th style="width: 25%;">数 量</th> <th style="width: 35%;">备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>540w</td> <td>4900 块</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>535w</td> <td>0 块</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>60 吨</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>0 台</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	540w	4900 块	/	组件	535w	0 块	/	支架		60 吨	/	逆变器		0 台	/
名 称	规格型号	数 量	备 注																		
组件	540w	4900 块	/																		
组件	535w	0 块	/																		
支架		60 吨	/																		
逆变器		0 台	/																		
二、本周工程建设工作内容及完成情况 宿州市光伏支架和组件安装完成 56 户。																					
三、下周计划主要工作内容 1. 宿州下周预计到达班组共计约 11 组，50 人（含支架、组件、电器安装人员）； 2. 宿州市计划安装 50 户，约 1.2mw； 3. 宿州市下周材料使用情况：组件约 2200 片，支架约 35 吨，逆变器 50 台，线缆约 1500 米； 4. 宿州市逆变器、并网箱计划安装 50 户； 5. 宿州市计划并网发电约 50 户，约 1.2mw。																					

填报人：刘曼曼 审核人：李平 时 间：2022 年 8 月 20 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件安装完成
照片	 经度：117.308480 纬度：33.624669 海拔：4.0米 天气：☁ 28~37℃ 东南风

文字 描述 照片	表箱内部  经度: 117.314282 纬度: 33.623304 地址: 安徽省宿州市 时间: 2022-08-17 备注: 长按水印编辑备注
文字 描述 照片	接地测试  经度: 117.314364 纬度: 33.623302 地址: 安徽省宿州市埇桥区小迎家 时间: 2022-08-17 09:49:41 备注: 长按水印编辑备注

文字描述	电器安装完成
照片	 经度: 117.314330 纬度: 33.623290 地址: 安徽省宿州市埇桥区小谭家 时间: 2022-08-17 09:50:17 备注: 长按水印编辑备注
文字描述	支架安装完成
照片	 经度: 117.308694 纬度: 33.624635 海拔: 210米 天气: 28~37℃ 东南风
