

# 安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

## 项目监理周报

(第六期)

2022 年 3 月 19 日

—

2022 年 3 月 25 日



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项  
监理技术咨询部

2022 年 3 月 25 日

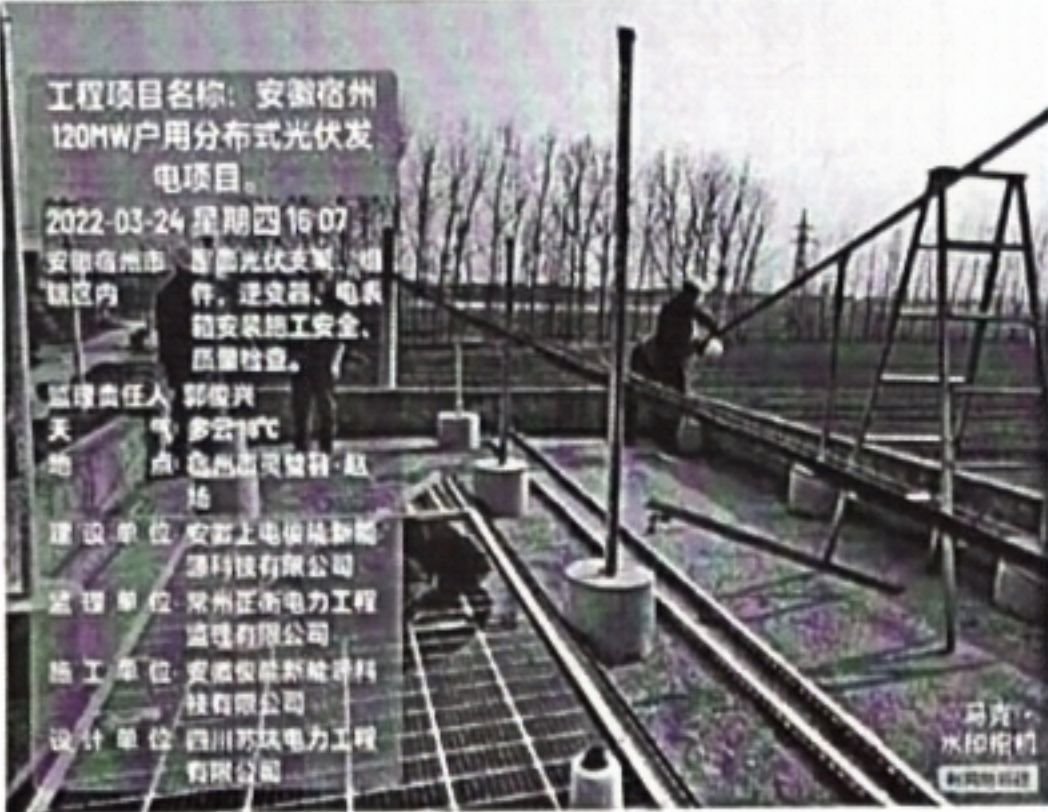
安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022 年 3 月 25 日第 6 期

|                                                  |                      |                             |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司                             |                      | 填报周期：2022-3.-19-2022-3-25 日 |                            |
| 一、项目总体建设进度汇总：                                    |                      |                             |                            |
| 1、支架、组件本周完成 121 户，累计安装完成 1632 户，完成率 29.18%。      |                      |                             |                            |
| 2、逆变器、电表箱安装本周完成 130 户，累计安装完成 1476 户，完成率 25.93%。  |                      |                             |                            |
| 3、并网情况：本周并网 2.8819MW，累计并网 18.1651MW，完成占比 15.14%。 |                      |                             |                            |
| 4、光伏组件、逆变器累计到场：                                  |                      |                             |                            |
| 名 称                                              | 厂家规格型号               | 本周到货                        | 备 注                        |
| 组件                                               | 中南光电型号 540           | 0 片                         | 累计到货 17460 片，累计到货占比 62.63% |
| 组件                                               | 亿晶光电型号 535           | 5394 片                      | 累计到货 30598 片，累计到货占比 46.77% |
| 逆变器                                              |                      | 455 台                       | 累计到货 3293 台，累计到货占比 454.88% |
| 支架                                               | 荣 诚 创 辉<br>41×41×2.0 | 62 吨                        | 累计到货 1151 吨，累计到货占比 27.28%  |
| 二、项目安全施工管理。                                      |                      |                             |                            |
| 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。                       |                      |                             |                            |
| 三、 下周计划主要工作内容                                    |                      |                             |                            |
| 继续全埇桥区、灵璧县、泗县、砀山县光伏安装施工。                         |                      |                             |                            |
|                                                  |                      |                             |                            |

工程现场照片：（含文字描述）

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 照片   | <div><div><p>工程项目名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p><p>2022-03-24 星期四 13:19</p><p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全质量检查。</p><p>监理单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司</p><p>建设单位：宿州正南电力工程有限公司</p><p>施工单位：安徽俊能新能源科技有限公司</p><p>设计单位：四川苏皖电力工程有限公司</p></div><div></div></div> <div><div><p>工程项目名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p><p>2022-03-24 星期四 16:04</p><p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全质量检查。</p><p>监理单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司</p><p>建设单位：宿州正南电力工程有限公司</p><p>施工单位：安徽俊能新能源科技有限公司</p><p>设计单位：四川苏皖电力工程有限公司</p></div><div></div></div> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 照片   | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-24 星期四 16:07</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 多云 14℃</p> <p>地点: 埇桥区黄岗镇-赵地</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>     | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-24 星期四 16:09</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 多云 14℃</p> <p>地点: 宿州市埇桥区-赵地</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>    |
| 文字描述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 照片   | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-09 星期三 11:01</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 晴天 14℃</p> <p>地点: 宿州市埇桥区-赵地</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>   | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-17 星期四 10:54</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 晴天 14℃</p> <p>地点: 宿州市埇桥区-赵地</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>   |
| 文字描述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 照片   | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-10 星期四 11:15</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 晴天 14℃</p> <p>地点: 宿州市埇桥区-万门庄</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>  | <p>工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。</p> <p>2022-03-10 星期四 09:17</p> <p>安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。</p> <p>监理单位: 郭俊兴</p> <p>天气: 晴天 14℃</p> <p>地点: 宿州市埇桥区-万门庄</p> <p>建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司</p> <p>设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司</p>  |
