

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第十一期)

2022. 4. 23-2022. 4. 29



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 4 月 29 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022.04.23-2022.04.29

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司

填报周期：2022.04.23 至 2022.04.29

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、宿州市支架、组件累计安装完成 2068 户；
- 2、本周光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	540w	1736 块	0.93744mw
组件	535w	899 块	0.480965mw
支架		60 吨	
逆变器		0 台	

二、本周工程建设工作内容及完成情况

宿州市光伏支架和组件安装完成 75 户。

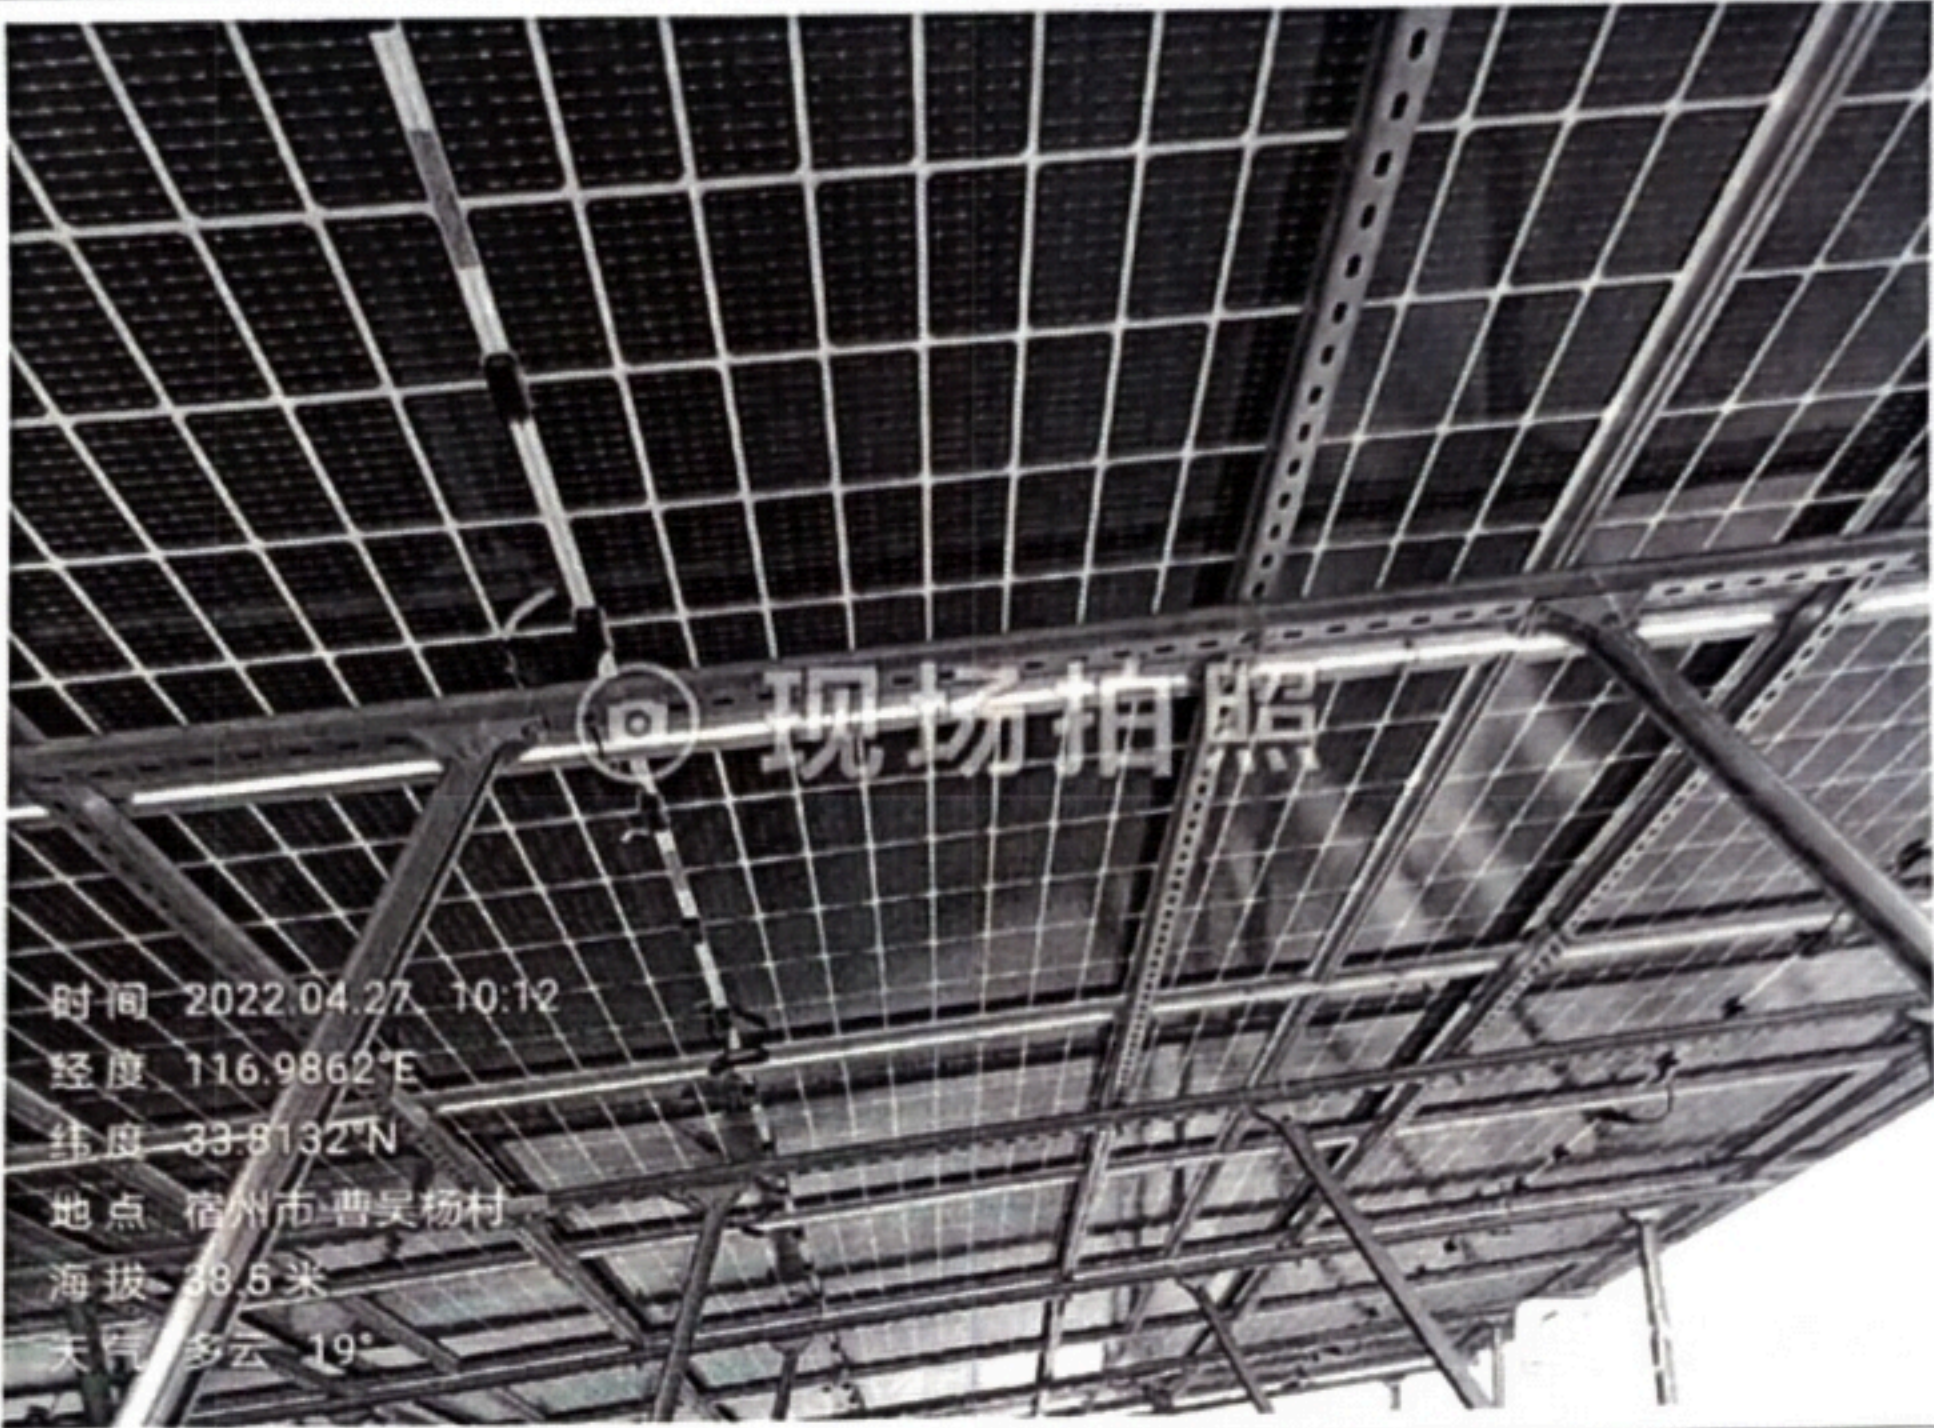
三、下周计划主要工作内容

1. 宿州下周预计到达班组共计约 46 组，210 人（含支架、组件、电器安装人员）；
2. 宿州市计划安装 150 户，约 3.4mw；
3. 宿州市下周材料使用情况：组件约 6400 片，支架约 110 吨，逆变器 150 台，线缆约 5000 米；
4. 宿州市逆变器、并网箱计划安装 150 户；
5. 宿州市计划并网发电约 150 户，约 3mw。

填报人：刘曼曼 审核人：李平 时 间：2022 年 4 月 29 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	警示标牌
照片	

文字描述	组件完成
照片	 现场拍照 时间 2022.04.27 10:12 经度 116.9862°E 纬度 33.8132°N 地点 宿州市曹吴杨村 海拔 38.5 米 天气 多云 19°
文字描述	电气安装
照片	 疫情防护 14:48 2022/04/26 星期二 ☞ 25~26℃ 东风 📍 安徽省宿州市埇桥区068乡道灵寺 📄 长按水印编辑备注 安徽上电储能新能源科技有限公司 王随运 9436 电话 288 米 1 8822 服务电话 0557-3609888 当心触电 禁止触摸
