

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW
分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 一 期

(2022 年 6 月 11 日-2022 年 6 月 17 日)




工程名称	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目	建设单位	扬州申曜新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、开工材料报审完成，项目开工。 2、总包单位质量安全人员现场培训完成。 3、加固准备完成，加固开始。 4、光伏支架、直流电缆到货，加固材料到货。 5、夹具组装完成 20%，支架安装完成 3%。 6、安全措施落实		
下周计划	1、内饰光伏施工支架安装 50%，夹具组装 60%。组件安装完成 10%。 2、仪征威英厂区加固完成，天富龙内饰 101 厂房加固完毕。 3、内饰组件进场 80%、威英暂时组件不进场。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已配置安全文明标牌。		
施工质量	1、夹具组装 20%，垫片齐全。 2、定位放线、支架安装符合设计及规范要求。 3、正在安排合适时间做抗拉实验。		
设备材料进场情况	1、光伏支架到场 2.44MW。 2、直流电缆到场 24500m。 3、扁铁到场 276m。钢板 30 块。 4、焊管 Q235 到场 384m。		
人员机械情况	5、总包管理 2 人，光伏 5 人，加固六人。 6、曲臂车一台、登高车一台。		






物料整理

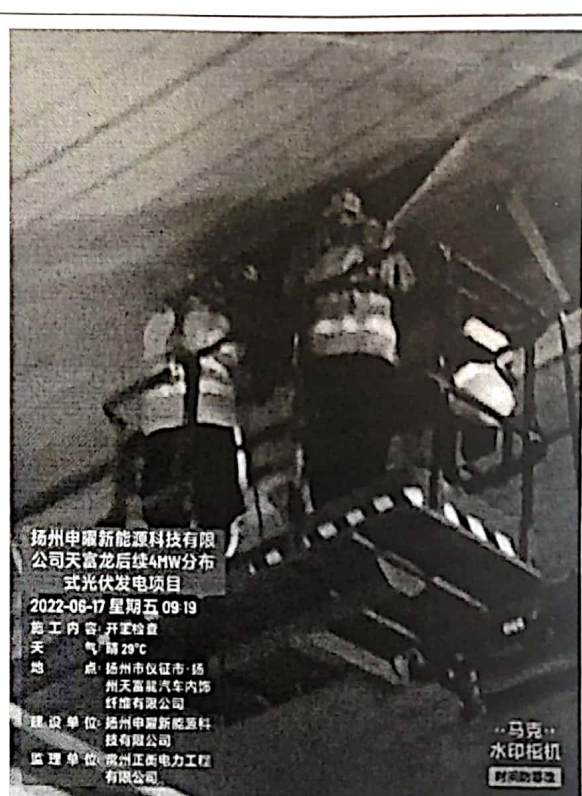

加固安装



夹具组装

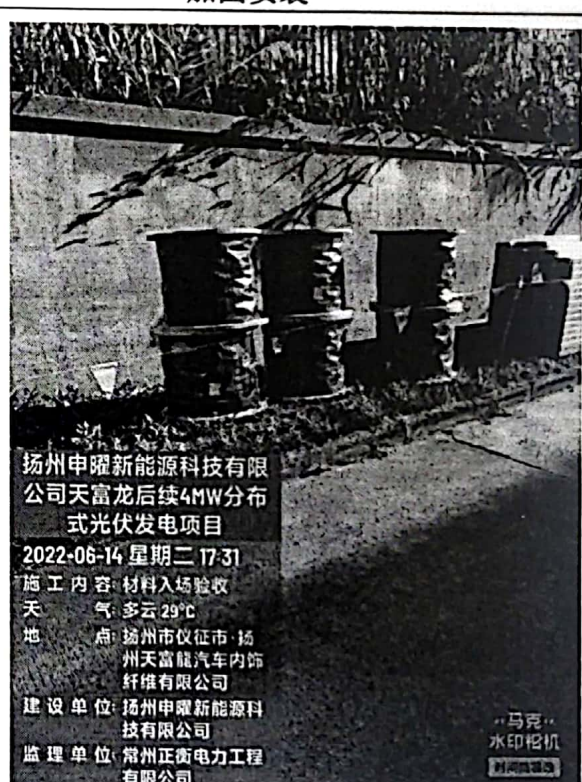

电缆入场

