

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW
分布式光伏发电项目


监 理 周 报

第 十 一 期




(2022 年 8 月 20 日-2022 年 8 月 26 日)

工程名称	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙 后续 4MW 分布式光伏发电项目	建设单位	扬州申曜新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、天富龙：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装完成，清洗系统安装； 2、威英：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装； 3、天富龙并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司验收完成，数据采集终端安装完成； 4、威英并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司验收完成，数据采集终端安装完成；		
下周计划	1、天富龙二期项目并网柜电表安装，并网送电； 2、天富龙二期项目环境监测仪到货安装； 3、天富龙二期项目光伏工程分部验收； 4、天富龙二期项目清洗系统安装完成；		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已配置安全文明标牌。		
施工质量	待分项验收整改消缺。		
设备材料进场情况	1、支架全部到场，支架到场 2.4434MW； 2、直流电缆全部到货，到货 24500m； 3、交流电缆全部到货，到货 5000m； 4、组件到货 165 箱，共 5149 片； 5、桥架全部到货，到货 2.4434MW； 6、逆变器到货 20 台。通讯模块 20 个； 7、加固檩条、钢管斜撑、扁钢全部到场。 8、并网柜全部到货，到货 5 台； 9、接地材料、通道板全部到货。 10、监控全部到货。		
人员机械情况	总包管理 2 人，电气 1 人。		

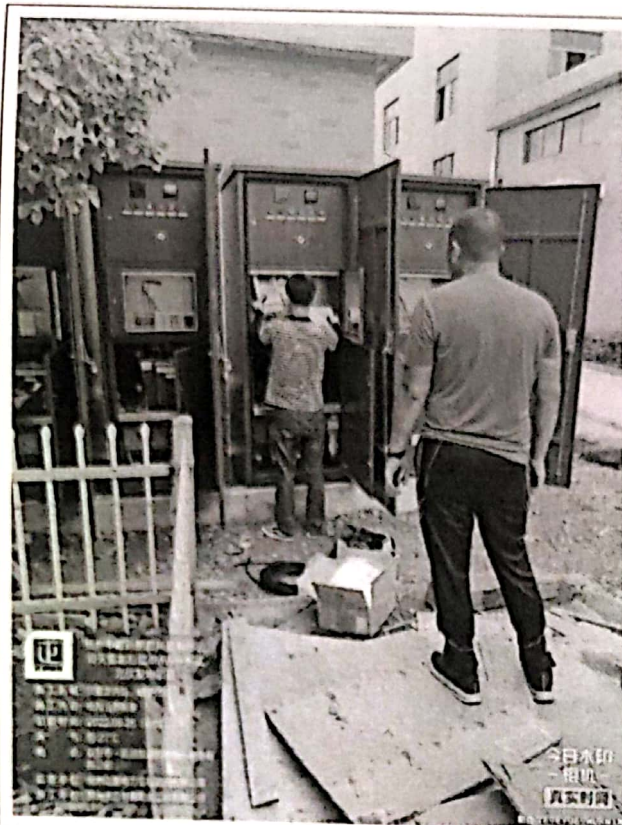

数据终端安装

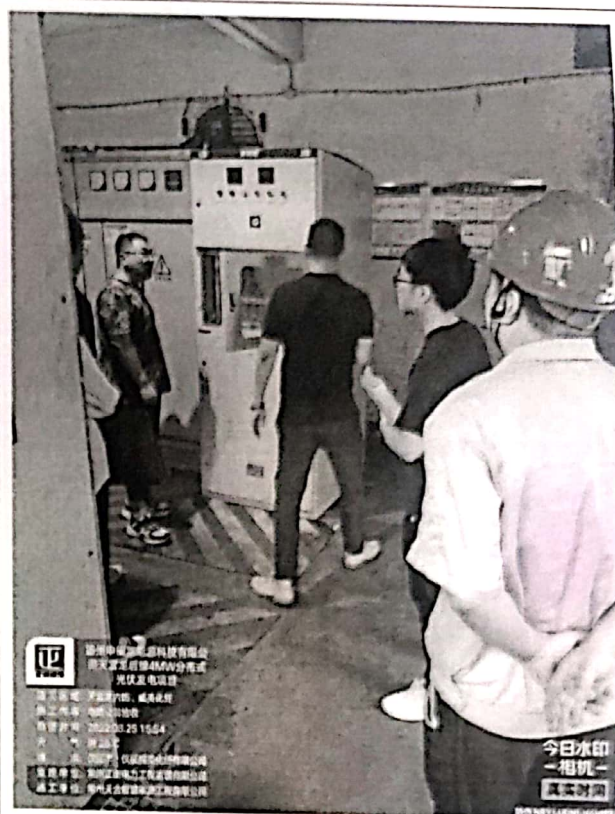

电网公司验收



镀锌层测试



停电并柜
