

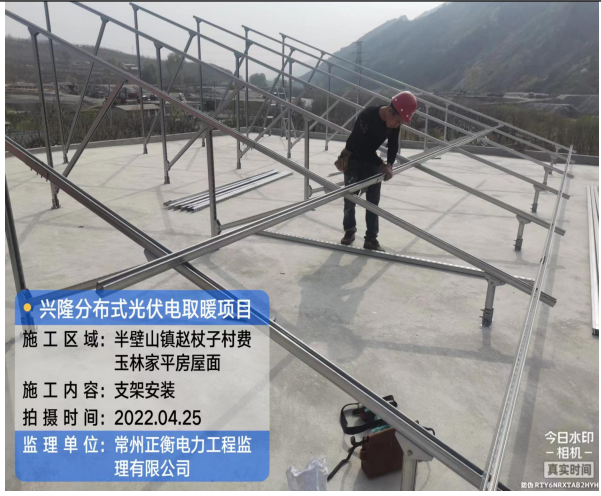
兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 5 月 第 01 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司	填报周期：2022. 4. 25至 2022. 5. 1																																								
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成111户； 2、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>3000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>108台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>62 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>400组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	3000块		逆变器		108台		配电箱		62 台		支架		600组		电缆		400组									
名 称	规格型号	数 量	备 注																																						
组件	370W	2800块																																							
组件	545W	1000块																																							
组件	550W	3000块																																							
逆变器		108台																																							
配电箱		62 台																																							
支架		600组																																							
电缆		400组																																							
二、本周工程建设工作内容及完成情况 半壁山镇伙山子村光伏支架安装完成5户。																																									
三、 下周计划主要工作内容 1. 半壁山镇计划安装 10户；																																									

填报人：李连明 审核人：徐耀生 时 间：2022 年 5 月 1 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	赵杖子村费金玲家底座防水打胶 4月 25 日 星期一	赵杖子村费金玲家支架安装 4月25 日 星期一
照片		

文字描述	伙山子村李春华家底座安装 4月25日 星期一	伙山子村闫桂龙家屋面组件安装 4月29日 星期五
照片		 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村闫桂龙家平房屋面 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022.04.29 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	伙山子村村委会家底座支架安装 5月1日 星期天	伙山子村村委会屋面支架安装 5月1日 星期天
照片	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村村委会平房屋面 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.05.01 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村村委会平房屋面 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.05.01 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述		
照片		
