

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

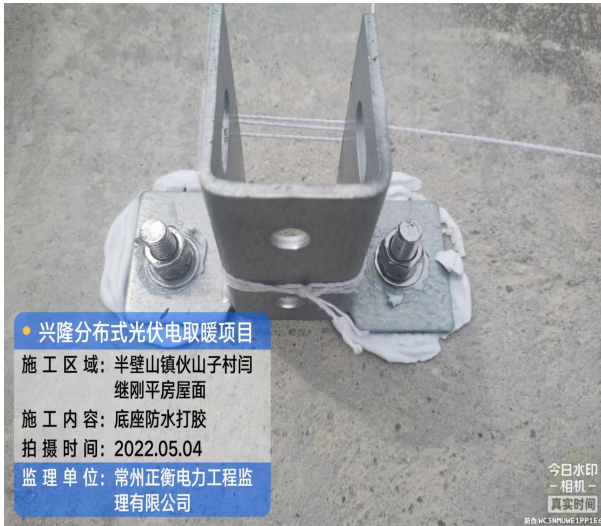
2022 年 5 月 第 02 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司	填报周期：2022. 5. 2至 2022. 5. 8																																								
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成141户； 2、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>3000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>108台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>62 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>400组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	3000块		逆变器		108台		配电箱		62 台		支架		600组		电缆		400组									
名 称	规格型号	数 量	备 注																																						
组件	370W	2800块																																							
组件	545W	1000块																																							
组件	550W	3000块																																							
逆变器		108台																																							
配电箱		62 台																																							
支架		600组																																							
电缆		400组																																							
二、本周工程建设工作内容及完成情况 半壁山镇伙山子村光伏支架，组件安装完成5户。																																									
三、 下周计划主要工作内容 1. 半壁山镇计划7户电缆放线，电表安装；																																									

填报人：李连明 审核人：徐耀生 时 间：2022 年 5 月 8 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	河沿子村杨贵莱家瓦房屋面支架安装 5月 2 日 星期一	河沿子村杨贵莱家瓦房屋面组件安装 5月2日 星期一
照片	 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：半壁山镇河沿子村杨贵莱家瓦房屋面 施工内容：支架安装 拍摄时间：2022.05.02 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：半壁山镇河沿子村杨贵莱家瓦房屋面 施工内容：组件安装 拍摄时间：2022.05.03 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

文字描述	河沿子村李万宝家瓦房屋面支架安装 5月4日 星期三	河沿子村李万宝家瓦房屋面组件安装 5月4日 星期三
照片	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇河沿子村李万宝瓦房屋面 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.05.04 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇河沿子村李万宝瓦房屋面 施工内容: 组件安装完成 拍摄时间: 2022.05.04 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	伙山子村闫继刚家底座防水打胶 5月4日 星期三	伙山子村闫继刚家屋面支架安装 5月4日 星期三
照片	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村闫继刚平房屋面 施工内容: 底座防水打胶 拍摄时间: 2022.05.04 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村闫继刚平房屋面 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.05.04 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	伙山子村崔志刚家底座防水打胶 5月7日 星期六	伙山子村崔志刚家组件安装 5月7日 星期六
照片	 • 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇伙山子村崔志刚平房屋面 施工内容: 底座打胶 拍摄时间: 2022.05.07 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
