

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

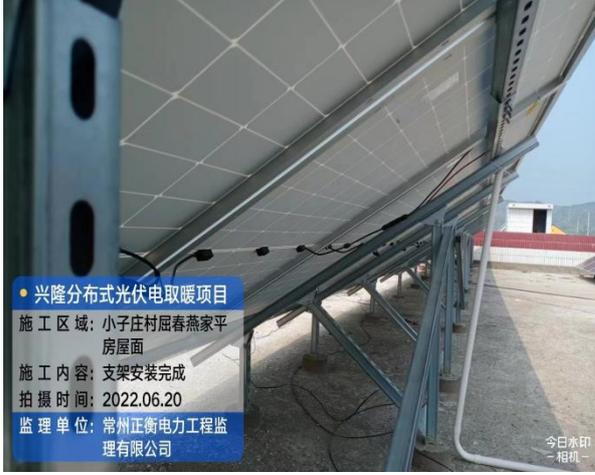
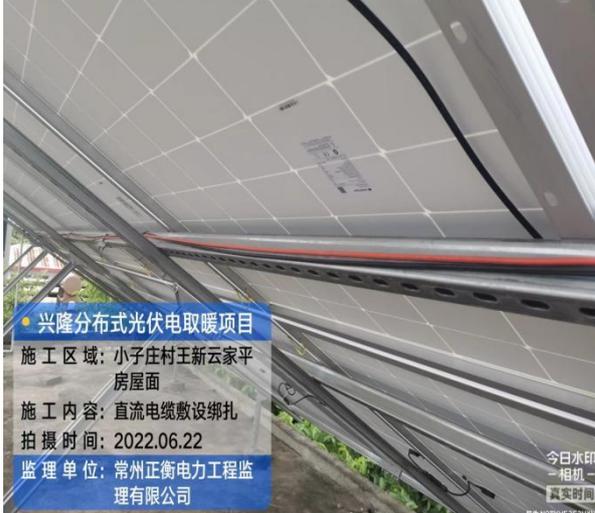
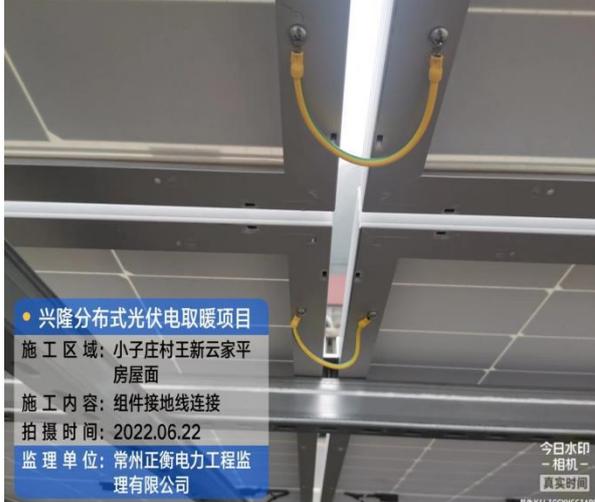
2022年6月第04期

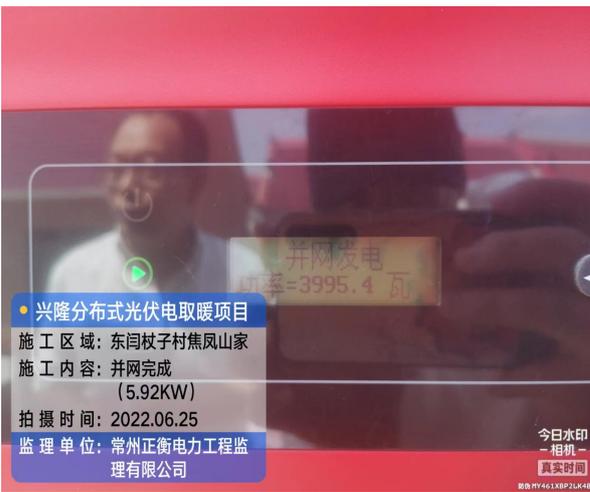
建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司	填报周期：2022.6.20至 2022.6.26																																								
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、半壁山镇支架、组件累计安装完成156户；</p> <p>2、验收完成96户。</p> <p>3、电表安装完成39户。</p> <p>4、主要材料累计到场：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>规格型号</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>3000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>161台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>132台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名称	规格型号	数量	备注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	3000块		逆变器		161台		配电箱		132台		支架		600组		电缆		600组									
名称	规格型号	数量	备注																																						
组件	370W	2800块																																							
组件	545W	1000块																																							
组件	550W	3000块																																							
逆变器		161台																																							
配电箱		132台																																							
支架		600组																																							
电缆		600组																																							
<p>二、本周工程建设工作内容及完成情况</p> <p>本周电气安装6户，验收完成6户。</p> <p>本周交流电缆进场200组。</p>																																									
<p>三、下周计划主要工作内容</p> <p>1. 验收15户；</p> <p>2. 电气安装。</p>																																									

填报人：李连明 审核人：徐耀生 时间：2022年6月26日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	小子庄村屈春燕家逆变器，配电箱安装 6月20日 星期一	小子庄村屈春燕家配电箱内部 6月20日 星期一
照片	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：小子庄村屈春燕家平房屋面 施工内容：逆变器，配电箱安装 拍摄时间：2022.06.20 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：小子庄村屈春燕家平房屋面 施工内容：配电箱内部 拍摄时间：2022.06.20 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p>

<p>文字描述</p>	<p>小子庄村屈春燕家屋面支架安装 6月20日 星期一</p>	<p>小子庄村屈春燕家屋面组件安装 6月20日 星期一</p>
<p>照片</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村屈春燕家平房屋面 施工内容: 支架安装完成 拍摄时间: 2022.06.20 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村屈春燕家平房屋面 施工内容: 组件安装完成 拍摄时间: 2022.06.20 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>
<p>文字描述</p>	<p>小子庄村王新云家直流电缆敷设绑扎 6月22日 星期三</p>	<p>小子庄村王新云家MC4接头连接绑扎 6月22日 星期三</p>
<p>照片</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村王新云家平房屋面 施工内容: 直流电缆敷设绑扎 拍摄时间: 2022.06.22 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村王新云家平房屋面 施工内容: MC4接头绑扎 拍摄时间: 2022.06.22 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>
<p>文字描述</p>	<p>小子庄村王新云家组件接地线连接 6月22日 星期三</p>	<p>半壁山村赵宏远家逆变器, 配电箱安装 6月22日 星期三</p>
<p>照片</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村王新云家平房屋面 施工内容: 组件接地线连接 拍摄时间: 2022.06.22 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 小子庄村王新云家平房屋面 施工内容: 接地圆钢焊接 拍摄时间: 2022.06.22 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>

<p>文字描述</p>	<p>东闫杖子村焦凤山家并网完成 6月25日 星期六</p>	<p>东闫杖子村贾明银家并网完成 6月25日 星期六</p>
<p>照片</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 东闫杖子村焦凤山家 施工内容: 并网完成 (5.92KW) 拍摄时间: 2022.06.25 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>今日水印 - 相机 - 真实时间 相机RY461XP21K48P</p>	 <p>• 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山村贾明银家 施工内容: 并网完成 拍摄时间: 2022.06.25 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>今日水印 - 相机 -</p>
<p>文字描述</p>	<p>业主巡视检查并网工作 6月25日 星期六</p>	<p>业主巡视检查焦凤山家屋面 6月25日 星期六</p>
<p>照片</p>		
