

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 三 期

(2022年4月30日-2022年5月06日)




| | | | |
|-----------|---|------|---------------|
| 工程名称 | 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 | 建设单位 | 安徽小岗村能源集团有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司 | | |
| 本周施工内容及进度 | 1、#7 车间支架安装、验收。 2、#6、7 车间支墩、支架、组件吊装。 | | |
| 下周计划 | 1、#6、车间支墩、支架、组件安装。 2、#7 车间组件安装。 | | |
| 安全文明施工情况 | 1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。 | | |
| 施工质量 | 1、个别位置檩条连接处安装间隙过大，已要求施工单位现场整改。 | | |
| 设备材料进场情况 | 1、逆变器到场。 | | |
| 人员机械情况 | 人员:6 人。 | | |





支墩吊装

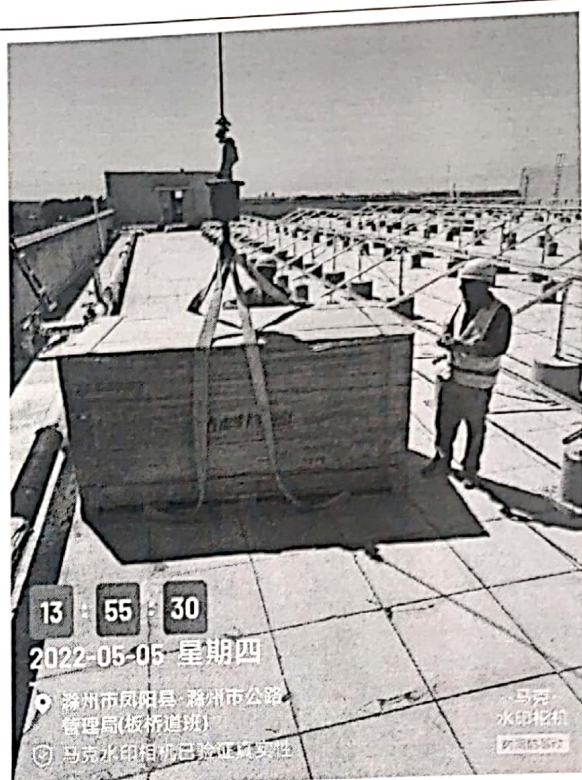

组件吊装



支架安装



支架验收

