

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 04 月 29 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	5%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、预制基础到货(418 组)支架到货(1MWp)及组件到货(32 箱)； 2、完成了组件到货检测（50 块）； 3、5#楼屋顶完成组件安装工序的施工； 4、5#和 9#楼完成支架安装工序的施工； 5、6#和 10#楼支墩吊运分散摆放工序的施工； 6、完成了单位资质、人员资质、专项方案、安全方案、应急预案、机械、防疫方案、开工、组件 支架、防水卷材的报审，现场总包管理人员加强检查落实严格的安装措施。		
2、投资情况	本周完成设备材料（组件，支架，卷材）产值约 30.2 万元，施工劳务约 3.4 万元。累计完成约 33.6 万元，约占总合同价的 7.30%(按合同价 460 万万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（4 月 30 日-5 月 6 日）： 1、完成 10#、11#支架基础摆放； 2、完成 9#、10#、11#支架、组件安装； 3、严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		

4、周工作小结	现场对新冠疫情防控常态化强化了严格管理，配合新区和园区的各项防疫管理要求，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，要求施工人员进行核酸检测阴性证明后方可入园施工。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，落实基础、支架、组件安装等施工工序工作。
5、需要协调问题	已协调施工单位抓紧落实储能设备进货情况。

6、目前进度：

目前进度 1、目前除 5#楼屋顶组件安装完成，5#和 9#楼完成支架安装施工，6#和 10#楼支墩吊运分散摆放工作；

2、楼面实地的勘察、放线；电缆井排管的实地勘察及距离测量；第一批物料的进场堆放工作；

投资情况：本周完成产值设备材料（组件，支架，卷材）30.2 万元，施工劳务约 3.4 万元。累计完成约 33.6 万元，约占总合同价的 7.30%(按合同价 460 万万元计算)。

下步计划：1、完成现场完成 10#、11#支架基础摆放；

2、完成 9#、10#、11#支架、组件安装；加强安全文明施工及强化疫情防控措施。

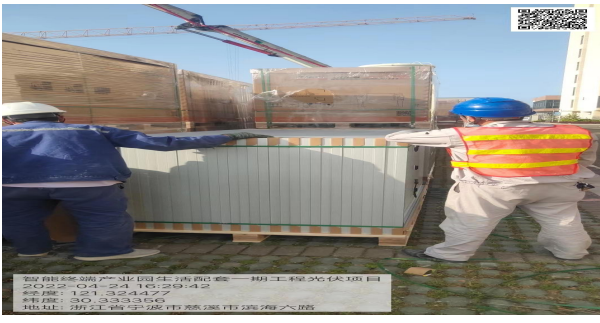
常州正衡电力工程监有限公司

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监理部

2022.04.29 监理项目部



附现场照片：

文字描述	支架基础到货	支架基础卸车
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-20 09:05:43 经度: 121.324646 纬度: 30.33328 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-20 09:21:26 经度: 121.324609 纬度: 30.333087 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	基础吊装	组件检测
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-22 09:15:12 经度: 121.324813 纬度: 30.333462 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-24 18:59:01 经度: 121.324663 纬度: 30.333327 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	组件开箱检查	组件吊装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-24 18:59:42 经度: 121.324477 纬度: 30.333356 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-25 09:44:01 经度: 121.324924 纬度: 30.333481 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	支架安装	组件安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-26 09:19:13 经度: 121.325209 纬度: 30.333283 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-04-28 15:00:27 经度: 121.324941 纬度: 30.333426 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
