

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 05 月 20 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	46%		
本周下雨天数	2	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： （1）物料：50×50 不锈钢直流桥架 862 米到位； （2）本周完成支架基础（298 组）支架（298 组）组件（234 块）计 126.08Kw； 累计 完成：支架基础（856 组）支架（856 组），组件（1215 块）计 616kw 完成总工程量45%； （3）检测完成：直流电缆、防腐卷材结果符合要求；； （4）现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料电缆桥架、租吊车、租叉车产值约 35 万元。累计完成约 191.8 万元，约占总合同价的 41.69%(按合同价 460 万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（5 月 14 日-5 月 20 日）： （1）3#.支架基础敷设、支架安装、组件安装、逆变器安装； （2）4#.支架基础、支架安装、组件安装、逆变器安装； （3）土建地面电缆井及电缆沟开挖； （4）严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		

4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，施工过程中保持好楼面卫生，
5、需要协调问题	

目前进度：

1、物料：50×50 不锈钢直流桥架 862 米到位；

2、本周完成：支架基础（298 组）支架（298 组）组件（234 块）计 126.08Kw；

累计完成：支架基础（856 组）支架（856 组），组件（1215 块）计 616kw 完成总工程量.45%；

3、检测完成：直流电缆、防腐卷材结果符合要求；

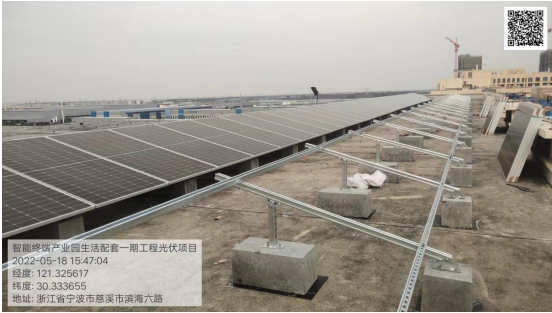
4、投资情况：本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料电缆桥架、租吊车、租叉车产值约 35 万元。累计完成约 191.8 万元，约占总合同价的 41.69%(按合同价 460 万元计算)。

5、下步计划：3#.支架基础敷设、支架安装、组件安装、逆变器安装；4#.支架基础、支架安装、组件安装、逆变器安装；土建地面电缆井及电缆沟开挖；加强安全文明施工及加强疫情防控措施。

常州正衡电力工程监理有限公司
 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监理部



附现场照片：

文字描述	8#组件安装	8#支架基础摆放
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-14 13:45:13 经度: 121.326933 纬度: 30.332585 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-14 08:40:22 经度: 121.327136 纬度: 30.332882 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	3#支架基础吊装	3#组件吊装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-16 08:58:48 经度: 121.325 纬度: 30.33378 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-16 14:11:33 经度: 121.325461 纬度: 30.333412 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	召开监理例会	3#支架、组件安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-16 15:16:32 经度: 121.32798 纬度: 30.331855 地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈三路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-18 15:47:04 经度: 121.325617 纬度: 30.333655 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	组件搬运	3# 组件安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-19 08:10:51 经度: 121.325961 纬度: 30.33343 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-19 08:10:18 经度: 121.325952 纬度: 30.333438 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
