

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 05 月 27 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	52%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： （1）本周完成支架基础（360 组）支架（360 组）组件（468 块）；累计完成：支架基础（1105 组）支架（1105 组），组件（1850 块）支架基础、支架、组件以全部安装完成完成，完成总工程量. 50%； （2）完成 4#50×50 桥架敷设（96 米）、4 平方直流电缆敷设（1000 米）；4#逆变器安装（2 台）；3#、4#组件接地线连接（600 条）； （3）现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料直流电缆、租吊车、租叉车产值约 40 万元。累计完成约 235.2 万元，约占总合同价的 51.13%(按合同价 460 万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（5 月 14 日-5 月 20 日）： （1）3#4#5#6# 直流桥架，接地安装，光伏线敷设完成。9#. 10#. 11#. 12#逆变器安装完成。 （2）土建根据天气情况安排进场施工； （3）严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		
4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，施工过程中保持好楼面卫生，		
5、需要协调问题	协调储能柜位置		

目前进度:

1、本周完成支架基础（360组）支架（360组）组件（468块）；累计完成：支架基础（1105组）支架（1105组），组件（1850块）支架基础、支架、组件以全部安装完成完成，完成总工程量50%；

2、完成4#50×50桥架敷设（96米）、4平方直流电缆敷设（1000米）；4#逆变器安装（2台）；3#、4#组件接地线连接（600条）；

3、投资情况：本周完成施工劳务约3.4万元、设备材料直流电缆、租吊车、租叉车产值约40万元。累计完成约235.2万元，约占总合同价的51.13%（按合同价460万元计算）；

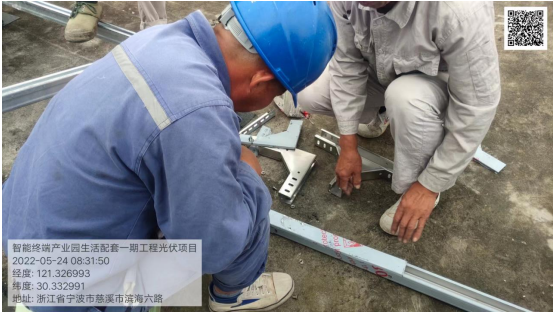
4、下步计划：3#4#5#6#直流桥架，接地安装，光伏线敷设完；9#、10#、11#、12#逆变器安装完成；土建根据天气情况安排进场施工；加强安全文明施工及加强疫情防控措施。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监

2022.04.29
生活配套一期工程分布式光伏项目
监理项目部

附现场照片：

文字描述	4#定位放线	4#组件安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-21 08:37:13 经度: 121.326473 纬度: 30.333202 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-21 14:20:53 经度: 121.326713 纬度: 30.333271 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	4# 组件安装	4#施工现场
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-22 13:33:14 经度: 121.326838 纬度: 30.333069 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-22 08:41:32 经度: 121.326602 纬度: 30.33313 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	4#逆变器安装	4#桥架安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-24 09:08:31 经度: 121.3269 纬度: 30.333113 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-24 08:31:50 经度: 121.326993 纬度: 30.332991 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	4#直流电缆敷设	3#电缆桥架敷设
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-25 15:10:21 经度: 121.326929 纬度: 30.333111 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-25 14:58:59 经度: 121.325676 纬度: 30.333613 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
