

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 06 月 03 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	58%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： （1）完成 3#-12#50×50 桥架敷设(766 米)，以全部敷设完成； （2）完成 3#两台 5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#各一台逆变器安装、以安装完成 11 台； （3）完成 3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#4 平方直流电缆敷设（1 万 1 千米）已全部敷设完成； （4）完成 9#接地环网焊接； （5）电缆沟开挖 20 米及电缆套管敷设（100 米）； （5）现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料直流电缆套管、租吊车、租叉车产值约 20 万元。累计完成约 258.6 万元，约占总合同价的 56.21%(按合同价 460 万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（5 月 14 日-5 月 20 日）： （1）10#逆变器安装； （3）土建施工，完成 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼与电缆主管道连接的排管及电缆井； （3）严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		
4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，施工过程中保持好楼面卫生，		
5、需要协调问题			

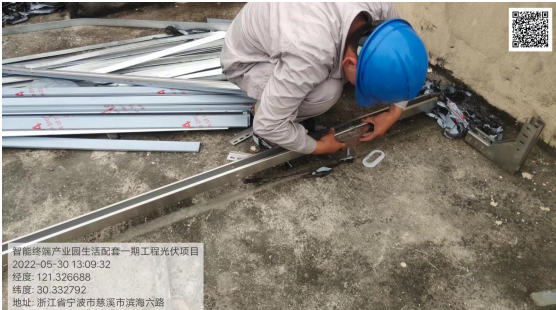
目前进度:

- 1、本周完成 3#-12#50×50 桥架敷设(766 米)，以全部敷设完成;
- 2、完成 3#两台 5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#各一台逆变器安装、以安装完成 11 台;
- 3、完成 3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#4 平方直流电缆敷设(1 万 1 千米)已全部敷设完成;
- 4、完成 9#接地环网焊接(300 米);
- 5、电缆沟开挖(20 米)及电缆套管敷设(100 米);
- 6、投资情况:本周成施工劳务约 3.4 万元、设备材料直流电缆套管、租吊车、租叉车产值约 20 万元。累计完成约 258.6 万元,约占总合同价的 56.21%(按合同价 460 万元计算);
- 7、下步计划: 10#逆变器安装;土建施工,完成 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼与电缆主管道连接的排管及电缆井,加强安全文明施工及加强疫情防控措施。

常州正衡电力工程监理有限公司
宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监理部



附现场照片：

文字描述	9#电缆桥架敷设	4#电缆敷设
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-26 14:11:47 经度: 121.325052 纬度: 30.333067 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-27 13:33:34 经度: 121.325484 纬度: 30.332646 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	12#电缆井砌筑	7#桥架敷设防腐木
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-06-02 16:23:04 经度: 121.32678 纬度: 30.332607 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-30 13:09:32 经度: 121.326688 纬度: 30.332792 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	9#接地环网焊接	9#逆变器安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-31 经度: 121.32904 纬度: 30.332904 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-31 08:38:15 经度: 121.325103 纬度: 30.332958 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	电缆沟开挖	电缆套管敷设
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-06-02 14:10:40 经度: 121.326833 纬度: 30.332546 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-06-02 16:23:35 经度: 121.326745 纬度: 30.3326 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
