

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 07 月 01 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	95%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： (1)、10 栋 3*70+35 光伏电缆接入逆变器工作全部完成。 (2)、下行桥架及敷设 3*70+35 光伏电缆完成。 (3)、并网柜低压电缆接入园区 A2 配电房低压配电柜内。 (4)、现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料并网柜产值约 20 万元。 累计完成约 422.2 万元，约占总合同价的 91.78%(按合同价 460 万元计算)。		
3、下步计划	下周计划： (1)、并网柜低压电缆接入园区 A1 配电房低压配电柜内。 (2)、储能柜就位及线路连接 (3)、严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		
4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，施工过程中保持好楼面卫生，		
5、需要协调问题			

目前进度：

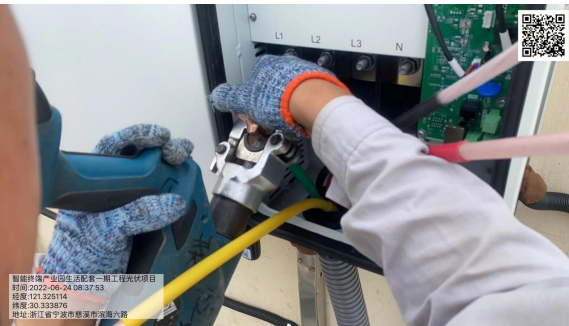
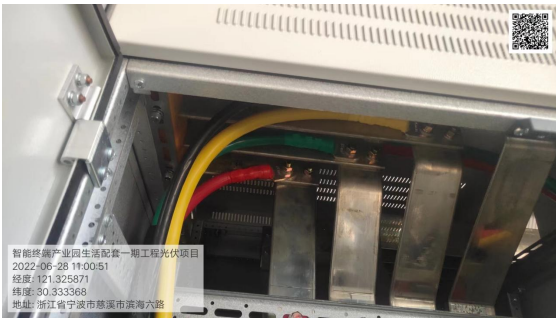
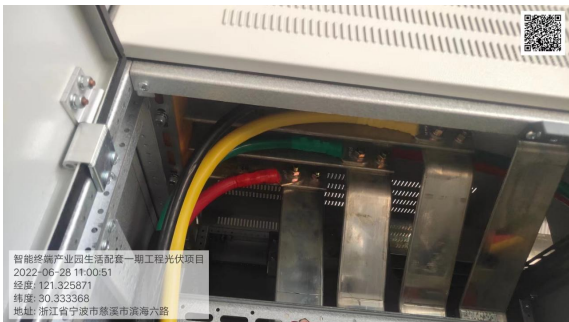
- (1) 10 栋 3*70+35 光伏电缆接入逆变器工作全部完成。
- (2) 下行桥架及敷设 3*70+35 光伏电缆完成。
- (3) 并网柜低压电缆接入园区 A2 配电房低压配电柜内。
- (4) 处 A1 配电房电缆未接入、储能柜未就位，并网前的所有施工任务以完成。
- (5) 投资情况：完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料并网柜产值约 20 万元。累计完成约 422.2 万元，约占总合同价的 91.78%(按合同价 460 万元计算)。
- (6) 下步计划： 并网柜低压电缆接入园区 A1 配电房低压配电柜内、储能柜就位及线路连接。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监理部



附现场照片：

文字描述	输出电缆接入逆变器	输出电缆制作电缆头
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-24 08:50:08 经度: 121.325143 纬度: 30.333864 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-24 08:37:53 经度: 121.325114 纬度: 30.333876 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	安装桥架	低压电缆搭接
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 09:42:23 经度: 121.325063 纬度: 30.333793 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 11:00:51 经度: 121.325871 纬度: 30.333368 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	接地线搭接	制作低压电缆头
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 09:22:44 经度: 121.323652 纬度: 30.33374 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 11:02:51 经度: 121.325245 纬度: 30.332921 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	并网柜低压电缆接入低压柜	并网柜低压电缆接入低压柜
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 11:00:51 经度: 121.325871 纬度: 30.333368 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 时间: 2022-06-28 11:01:03 经度: 121.325871 纬度: 30.333368 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
