

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 第二期

项目名称: 余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目		填报周期: 2022 年 07 月 18 日—07 月 24 日		
一、项目总体建设进度汇总:				
1、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%; 倒运摆放完成 100%。				
2、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏支架吊装至屋面完成 100%; 光伏支架安装已按图纸设计要求完成约 20%。				
3、余姚市家佳电器有限公司组件到货检测。				
4、电子图已出，纸质版蓝图未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶水泥墩倒运摆放完成 100%。			
5、支架及组件安装	余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏支架安装完成约 20%。			
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未开始			
9、出图情况	电子图已出，纸质版图纸未见。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件	7 月 24 日	7 月 22 日	组件到货 100%
	汇流箱	无		
	逆变器	7 月 28 日	7 月 22 日	逆变器到货 100%
	并网柜	7 月 31 日		
	线 缆	8 月 02 日		
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）6 人/天。吊车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				


项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施工	7 月 18 日		7 月 21 日	
2、首套组件安装	7 月 24 日		7 月 27 日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	8 月 11 日		8 月 12 日	
5、全容量并网	8 月 11 日		8 月 12 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：辛国顺 审核人：_____ 时间：2022年07月24日

工程现场照片（含文字描述）：



水泥墩倒运摆放

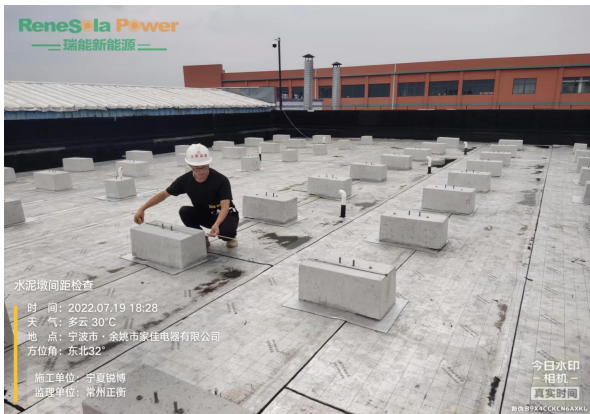

水泥墩间距检查



光伏支架切割部位防腐




组件到货



组件卸货



组件检测

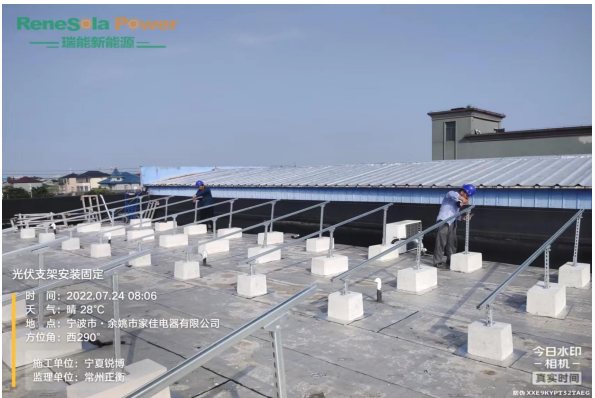

光伏支架安装固定
