

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 第四期

项目名称:余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目		填报周期: 2022 年 09 月 05 日—09 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总:				
1、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%; 倒运摆放完成 100%。				
2、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏支架吊装至屋面完成 100%; 光伏支架安装已按图纸设计要求完成 100%。				
3、余姚市家佳电器有限公司组件到货检测; 组件吊装至屋面完成 100%; 组件搬运分散完成 100%; 组件安装固定完成约 98%。				
4、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏逆变器支架焊接固定完成 100%; 光伏逆变器安装完成 100%。				
5、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶电缆桥架分散连接完成约 40%。光伏直流电缆敷设完成 100%。				
6、余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶防雷接地扁铁焊接完成完成约 80%。				
7、电子图已出, 纸质版蓝图未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶水泥墩倒运摆放完成 100%。		
5、支架及组件安装		余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏支架安装完成 100%。组件安装固定完成约 98%。		
6、逆变器及箱变		余姚市家佳电器有限公司混凝土屋顶光伏逆变器安装完成 100%。		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		未开始		
9、出图情况		电子图已出, 纸质版图纸未见。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货（0%）, 已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件	7 月 24 日	7 月 22 日	组件到货 100%

	汇流箱	无		
	逆变器	7 月 28 日	7 月 22 日	逆变器到货 100%
	并网柜	7 月 31 日		并网柜到货 100%
	线 缆	8 月 02 日		线 缆到货 100%
11、人员/机械情况		施工人员（含管理）4 人/天。吊车 1 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 （简述）
1、首个基础施工	7 月 18 日		7 月 21 日	
2、首套组件安装	7 月 24 日		7 月 27 日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	8 月 11 日		8 月 12 日	
5、全容量并网	8 月 11 日		8 月 12 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题 解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：辛国顺 审核人：_____ 时间：2022 年 09 月 11 日

工程现场照片（含文字描述）：




防雷接地扁铁焊接



组件安装固定



防雷接地扁铁除锈防腐

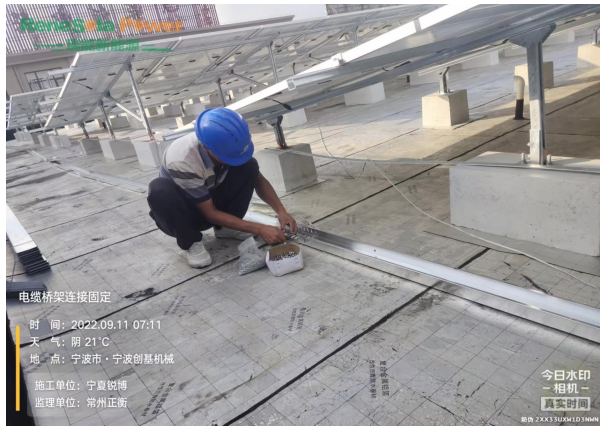

电缆桥架分散连接



直流电缆敷设



公母插头制作
