

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

(2022 年 10 月 14 日-2022 年 10 月 20 日)

第 008 期

编制时间： 2022. 10. 20

监理单位编制人：孔令才

监理单位审核人：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目监理项目部



监 理 周 报

一、工程概况：

项目名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

建设单位:滁州申曜新能源科技有限公司

监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司

本期项目为建设 31MW 的光伏电站，在彩钢瓦屋顶、水泥屋顶及停车场场棚区域(共计 237000 平方米)建设分布式光伏发电项目，总投资金额约 13020 万元，计划于 2023 年建成并网发电。项目建成后，预计年均发电量约 3080 万 kWh。本项目运行模式为：自发自用，余电上网。本项目根据不同地块及区域划分，共分五个子项目：

- 1、安徽全柴动力股份有限公司 2.5MW 分布式光伏发电子项目；
- 2、安徽全柴动力股份有限公司天利厂区 8MW 分布式光伏发电子项目；
- 3、安徽欧波管业科技有限公司 3MW 分布式光伏发电子项目；
- 4、安徽全柴天和机械有限公司实型铸造厂区 8MW 分布式光伏发电子项目；
- 5、安徽全柴天和机械有限公司 9.5MW 分布式光伏发电子项目。

二、本周工作完成情况：

1、本周主要完成以下工作：

- 1) 天和金加工车间收尾工作。
- 2) 天和机加工车间光伏组件调平，彩钢瓦封边等消缺工作。
- 3) 天和金加工车间、清理车间吊装支架材料。
- 4) 欧波桁架车间檩条加固件安装完成 94%。

2、其他主要材料设备到货情况：

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	到货统计
1	光伏支架	31MW	7MW	7.7MW	24.8%
2	组件	31MW	0MW	0.7MW	2.3%
3	逆变器	125 台	0 台	28 台	22.4%
4	直流电缆	31MW	0MW	0.7MW	2.3%

3、工程图纸进展情况：

图纸名称	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
加固图纸	/	/	80%	/
安装图纸	90%	30%	40%	60%
土建图纸	50%	0%	0%	50%
电气图纸	90%	40%	40%	60%

备注：只有三个厂区加固有蓝图（天和铸造经计算原结构符合要求无加固），全柴本部厂区暂无图纸。光伏组件排布图纸已出天利厂区和铸造厂区电子版图纸，且有盖章签字。（电缆敷设、电气设备安装图纸为电子版）（电气一次白图已到场）

三、下周计划完成工作：

- 1) 天和金加工车间加固工作组织验收。
- 2) 欧波厂区桁架车间安装系杆，单跨车间加固作业等。
- 3) 天和金加工车间支架分料及导水槽拼接。
- 4) 欧波桁架车间檩条加固件安装完成。

四、存在问题及处理措施：

- 1、临时用电不合规（已整改）。
- 2、斜撑紧固件未紧固（已整改）。

五、本周监理工作总结：

本周我监理人员每天对施工现场进行巡视检查，加强了施工安全的管理，严格控制好施工的质量，督促施工单位加快施工的进度，积极协调各方的关系，监理人员在现场进行全天跟踪式巡视检查，发现问题及时处理，确保了施工的质量和安。本周签发通知单 2 份、会议纪要 1 份，填写巡视检查记录表 7 份，在下周的工作中，我监理单位将继续努力，加强质量和安全等方面的管理工作，确保本项目按业主要求圆满完成。

六、工程影像资料：



欧波厂区檩条加固检查




欧波厂区斜撑加固




金加工车间斜撑加固安装



监理例会

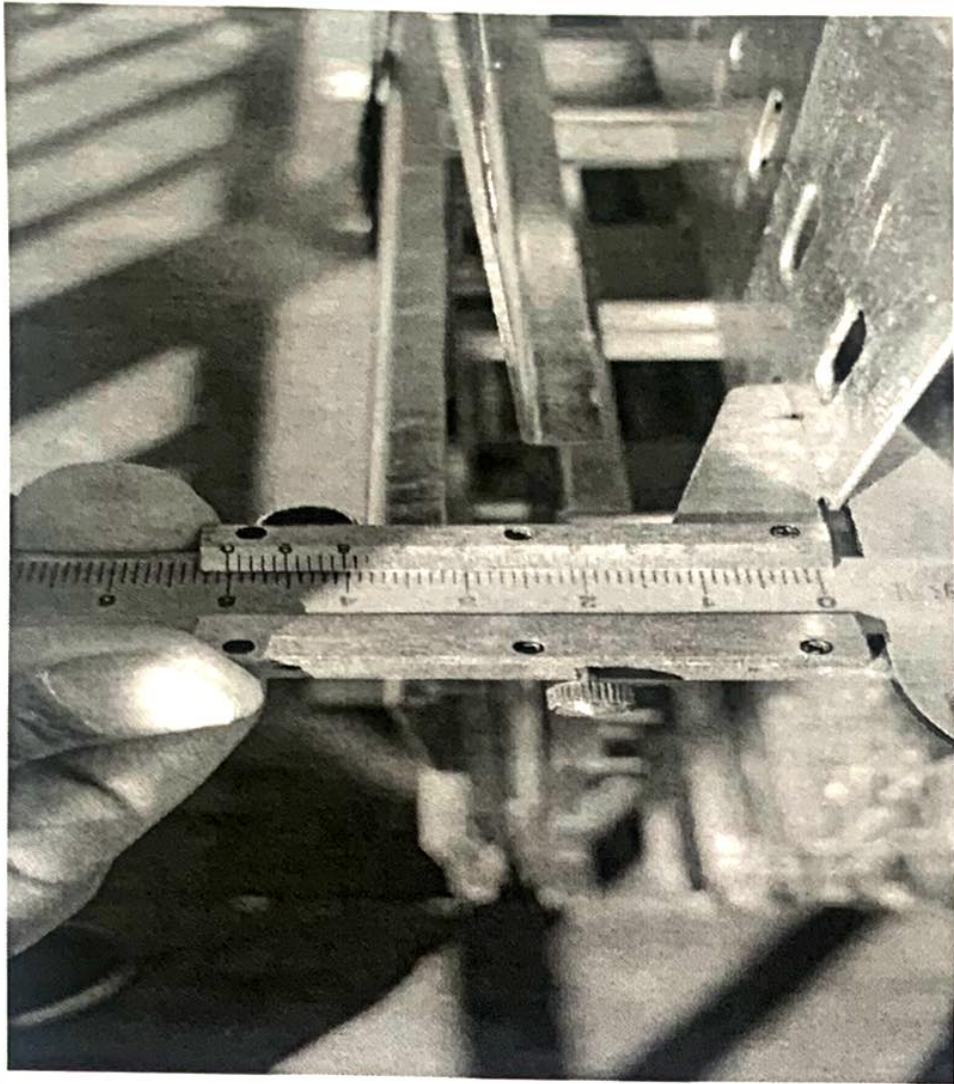

桥架到货测量数值

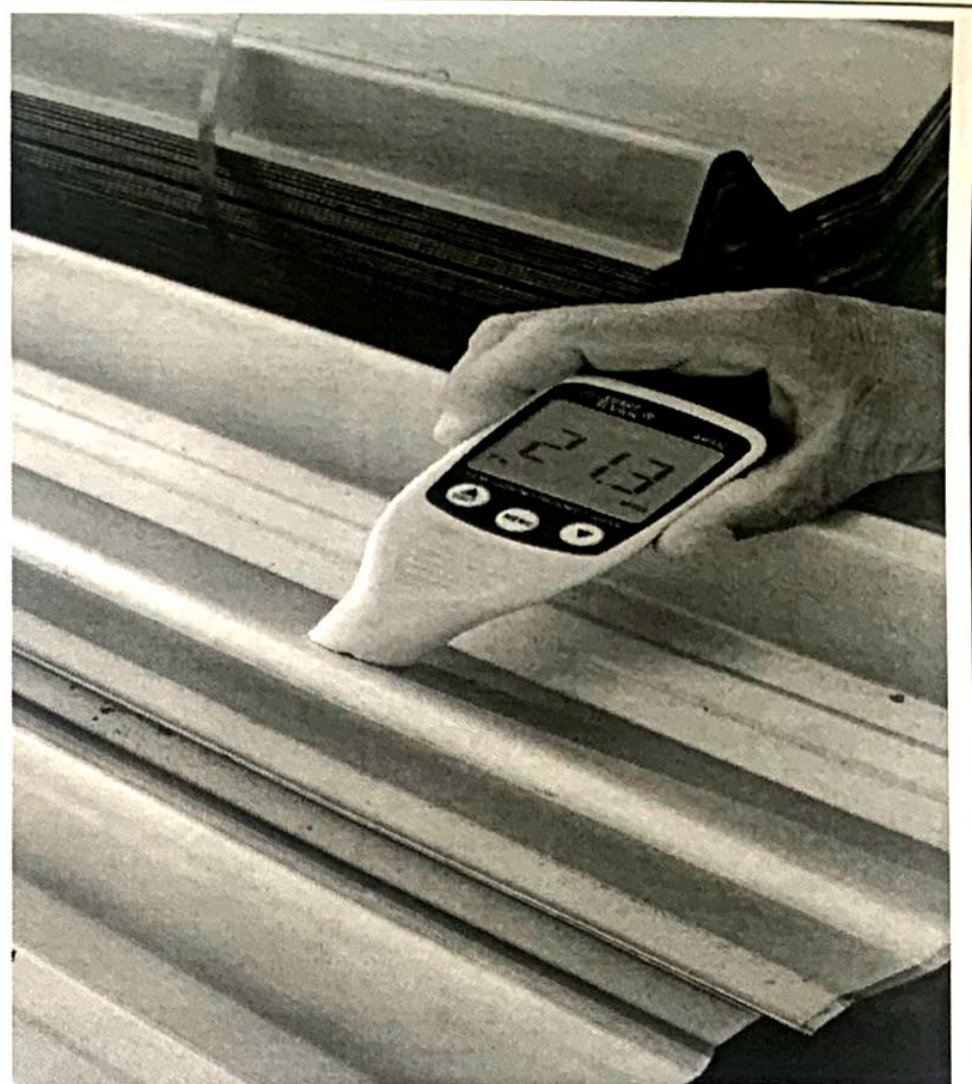

材料镀锌检测数值



进场材料检查



金加工加固验收
