

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

(2023 年 07 月 21 日-2023 年 07 月 27 日)

第 045 期

编制时间： 2023.07.27

监理单位编制人：孔令才

监理单位审核人：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司
安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目监理项目部



扫描全能王 创建

监 理 周 报

一、工程概况:

项目名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

建设单位:滁州申曜新能源科技有限公司

监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司

本期项目为建设 31MW 的光伏电站,在彩钢瓦屋顶、水泥屋顶及停车场场棚区域(共计 237000 平方米)建设分布式光伏发电项目,总投资金额约 13020 万元,计划于 2023 年建成并网发电。项目建成后,预计年均发电量约 3080 万 kWh。本项目运行模式为:自发自用,余电上网。本项目根据不同地块及区域划分,共分五个子项目:

- 1、安徽全柴动力股份有限公司 2.5MW 分布式光伏发电子项目;
- 2、安徽全柴动力股份有限公司天利厂区 8MW 分布式光伏发电子项目;
- 3、安徽欧波管业科技有限公司 3MW 分布式光伏发电子项目;
- 4、安徽全柴天和机械有限公司实型铸造厂区 8MW 分布式光伏发电子项目;
- 5、安徽全柴天和机械有限公司 9.5MW 分布式光伏发电子项目。

二、本周工作完成情况:

1、本周主要完成以下工作:

- 1) 天和厂区屋面水管固定完成。
- 2) 欧波厂区、天利厂区车棚施工安全防护围挡搭建完成。
- 3) 欧波厂区车棚基础开挖完成 50%。
- 4) 厂区光伏安装工程尾工消缺。

2、主要材料设备到货情况:

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	到货统计
1	光伏支架	31MW	0MW	27.5MW	89%
2	组件	31MW	0MW	28.5MW	92%
3	逆变器	127 台	0 台	127 台	100%
4	直流电缆	31MW	0MW	28.5MW	92%
5	接地材料	31MW	0MW	28.5MW	92%
6	交流电缆	31MW	0MW	28.5MW	92%



7	二次系统	1 套	0 套	1 套	100%
8	箱变	13 台	0 台	13 台	100%
9	SVG	5 台	0 台	5 台	100%
10	高压电缆	31MW	0MW	28.5M	92%
11	高压柜	27 台	0 台	27 台	100%

三、下周计划完成工作：

- 1) 天和厂区、欧波厂区地面水管安装。
- 2) 欧波厂区车棚基础挖掘全部完成。
- 3) 厂区光伏安装工程尾工消缺。

四、存在问题及处理措施：

监理人员巡视检查发现个别施工人员安全帽等安全防护用品佩戴不规范，已要求施工单位整改完成。

五、本周监理工作总结：

本周我监理人员每天对施工现场进行巡视检查，加强了施工安全的管理，严格控制好施工的质量，督促施工单位加快施工的进度，积极协调各方的关系，监理人员在现场进行全天跟踪式巡视检查，发现问题及时处理，确保了施工的质量和安安全，本周签发会议纪要 1 份。在下周的工作中，我监理单位将继续努力，加强质量和安全等方面的管理工作，确保本项目按业主要求圆满完成。

六、工程影像资料：






天和厂区清洗系统安装



天和厂区清洗系统安装检查

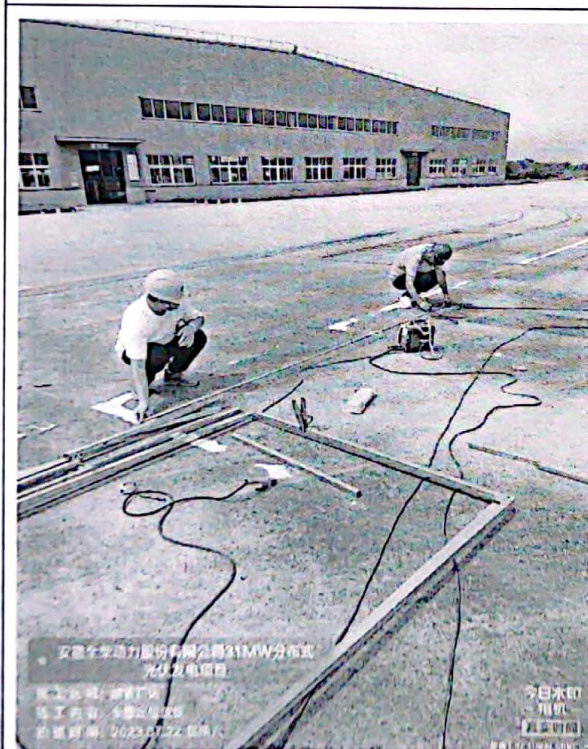

欧波厂区车棚基础定位放线



欧波厂区车棚基础挖掘施工





欧波厂区车棚基础挖掘施工检查



监理例会

