

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2022 年 11 月第 03 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 20 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 1185 根, 完成总量的 97.6%;
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架到场 100%;
3. 光伏组件到场 6428 块 4242480W 累计到场 100%; 电缆桥架、交直流电缆全部到场;
4. 光伏区 4#方阵具备并网条件, 南侧鱼塘光伏组件安装完成 85%;
5. 10kV 临时线路已经送电。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查;
2. 审批施工单位项目部报验的资料 10 份;
3. 主持召开监理周例会 1 次, 编写会议纪要 1 份;
4. 下发监理工作联系单 1 份, 工程考核单 1 份, 设备材料开箱检验记录 2 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 6#7#8#9#10#11#逆变器具备并网条件;
2. 西侧鱼塘光伏组件安装完成;
3. 东侧鱼塘补桩完成, 光伏支架安装完成 50%。



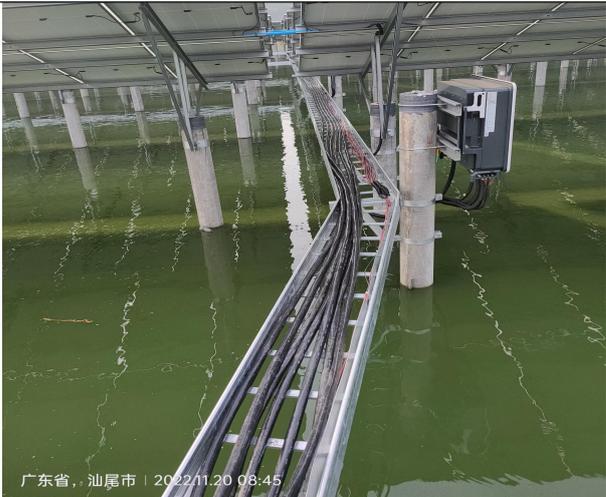
填报人: 贾振军

审核人: 王立杰

日期: 2022 年 11 月 20 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	组件转运	组件到场卸货
照片		

文字描述	敷设交流电缆	安装电缆桥架
		
文字描述	清理组件	箱变防雷接地电阻值符合要求
		
文字描述	交流电缆敷设	东侧小鱼塘补桩
	 <p>广东省，汕尾市 2022/11/20 08:45</p>	
