

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 12 月第 02 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 12 月 05 日至 2022 年 12 月 11 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 地块 PHC 管桩全部打桩完成;
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架和组件全部到场;
3. 电缆桥架、防雷接地扁钢、交直流电缆全部到场;
4. 10kV 临时线路已经送电;
5. 光伏区 B 地块 4.2372 兆瓦全额并网发电。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 地块施工现场巡视检查, 发现问题及时要求施工人员进行整改;
2. 审批施工单位项目部报验的检验批资料 4 份;
3. 1#2#3#逆变器交流电缆绝缘阻抗测试和光伏方阵组串开路电压测试, 测试结果符合要求;
4. 编写平行检验记录 3 份, 监理检查记录 1 份, 下发工作联系单 2 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区鱼塘内对安装不合格的光伏支架、组件进行消缺整改;
2. 光伏区四周围栏施工。

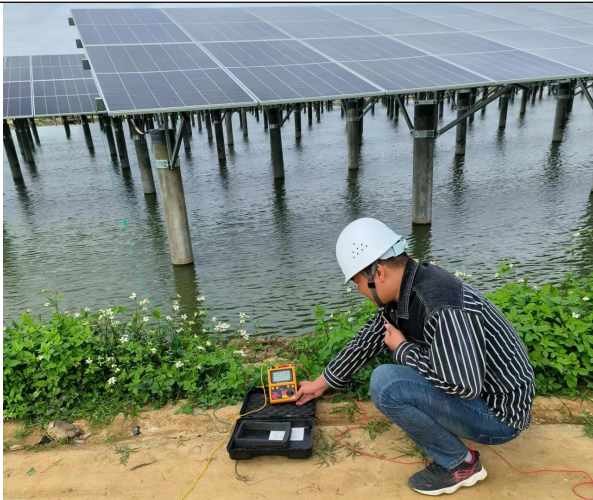
填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 12 月 11 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	焊接光伏支架立柱横担	安装组件间等电位连接线
照片		

文字描述	防雷接地环网接地电阻测试	安装光伏支架拉杆
		
文字描述	1#2#3#逆变器交流电缆绝缘阻抗测试	逆变器交流电缆安装
		
文字描述	1#2#3#逆变器断路器防火封堵	光伏区 B 地块全额并网发电
		
