

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 10 月第 5 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 01 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块桩基累计施工完成 7356 根, 本周实际打桩完成 592 根, 补桩完成 15 根;
(1#1093 根 3#774 根 5#1181 根 7#1289 根 9#699 根 10#1189 根 11#1131 根)
2. 材料到场情况: 1) 预应力高强混凝土管桩累计到场 7655 根, 本周实际到场 597 根;
2) 光伏支架及配件到场 2.5 兆瓦。
3. 投入的人员情况: 管理人员 8 名, 桩基施工班组 11 人, 光伏支架安装班组 9 人;
4. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、挖机 2 台、补桩机 1 台;
5. 其他: 本周天气多云 3 天, 晴 3 天, 阴 1 天, 实际施工 7 天。

二、本周监理工作内容:

1. 光伏区 D 地块 5#方阵桩基承载力检测, 监理人员全程跟踪旁站, 检测结果符合设计要求;
2. 审批施工单位报验的过程资料 6 份、材料报验资料 5 份、供货商资质报验 4 份;
3. 太阳能光伏支架到场, 监理人员全程跟踪验货, 镀锌层厚度及规格型号符合设计要求;
4. 监理工程师对防腐完成的桩头进行验收, 面漆厚度及外观符合要求, 同意进行下一道工序;
5. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
6. 编写平行检验记录 10 份、旁站监理记录 8 份、设备材料开箱检查记录 11 份、安全旁站监理记录 7 份、监理周报 1 份, 下发监理通知单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 D 地块打桩计划完成 600 根, 补桩计划完成 250 根;
2. 桩头除锈刷环氧富锌底漆, 计划完成 900 根;
3. 光伏区 D 地块 11.64MWp 区域安装光伏支架 2x15 阵列 300 组。

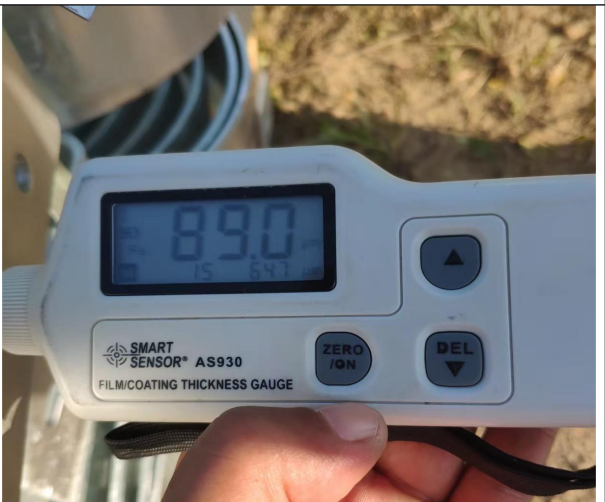
填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 11 月 01 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	监理周例会 10 月 26 日星期四	光伏区 D 地块 5#方阵桩基抗压承载力检测 10 月 27 日星期五
形象进度照片	 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 拍摄时间: 2023.10.26 星期四 10:22 天气: 晴 25°C 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 工作内容: 监理例会 地点: 施工项目部	 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 5#方阵桩基承载力检测 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.27 星期五 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司

文字描述	光伏区 D 地块 5#方阵桩基抗拔承载力检测 10 月 27 日星期五	桩头防腐刷面漆 10 月 28 日星期六
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 5#方阵桩基承载力检测 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.27 星期五 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 桩头防腐刷面漆 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.28 星期六 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
文字描述	3#光伏方阵打桩作业 10 月 29 日星期日	10#箱逆变一体机桩基施工 10 月 30 日星期一
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 3#方阵打桩作业 施工责任人: 寸守荣 拍摄时间: 2023.10.29 星期日 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 10#箱逆变一体机桩基施工 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.30 星期一 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
文字描述	光伏支架到场卸货 10 月 31 日星期二	抱箍镀锌层厚度符合要求 11 月 01 日星期三
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 光伏支架到场卸货 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.31 星期二 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司	 SMART SENSOR® AS930 FILM/COATING THICKNESS GAUGE
