

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 10 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 10 月 07 日至 2024 年 10 月 13 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 升压站配电楼±0.00m 基础筏板、梁砼浇筑完成, 框架柱钢筋绑扎完成, 模板安装完成, 屋面板支模脚手架搭设完成, 外部脚手架搭设完成, 屋面板模板安装完成, 钢筋绑扎完成 30%; 2. 升压站储能区交流舱基础砼浇筑完成, 防火墙-0.800m 段砼浇筑完成, 至 5.000m 段构造柱钢筋绑扎完成, 脚手架搭设完成; 3. 升压站消防水池筏板、基础梁、剪力墙钢筋绑扎完成; 4. 升压站 GIS 基础及构架基础钢筋绑扎完成; 5. 升压站 1#主变压器基础及构架钢筋绑扎完成; 6. 升压站 SVG 基础钢筋绑扎完成; 7. 升压站附属房基础承台钢筋绑扎完成; 8. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装完成; 9. 投入的人员情况: 管理人员 7 名、钢筋工 15 人、木工 12 人, 架子工 12 人, 施工员 2 名, 安全员 1 名; 10. 材料到场情况: 升压站钢筋材料到场 1 车 33.178 吨; 11. 投入的机械情况: 200 型挖机 1 辆、60 型挖机 1 辆、25 吨吊车 1 辆; 12. 检测情况: 升压站 J-6 基桩单桩竖向抗拔承载力检测, SVG 设备基桩、消防水池基桩、附属房基桩低应变检测; 13. 天气情况: 晴 4 天、多云 3 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 储能区防火墙±0.00m 至 5.000m 段模板安装完成, 砼浇筑完成; 2. 配电楼框架柱、屋面梁、屋面板砼浇筑完成; 3. 消防水池底板及剪力墙砼浇筑完成; 4. 1#主变压器基础、GIS 基础、架构基础、SVG 基础砼浇筑完成; 5. 附属房基础钢筋绑扎, 生产辅助楼基础开挖。	
三、本周监理工作内容: 1. 升压站配电楼±0.00m 基础筏板及地梁钢筋绑扎和模板安装完成, 施工单位自检合格后报监理项目部验收, 经监理工程师查验, 使用的钢筋规格型号及绑扎间距符合设计要求, 模板安装质量符合规范要求, 基础标高符合设计要求, 同意进行下一道工序; 2. 储能区交流舱基础及防火墙-0.800m 段钢筋绑扎和模板安装完成, 施工单位自检合格后报监理项目部验收, 经监理工程师查验, 使用的钢筋规格型号及绑扎间距符合设计要求, 模板安装质量符合规范要求, 基础标高符合设计要求, 同意进行下一道工序; 3. 升压站配电房±0.00m 基础筏板及地梁砼浇筑, 储能区交流舱基础及防火墙-0.800m 段砼浇筑, 监理工程师全程跟踪旁站, 设备机械运行正常, 浇筑质量符合规范要求, 同步形成旁站监理记录; 4. 消防水池钢筋绑扎完成、GIS 基础钢筋绑扎完成、SVG 基础钢筋绑扎完成, 施工单位自检合格后报监理项目部验收, 经监理工程师查验, 使用的钢筋规格型号及绑扎间距符合设计要求, 同意进行下一道工序; 5. 升压站 J-6 基桩单桩竖向抗拔承载力检测, SVG 设备基桩、消防水池基桩、附属房基桩低应变检测, 监理工程师全程跟踪旁站, 检测人员持证上岗, 检测设备在校准期内合格有效, 检测结果满足设计要求; 6. 审批施工单位报验的资料 6 份。	

填 报 人: 贲振军

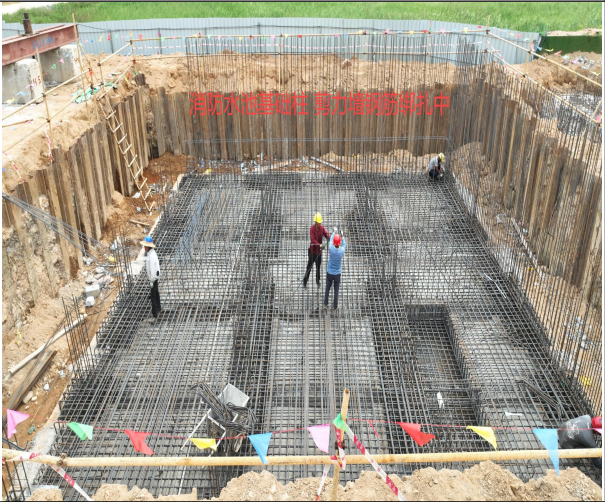
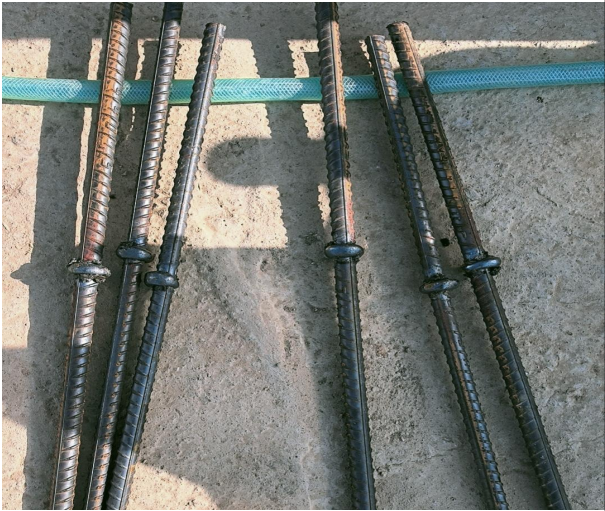
审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 10 月 14 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	升压站储能区防火墙模板验收 2024 年 10 月 07 日星期一	升压站配电楼±0.00m 基础板钢筋验收 2024 年 10 月 07 日星期一
形象进度照片		
文字描述	升压站 J-6 基桩单桩竖向抗拔承载力检测 2024 年 10 月 07 日星期一	升压站储能区交流舱基础砼浇筑 2024 年 10 月 07 日星期一
形象进度照片		
文字描述	升压站储能区防火墙砼浇筑 2024 年 10 月 07 日星期一	升压站配电楼±0.00m 基础板 梁砼浇筑 2024 年 10 月 07 日星期一
形象进度照片		

文字描述	升压站消防水池基础梁定位放线 2024 年 10 月 08 日星期二	升压站 SVG 设备基桩低应变检测 2024 年 10 月 08 日星期二
形象进度照片		海丰通威120MWp渔光互补光伏发电项目 计 数: 2354 施 工 区 域: 升压站 施 工 内 容: 设备基础桩低应变检测 拍摄时间: 2024.10.08 10:24 天 气: 晴 20℃ 地 点: 海丰县·天石镇 桩 径: 18.5米 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施 工 单 位: 浙江阳明电力建设有限公司
文字描述	升压站消防水池基础梁板钢筋绑扎 2024 年 10 月 09 日星期三	升压站配电楼框架柱钢筋电渣压力焊接头 2024 年 10 月 09 日星期三
形象进度照片		海丰通威120MWp渔光互补光伏发电项目 施 工 区 域: 升压站地块 施 工 内 容: 配电楼框架柱钢筋电渣压力焊 施工责任人: 罗岗 拍摄时间: 2024.10.09 11:01 建 设 单 位: 海丰通威渔光科技有限公司 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施 工 单 位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印 相机
文字描述	升压站配电楼搭设支模脚手架 2024 年 10 月 10 日星期四	升压站配电楼框架柱钢筋绑扎 2024 年 10 月 10 日星期四
形象进度照片		

文字描述	升压站配电楼外部脚手架搭设 2024 年 10 月 10 日星期四	升压站消防水池剪力墙钢筋绑扎 2024 年 10 月 11 日星期五
形象进度照片		
文字描述	升压站储能区防火墙构造柱钢筋绑扎 2024 年 10 月 12 日星期六	钢筋电渣压力焊接头见证取样送检 2024 年 10 月 12 日星期六
形象进度照片		
文字描述	升压站消防水池钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日	升压站消防水池钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日
形象进度照片	  海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 升压站地块 施工内容: 消防水池基础钢筋验收 施工责任人: 罗闰 拍摄时间: 2024.10.13 10:00 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机	  海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 升压站地块 施工内容: 消防水池基础钢筋验收 施工责任人: 罗闰 拍摄时间: 2024.10.13 10:00 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机

文字描述	升压站 SVG 基础钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日	升压站 SVG 基础钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：SVG基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:03 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：SVG基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:03 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
文字描述	升压站 GIS 基础钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日	升压站 GIS 基础钢筋验收 2024 年 10 月 13 日星期日
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：GIS基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:06 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：GIS基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:06 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
文字描述	升压站配电楼框架柱模板加固 2024 年 10 月 13 日星期日	升压站配电楼屋面梁钢筋绑扎 2024 年 10 月 13 日星期日
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：GIS基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:06 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站地块 施工内容：GIS基础钢筋验收 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.10.13 10:06 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
