

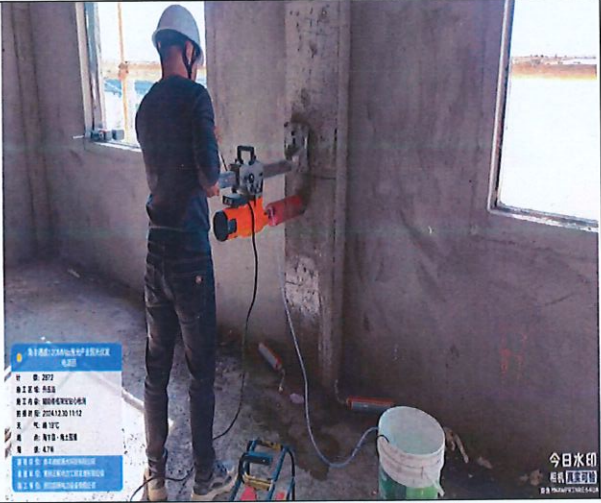
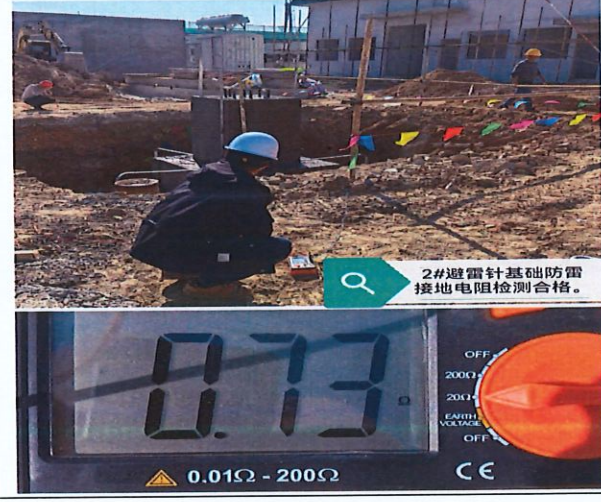
海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2025 年 01 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 01 月 05 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 生产辅助楼外墙油漆施工完成 60%, 水电开槽完成 100%, 屋面防水施工完成 100%; 2. 室外雨污水管道施工完成 90%, 10kV 站用变支架基础混凝土浇筑完成, 生活污水调节池基础完成 90%, 消防管沟开挖完成 70%; 3. 配电楼室内抛光地板砖铺贴施工完成 80%, 屋面防水施工完成 100%; 4. 主变压器附件及附属设备安装完成 100%, SVG 安装完成 100%, GIS 安装完成 100%, 接地及设备接地安装完成 80%, 35kV 开关柜安装就位 9 台, 二次屏柜安装就位 20 台; 5. 投入的人员情况: 升压站土建施工人员 20 名、电气设备安装人员 6 名, 施工员 2 名, 安全员 2 名; 6. 材料及设备到场情况: 1) 河北久维电子科技有限公司生产: 直流充电屏 2 面, 直流馈线屏 2 面, UPS 电源屏 2 面, 试验电源屏 1 面, 理士蓄电池 DJ300M 104 只, 圣阳蓄电池 GFMD 300C 104 只, 屏间线 46 根, 电池连接排 196 根, 电池架 2 套, 放电仪 JWBDU22030-A1 2 台, 备品备件 1 箱; 2) 广东必达电器有限公司生产: 高压开关柜 (KYN61-40.5) 到场 9 台。 7. 投入的机械情况: 70 型挖掘机 1 辆, 60 型挖掘机 1 辆, 25 吨吊车 1 辆, 自卸吊 1 辆; 8. 天气情况: 晴 3 天、多云 2 天、阴转多云 2 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 生产辅助楼外墙油漆施工完成 100%; 2. 站内雨污水管道施工完成 100%; 3. 生活污水调节池基础完成 100%; 4. 配电楼室内抛光地板砖、耐酸地砖铺贴完成 100%; 5. 室外消防管道安装完成 100%, 电缆沟开挖施工; 6. 主变压器完成注油, GIS 设备完成充气, 二次屏柜安装完成 100%。	
三、本周监理工作内容: 1. 河北久维电子科技有限公司生产的直流充电屏到场 2 面, 直流馈线屏到场 2 面, UPS 电源屏到场 2 面, 试验电源屏到场 1 面, 理士蓄电池 (DJ300M) 到场 104 只, 圣阳蓄电池 (GFMD 300C) 到场 104 只, 屏间线到场 46 根, 电池连接排到场 196 根, 电池架到场 2 套, 放电仪 (JWBDU22030-A1) 到场 2 台, 备品备件到场 1 箱, 经监理工程师开箱检验, 设备外观完好, 出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装; 2. 广东必达电器有限公司生产的高压开关柜 (KYN61-40.5) 到场 9 台, 经监理工程师开箱检验, 设备外观完好, 出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装; 3. 室外生活污水处理装置和 10kV 站用变支架基础钢筋绑扎完成, 经监理工程师检验合格, 同意进行下一道工序, 基础混凝土浇筑, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求; 4. 室外排水管沟开挖完成, 经监理工程师检验, 排水管沟宽度及坡度符合设计要求, 同意进行排水管道的敷设, 排水管道混凝土保护层浇筑, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求; 5. 生产辅助楼框架柱钻芯法取样检测混凝土强度, 监理工程师全程旁站, 检测结果符合设计要求; 6. 主变压器 25#油取样, 监理工程师全程见证取样送检; 7. 升压站一二次设备安装就位, 监理工程师全程旁站, 施工工序和质量符合要求; 8. 主持召开监理例会 1 次, 设备材料开箱检验记录 3 份, 旁站监理记录 3 份;	
填 报 人: 贾振军	审 核 人: 王立杰
时 间: 2025 年 01 月 05 日	

海丰通威 120MWp
渔光产业园光伏发电项目
监理单位

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	升压站主变压器附件安装 2024年12月30日星期一	生产辅助楼框架柱钻芯取样检测混凝土强度 2024年12月30日星期一
形象进度照片		
文字描述	2#避雷针基础防雷接地焊接完成 2024年12月30日星期一	2#避雷针防雷接地电阻测试 2024年12月30日星期一
形象进度照片		
文字描述	主持召开监理例会 2024年12月31日星期二	生产辅助楼屋面防水 2024年12月31日星期二
形象进度照片		

文字描述	继电器室二次设备安装 2025 年 01 月 01 日星期三	室外生活污水调节池砌筑抹灰 2025 年 01 月 02 日星期四
形象进度照片		
文字描述	室外消防管沟机械开挖 2025 年 01 月 03 日星期五	35kV 开关室高压开关柜安装就位 2025 年 01 月 04 日星期六
形象进度照片		
文字描述	25#变压器油见证取样送检 2025 年 01 月 05 日星期日	25#变压器油见证取样送检 2025 年 01 月 05 日星期日
形象进度照片	
