

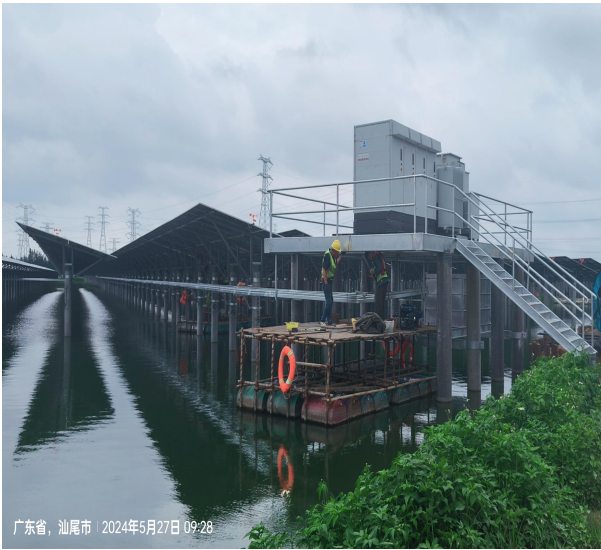
海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 5 月第 5 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 2 日
一、本周施工进度情况: 1. 光伏区 D 地块共计 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%; 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%; 本周电缆桥架安装完成 567 米, 累计安装完成 76.6%; 1x4mm² 直流电缆敷设完成 25200 米, 累计敷设完成 88.52%; 2x300mm² 直流电缆敷设完成 1000 米, 累计完成 62.31%; 箱逆变一体机 2x300mm² 电缆终端头制作安装完成 4 台, 累计完成 63.64%。 2. 本周材料和设备到场情况: 无 3. 投入的人员情况: 管理人员 6 名, 电气班组 16 人。 4. 投入的机械情况: 小货车 1 辆。 5. 本周天气情况: 阵雨 2 天、阴转中雨 2 天、多云 2 天、中雨转阴 1 天。	
二、本周监理工作内容: 1. 监理项目部组织参建单位各专业负责人对光伏区 D 地块的支架和组件安装、光伏支架桩基及低压电气施工分项工程进行验收, 并形成验收记录 1 份; 2. 下发监理工作联系单 1 份; 3. 审批施工单位报验的资料 5 份; 4. 编写监理检查记录 2 份、监理月报 1 份; 5. 施工现场巡视检查, 发现质量问题和安全隐患及时要求施工单位进行整改。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 6 月 3 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	敷设 2x300mm ² 直流电缆 2024 年 5 月 27 日星期一	安装电缆桥架 2024 年 5 月 27 日星期一
形象进度照片		

文字描述	2x300mm2 电缆终端头制作安装 2024 年 5 月 28 日星期二	分项工程验收 2024 年 5 月 29 日星期三
形象进度照片		
文字描述	摇表测量 2x300mm2 电缆绝缘 2024 年 5 月 30 日星期四	暴雨黄色预警天气 2024 年 5 月 31 日星期五
形象进度照片		
文字描述	电缆桥架整改 2024 年 6 月 1 日星期六	2x300mm2 电缆终端头制作安装 2024 年 6 月 2 日星期日
形象进度照片		
