

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 6 月第 4 期

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 建设单位:海丰通威渔光科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 填报周期: 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| <p>一、本周施工进度情况:</p> <p>1. 光伏区 D 地块 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%, 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%, 低压电气施工累计完成 80%;</p> <p>2. 光伏区 C 地块为 12#方阵, 计划安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 本周光伏支架桩基打桩完成 95 根, 累计打桩完成 81.31%;</p> <p>3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根, 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根, 本周光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管贯通 1 路, MPP 高压电力电缆护套管热熔完成 1998 米;</p> <p>4. 材料和设备到场情况:MPP110x10 套管到货 1665 米,MPP160x14 套管到货 2385 米,MPP200x14 套管到货 378 米, 50x5 热镀锌扁钢到场 500 根;</p> <p>5. 投入的人员情况: 管理人员 5 名、电气班组 16 人、打桩班组 6 人, 集电线路施工班组 5 人;</p> <p>6. 投入的机械情况: 25 吨吊车 1 辆、打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、小货车 1 辆、顶管设备 1 套;</p> <p>7. 天气情况: 阵雨 5 天、多云 1 天、阴 1 天。</p> |                                        |
| <p>二、本周监理工作内容:</p> <p>1. 由芜湖新磊塑胶科技有限公司生产的 MPP 高压电力电缆护套管到场, 经监理工程师查验, MPP 高压电力电缆护套管外观完好, 管壁厚度实测符合要求, 产品出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;</p> <p>2. 50mmx5mm 热镀锌扁钢到场验货, 镀锌层平均厚度及扁钢厚度满足设计要求, 同意进场使用;</p> <p>3. 编写设备材料开箱检验记录 2 份, 安全监理旁站记录 1 份, 平行检验记录 1 份, 旁站监理记录 1 份, 审批检验批资料 4 份;</p> <p>4. 监理工程师与施工单位电气专业负责人对光伏区 D 地块 1#2#3#方阵电气施工分项工程进行预验收, 同步下发分项工程预验收整改单 1 份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |

填 报 人: 贾振军



审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 6 月 30 日

工程现场照片: (含文字描述)

|        |                                                                                     |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述   | 光伏区 C 地块支架桩基打桩作业<br>2024 年 6 月 24 日星期一                                              | 光伏区 D 地块 9#方阵焊接防雷接地装置<br>2024 年 6 月 24 日星期一                                          |
| 形象进度照片 |  |  |

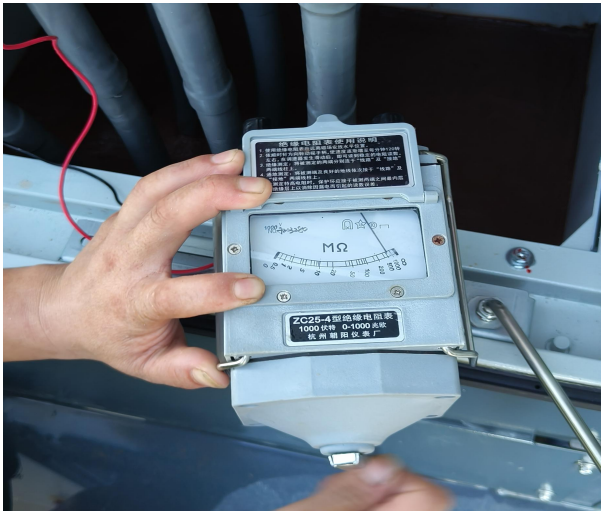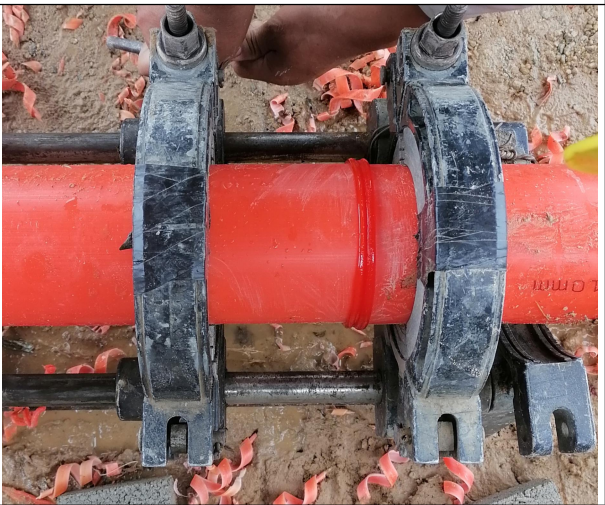

|        |                                                                                     |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述   | 光伏区 D 地块 9#方阵桩头横担焊接<br>2024 年 6 月 25 日星期二                                           | 集电线路 329 米段顶管施工作业<br>2024 年 6 月 26 日星期三                                              |
| 形象进度照片 |    |    |
| 文字描述   | 2x300mm <sup>2</sup> 直流电缆绝缘检测<br>2024 年 6 月 27 日星期四                                 | 测量镀锌扁钢镀锌层厚度符合设计要求<br>2024 年 6 月 28 日星期五                                              |
| 形象进度照片 |   |   |
| 文字描述   | 测量镀锌扁钢厚度符合设计要求<br>2024 年 6 月 29 日星期六                                                | 集电线路 MPP 高压电力电缆护套管热熔连接<br>2024 年 6 月 30 日星期日                                         |
| 形象进度照片 |  |  |
