

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 8 月第 1 期

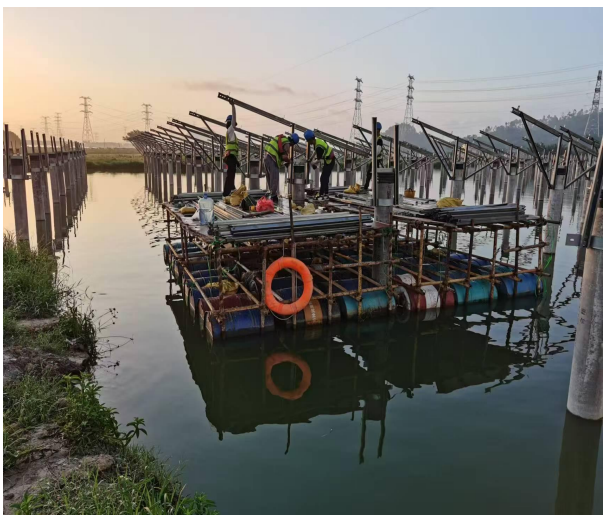
建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 07 月 29 日至 2024 年 08 月 04 日
一、总体工程量汇总: - 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp, 光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根, 320kW 组串式逆变器 11 台, 通讯箱 1 台, 于 2022 年 12 月 1 日临时并网发电; - 光伏区 C 地块安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 箱逆变一体机桩基 8 根, 累计完成 100%; - 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp, 光伏支架桩基 15818 根, 累计完成 100%, 箱逆变一体机桩基 88 根, 累计完成 100%, 光伏支架累计安装完成 100%, 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%, 低压电气施工累计完成 95%; - 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根, 累计完成 100%; 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根, 累计完成 100%; - 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基 213 根, 累计打桩完成 100%。	
二、本周施工进度情况: - 光伏区 C 地块光伏支架的抱箍、前立柱、后立柱安装完成 220 个, 累计安装完成 84.94%, 光伏支架斜梁安装完成 440 套, 累计安装完成 49.83%, 光伏支架檩条安装完成 28.5 组阵列, 累计安装完成 35.85%, 光伏组件安装完成 330 块, 累计安装完成 6.92%; - 仓库倒运光伏组件至光伏区 C 地块, 共计 17 箱 561 块; - 光伏区 B 地块围栏安装完成 66 米, 累计安装完成 44.53%, 围栏基础混凝土浇筑完成 80 个; - 升压站临建场地及钢筋制作场地平整完成, 施工用板房安装到位; - 投入的人员情况: 管理人员 6 名、光伏区 B 地块围栏施工班组施工人员 5 名、光伏区 C 地块支架组件安装班组施工人员 14 名、光伏区 D 地块电气消缺班组施工人员 4 名; - 材料到场情况: 无; - 投入的机械情况: 自卸吊 1 辆、叉车 1 辆、板车 1 辆、挖机 1 辆、小货车 1 辆; - 天气情况: 多云 4 天、晴 1 天、阴转小雨 1 天、阵雨 1 天。	
三、本周监理工作内容: - 光伏区 B 地块围栏基础验收, 基础外观尺寸符合设计要求, 同意浇筑混凝土; - 光伏区 C 地块光伏区支架安装质量符合要求, 同意安装光伏组件; - 光伏区施工现场巡视检查, 发现质量问题及时通知施工人员整改, 发现安全隐患及时制止, 同时对违规者进行安全教育, 类似问题不要再次发生; - 高温橙色预警, 要求施工人员错过高温时段施工, 施工现场备足防暑降温物品; - 审批施工单位报验的施工方案 4 份; - 审批施工单位报验的检验批资料 6 份; - 编写监理月报 1 份, 监理周报 1 份, 监理检查记录 3 份。	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 08 月 05 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏区 D 地块桩头防腐整改消缺 2024 年 7 月 29 日星期一	光伏区 C 地块支架桩基桩头刷面漆 2024 年 7 月 30 日星期二
形象进度照片		
文字描述	光伏区 C 地块安装抱箍前后立柱 2024 年 07 月 30 日星期二	光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁 2024 年 07 月 30 日星期二
形象进度照片		
文字描述	光伏区 C 地块光伏支架斜梁安装 2024 年 07 月 31 日星期三	T9T10 箱逆变一体机事故油池位置需要整改 2024 年 08 月 01 日星期四
形象进度照片		

文字描述	升压站临建场地平整 2024 年 08 月 01 日星期四	光伏区 C 地块安装光伏支架檩条 2024 年 08 月 02 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区 B 地块围栏基础施工 2024 年 08 月 02 日星期五	光伏区 B 地块东侧围栏基础验收 2024 年 08 月 03 日星期六
		
文字描述	光伏区 C 地块倒运组件 2024 年 08 月 03 日星期六	光伏区 C 地块安装组件 2024 年 08 月 04 日星期日
		
