

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式 光伏发电项目

监 理 周 报


第 一 期

(2022 年 10 月 7 日 2022 年 10 月 14 日)




工程名称	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏 发电项目	建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、联合厂房 1.2 支架吊装已完成 100% 2、联合厂房 1.2 彩钢瓦边已安装安全护栏完成 30%，防坠网夹具安装完成 3、联合厂房 1 已安装安全爬梯 80%		
下周计划	1、完成全部护栏安装， 2、支架安装完成 40% 3、防坠网全部安装完成 4、交流桥架完成 30%		
安全文明施工情况	1、本周安全文明施工状况良好，无任何设备损坏及人身伤亡事故发生。 2、进场工人已进行安全技术交底，严格遵守厂里面安全管理规定。 3、进场工人已佩带好安全帽等劳保用品。 4、现场已配置安全文明标牌、灭火器等设施。		
施工质量	夹具组装完成，垫片齐全。正在安排合适时间做抗拉实验。		
设备材料进场情况	光伏组件到场 6076 片。 光伏支架全部到场。 护栏材料全部到场。 逆变器到场 5 台。		
人员机械情况	总包管理 4 人，监理 1 人，工人 9 人。 吊车一台、叉车一台。		




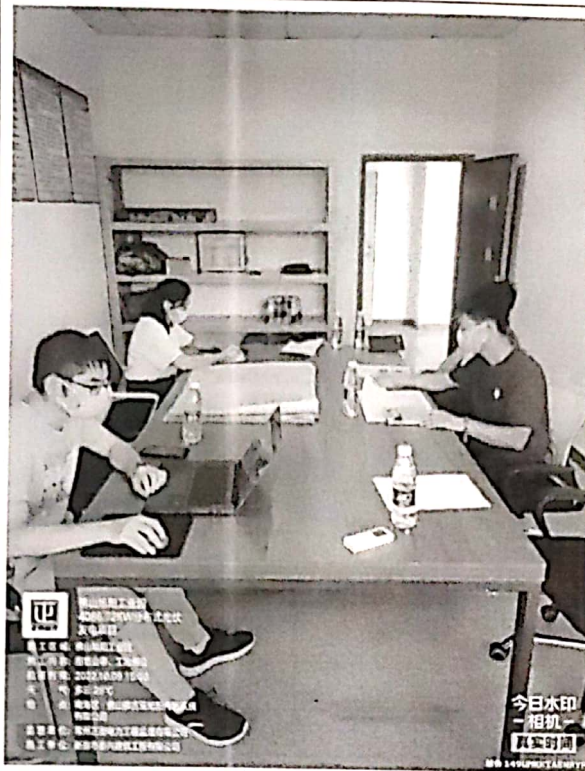

工地例会

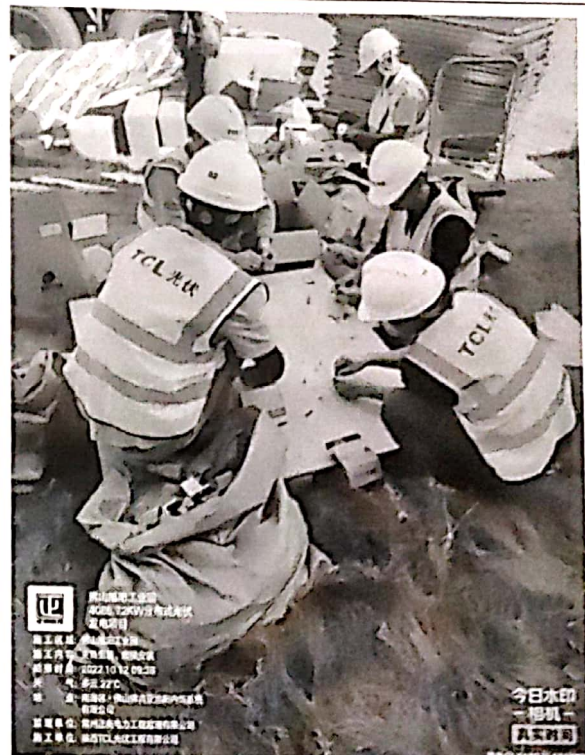

夹具组装

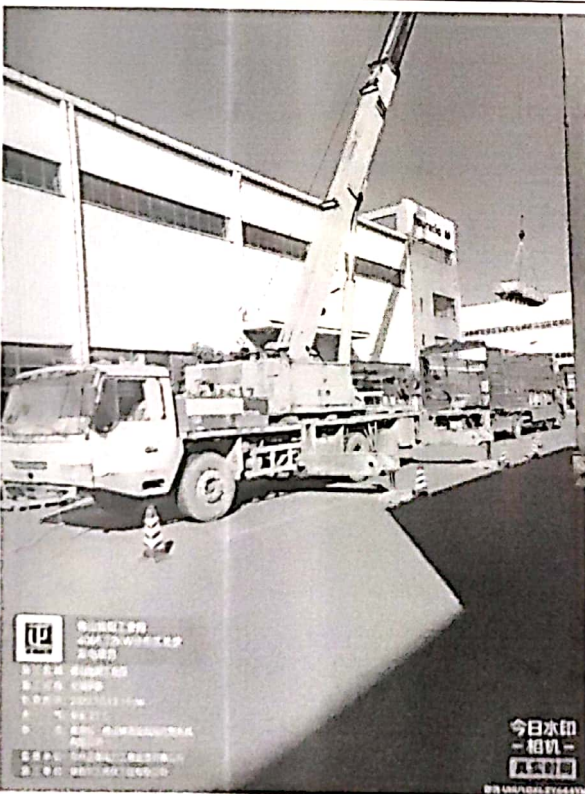

支架吊装



护栏安装

