

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式 光伏发电项目

监 理 周 报


第 十 期

(2022 年 12 月 17 日-2022 年 12 月 23 日)




工程名称	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目	建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、联合厂房 1、2 清洗系统安装 40% 2、联合厂房 1、2 接地网增项完成 80% 3、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 80%		
下周计划	4、联合厂房 1、2 接地线网安装 100% 5、联合厂房 1、2 消防安装 100% 6、联合厂房 1、2 监控安装完成 100% 7、联合厂房 1、2 清洗系统安装 100% 8、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 100% 9、竣工验收初验、二验。		
安全文明施工情况	1、临边物料整顿，已要求施工单位及时整改。 2、现场固废清运不及时，已要求施工单位及时整改。		
施工质量	1、组件接地跨接未做两点接地，已要求施工单位及时整改。 2、厂家原有接地网损坏部分未做恢复，已要求施工单位及时整改。		
设备材料进场情况	1、光伏组件到场 7470 片 2、护栏材料全部到场、厂房光伏支架全部到场 3、桥架、电缆全部到场 4、逆变器到场 33 台、汇流箱到场 4 台、并网柜到场 2 台 5、接地扁铁到场 425 米 6、集电母排 2 组全部到场 7、运维通道全部到场		
人员机械情况	总包管理 3 人，监理 1 人，工人 6 人。 吊车 0 台、叉车 0 台		



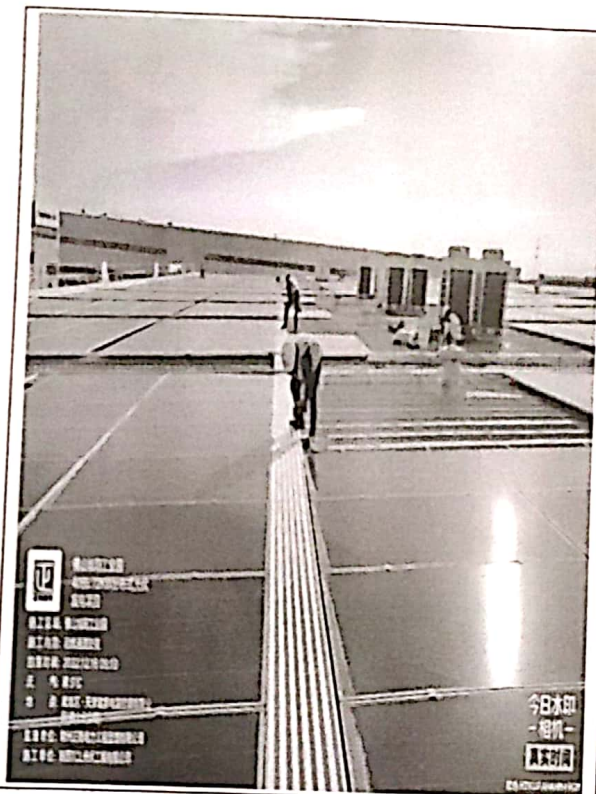

运维通道安装

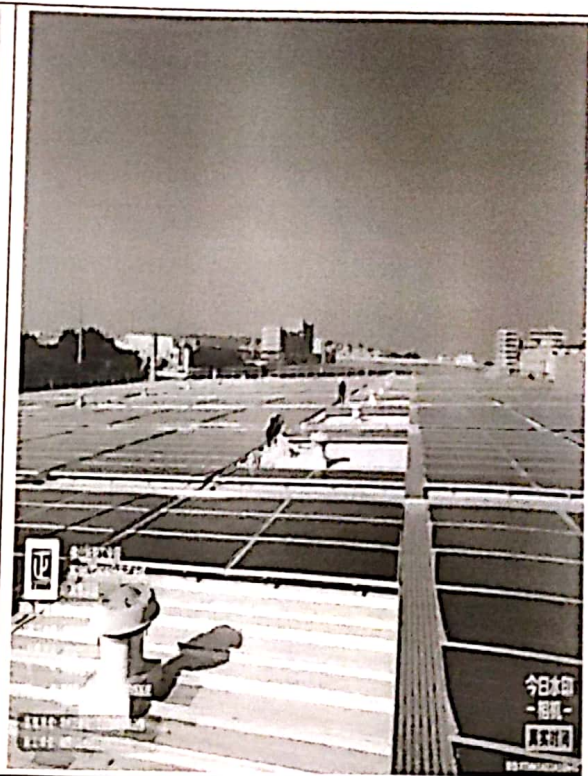

清洗系统安装

