

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式 光伏发电项目

监 理 周 报


第 十 一 期

(2022 年 12 月 24 日-2023 年 12 月 31 日)



工程名称	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目	建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、联合厂房 1、2 清洗系统安装 100% 2、联合厂房 1、2 接地网增项完成 100% 3、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 100%		
下周计划	1、竣工验收。 2、资料装订。		
安全文明施工情况	1、屋面全部场清，已要求施工单位及时整改。 2、材料区全部场清，已要求施工单位及时整改。 3、配电室全部场清，已要求施工单位及时整改。		
施工质量	1、现场初验完成，正在整改消缺中。		
设备材料进场情况	1、光伏组件全部到场 2、护栏材料全部到场、厂房光伏支架全部到场 3、桥架、电缆全部到场 4、逆变器到场 29 台、汇流箱到场 4 台、并网柜到场 2 台 5、接地扁铁到场 425 米 6、集电母排 2 组全部到场 7、运维通道全部到场 8、清洗材料全部到场 9、灭火器全部到场 10、监控全部到场		
人员机械情况	总包管理 3 人，监理 1 人，工人 6 人。 吊车 0 台、叉车 0 台		



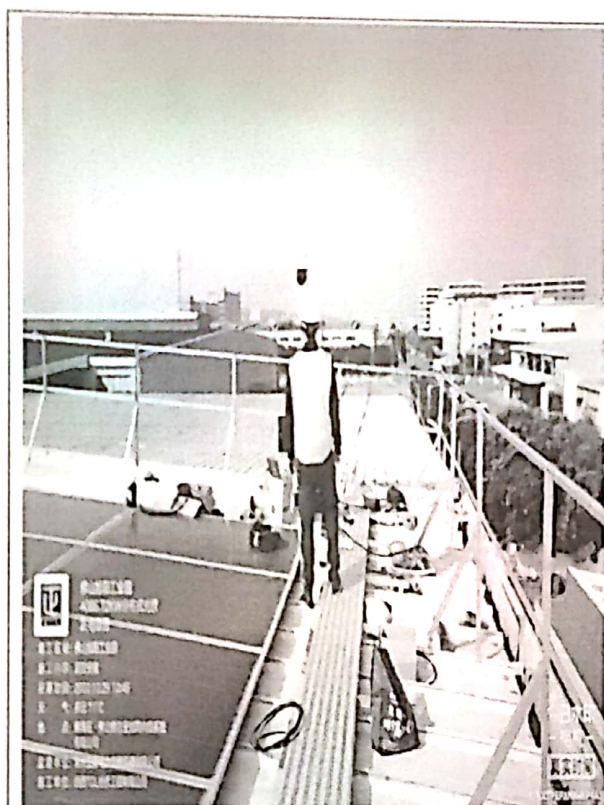

监控系统安装



清洗系统安装



整改消缺



初验收

