

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式 光伏发电项目

监 理 周 报

第 六 期

(2022 年 11 月 19 日-2022 年 11 月 25 日)




工程名称	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目	建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、联合厂房 1、2 组件吊装，分散完成 100% 2、联合厂房 1、2 组件安装、组串完成 20%		
下周计划	3、联合厂房 1、2 组件安装、组串完成 60% 4、联合厂房 1、2 组串裸露直流线保护管安装完成 60% 5、联合厂房 1、2 桥架敷设至逆变器完成 20% 6、联合厂房 1、2 交直流线敷设完成 100%		
安全文明施工情况	1、2022、11、14 下发监理联系单 6，整改完成。 3、2022、11、20 安全质量生产月消防演练完成。		
施工质量	1、2022、11、21 下发监理联系单 8，整改完成。 2、2022、11、16 下发监理通知单 6，整改完成。		
设备材料进场情况	1、光伏组件到场 7470 片。 2、护栏材料全部到场、厂房光伏支架全部到场 3、桥架、电缆全部到场。 4、逆变器到场 33 台、汇流箱到场 4 台、并网柜到场 2 台 5、接地扁铁到场 425 米 6、集电母排 2 组全部到场。		
人员机械情况	总包管理 2 人，监理 1 人，工人 19 人。 吊车 1 台、叉车 1 台		







桥架安装

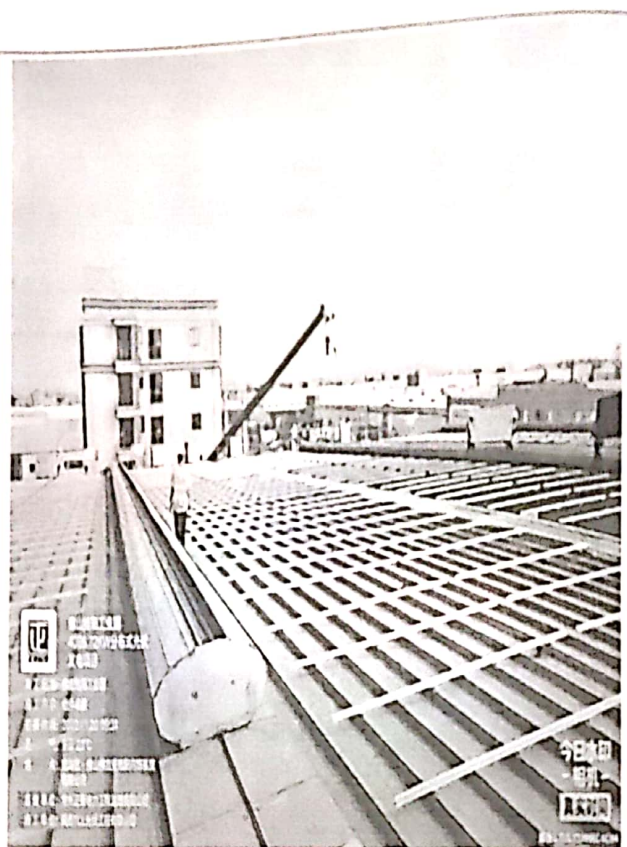

组件吊装

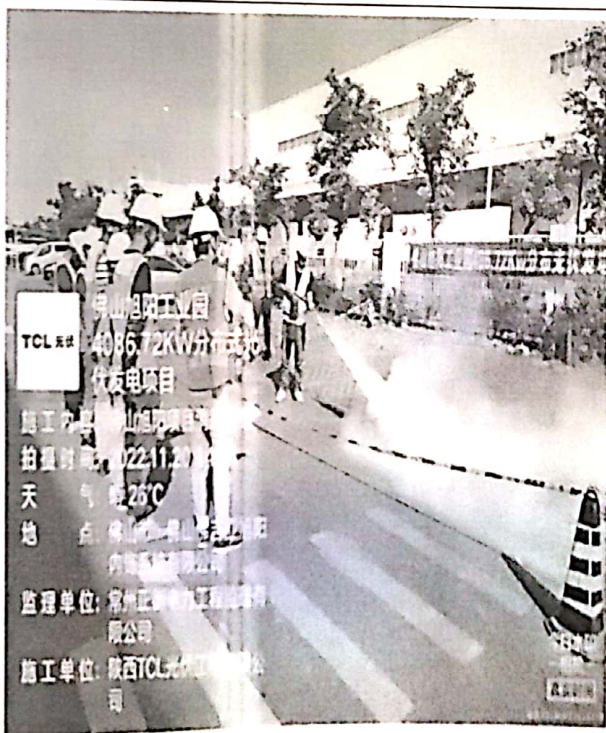

消防演练

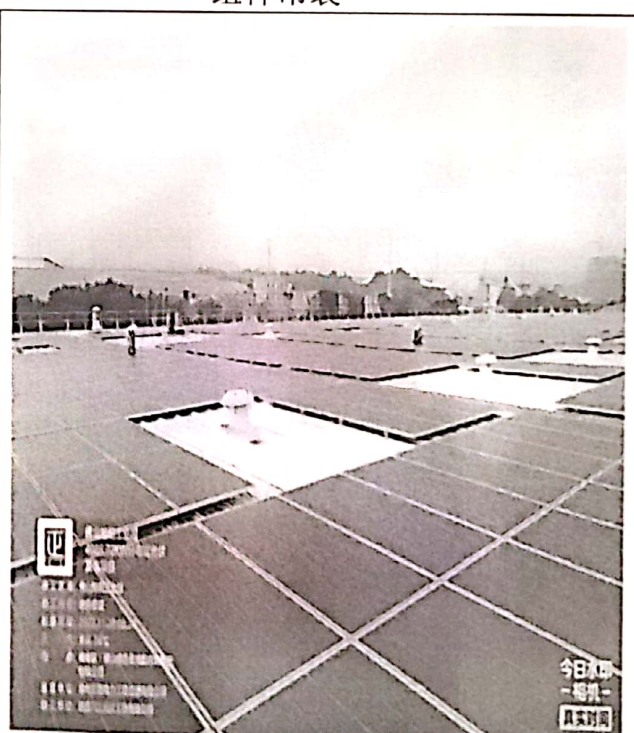

组件安装

