

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式 光伏发电项目

监 理 周 报

第 七 期

(2022 年 11 月 26 日-2022 年 12 月 2 日)



工程名称	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目	建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、联合厂房 1、2 组件安装、组串完成 50% 2、联合厂房 1 直流桥架安装完成 40% 3、联合厂房 1 交流桥架安装完成 40% 4、联合厂房 1、2 组件、桥架接地线安装完成 50%		
下周计划	1、联合厂房 1、2 组件安装、组串完成 100% 2、联合厂房 1、2 组件接地线安装完成 60% 3、联合厂房 1、2 直、交流电缆敷设完成 80% 4、联合厂房 1、2 交直流桥架安装完成 100% 5、联合厂房 1、2 停电拼柜完成 100% 6、联合厂房 1、2 运维通道安装 10%		
安全文明施工情况	1、2022、11、30 下发安全问题监理联系单 10 2、2022、11、29 下发监理安全例会纪要 3		
施工质量	1、2022、11、28 下发质量问题监理联系单 9 2、2022、11、28 下发管理人员驻场问题监理通知单 6 3、2022、11、28 下发进度问题监理罚款单 4		
设备材料进场情况	1、光伏组件到场 7470 片 2、护栏材料全部到场、厂房光伏支架全部到场 3、桥架、电缆全部到场 4、逆变器到场 33 台、汇流箱到场 4 台、并网柜到场 2 台 5、接地扁铁到场 425 米 6、集电母排 2 组全部到场 7、运维通道全部到场		
人员机械情况	总包管理 2 人，监理 1 人，工人 16 人。 吊车 0 台、叉车 0 台		







桥架安装



组件安装

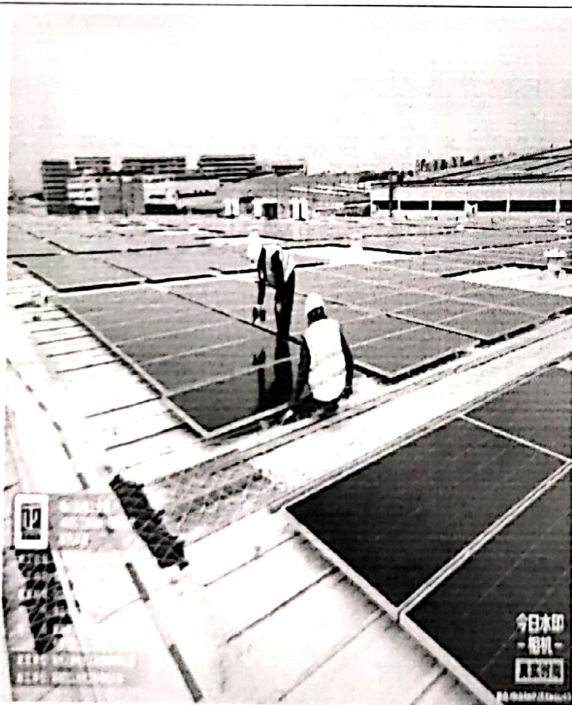

组件安装

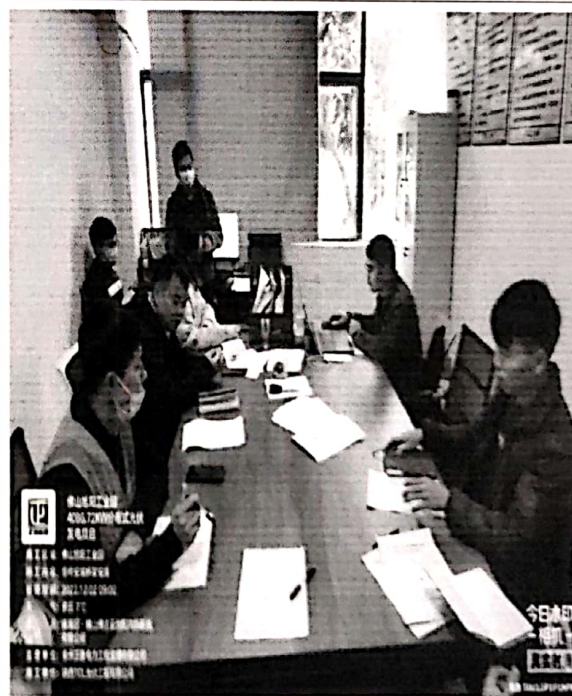

监理例会

