

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2022 年 10 月第 01 期

建设单位：株洲正善科技有限公司		填报周期：2022. 10. 8至 2022. 10. 14																																									
一、项目总体建设进度汇总： 1. 条基完成3450米； 2. 逆变器安装完成11台； 3. 接地极15根全部完成； 4. 桥架完成120米。 2、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>600W</td> <td>5100块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>160组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>11台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MC4接头</td> <td></td> <td>640套</td> <td></td> </tr> <tr> <td>桥架</td> <td></td> <td>1013米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流电缆</td> <td></td> <td>29000米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交流电缆</td> <td></td> <td>2132米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>接地扁铁</td> <td></td> <td>2520米</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	600W	5100块		支架		160组		逆变器		11台		MC4接头		640套		桥架		1013米		直流电缆		29000米		交流电缆		2132米		接地扁铁		2520米					
名 称	规格型号	数 量	备 注																																								
组件	600W	5100块																																									
支架		160组																																									
逆变器		11台																																									
MC4接头		640套																																									
桥架		1013米																																									
直流电缆		29000米																																									
交流电缆		2132米																																									
接地扁铁		2520米																																									
二、本周工程建设工作内容及完成情况 1. 条基支模浇筑混凝土完成700米。 2. 条基吊装到屋顶完成750米。 3. 光伏支架已全部吊装至屋面。																																											
三、 下周计划主要工作内容 1. 条基支模浇筑混凝土完成900米； 2. 条基吊装到屋面完成800米； 3. 电缆预埋管恢复沥青； 4. 箱变基础完成； 5. 逆变器雨棚安装完成； 6. 条基摆放调整，连接处装模混凝土预制； 7. 光伏支架摆放调整及安装。																																											

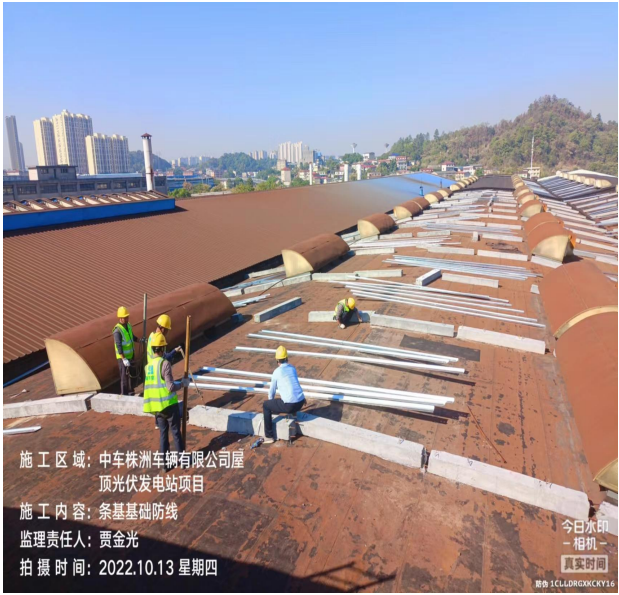
填报人：_____

审核人：_____

时间 2022 年 10 月 14 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	箱变圈梁装模 2022年10月8日 星期六	条基吊装 2022年10月8日 星期六
照片		
文字描述	吊装条基 2022年10月12日 星期三	屋面条基散料 2022年10月12日 星期三
照片		

文字描述	屋面条基调整 2022年10月13日 星期四	支架散料 2022年10月13日 星期四
照片	 施工区域: 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容: 条基基础防线 监理责任人: 贾金光 拍摄时间: 2022.10.13 星期四 今日水印相机 真实时间	 施工区域: 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容: 支架散料 监理责任人: 贾金光 拍摄时间: 2022.10.13 星期四 今日水印相机 真实时间
文字描述	监理安全旁站吊装条基 2022年10月14日 星期五	第一次监理例会 2022年10月14日 星期五
照片		
