

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2022 年 10 月第 03 期

建设单位：株洲正善科技有限公司		填报周期：2022. 10. 22至 2022. 10. 28	
一、项目总体建设进度汇总：			
1. 组件安装完成192块，共计5100，完成3.76%；			
2. 条基预制完成4450米，共计5000米，完成89%；			
3. 支架安装60组，共计160组，完成37.5%；			
4. 逆变器安装完成11台，共计11台，完成100%。			
5. 桥架安装1013米，共计312米，完成30.18%。			
6. 光伏电缆敷设1500米，共计29000米，完成5.17%。			
7. 接地扁铁焊接150米，共计2520米，完成5.95%。			
8. 接地极15根，完成100%。			
2、主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	5100块	
支架		160组	
逆变器		11台	
MC4接头		640套	
桥架		1013米	
直流电缆		29000米	
交流电缆		2132米	
接地扁铁		2520米	
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1. 组件安装192块。			
2. 支架安装60组。			
3. 桥架安装200米。			
4. 光伏电缆敷设1500米。			
5. 接地扁铁焊接150米。			
6. 本周四，10月27日，由于天气原因下雨，屋面湿滑，出于安全考虑，当日现场无人施工。			

三、 下周计划主要工作

内容

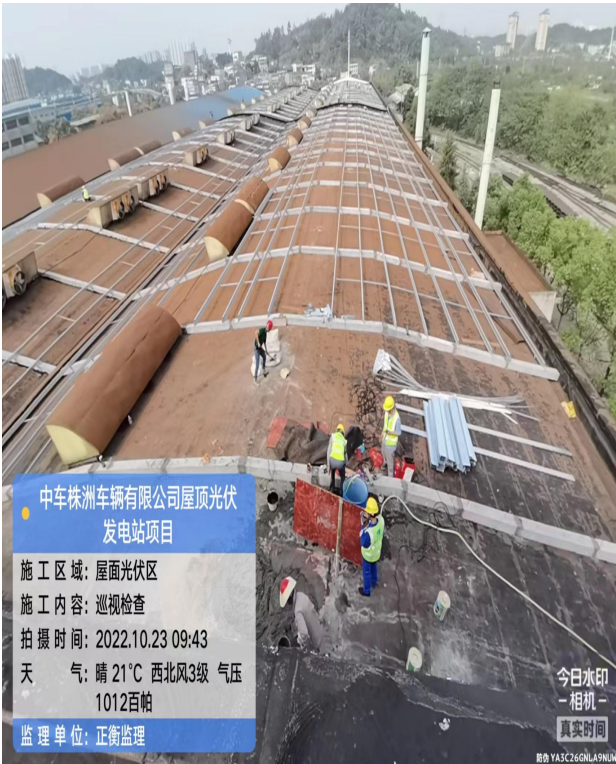
1. 组件安装900块。
2. 支架安装60组。
3. 桥架安装200米。
4. 光伏电缆敷设1500米。
5. 接地扁铁焊接300米。

填报人： _____

审核人： _____

时间 2022 年 10 月 28 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	支架安装 2022年10月22日 星期六	条基调整 2022年10月22日 星期六
照片	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：条基调整 拍摄时间：2022.10.22 星期六 今日水印相机-真实时间	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：条基调整 拍摄时间：2022.10.22 星期六 今日水印相机-真实时间
文字描述	条基接头浇筑 2022年10月23日 星期天	条基沥青封边固定 2022年10月24日 星期一
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：巡视检查 拍摄时间：2022.10.23 09:43 天气：晴 21℃ 西北风3级 气压1012百帕 监理单位：正衡监理 今日水印相机-真实时间	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：条基沥青固定 拍摄时间：2022.10.24 星期一 今日水印相机-真实时间

文字描述	电缆沟开挖 2022年10月25日 星期二	吊装标贴 2022年10月26日 星期三
照片	 施工区域: 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容: 电缆沟开挖 拍摄时间: 2022.10.25 星期二 今日水印相机 真实时间	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域: 屋面光伏区 施工内容: 接地扁铁吊装 拍摄时间: 2022.10.26 09:28 天气: 多云 19°C 北风2级 气压 1009百帕 监理单位: 正衡监理 今日水印相机 真实时间
文字描述	屋面支架安装 2022年10月26日 星期三	第三次监理例会 2022年10月28日 星期五
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域: 屋面光伏区 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022.10.26 09:37 天气: 多云 19°C 北风2级 气压 1009百帕 监理单位: 正衡监理 今日水印相机 真实时间	
