

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2022 年 12 月第 01期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2022. 12. 02至 2022. 12. 08	
一、项目总体建设进度汇总：			
1. 组件安装完成1200块，共计5100，完成23. 53%；			
2. 条基预制完成4750米，共计5000米，完成95%；			
3. 支架安装70组，共计160组，完成43. 75%；			
4. 逆变器共计11台，现已发回厂家进行调换；			
5. 桥架安装共计1013米，安装473米，完成46. 69%。			
6. 光伏电缆敷设7500米，共计29000米，完成25. 86%。			
7. 接地扁铁焊接100米，共计2520米，完成3. 97%。			
8. 接地极15根，完成100%。			
9. 高压电缆敷设完成1700米，共计2123米，完成79. 74%。			
10. MC4接头插件安装完成20套，共计640套，完成3. 13%。			
11. 接地线连接完成200米，共计1431米，完成13. 98%。			
2、主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	5100块	已全部进场
支架		160组	已全部进场
逆变器		11台	发回厂家进行调换
MC4接头		640套	已全部进场
桥架		1013米	已全部进场
直流电缆		29000米	已全部进场
交流电缆		2132米	已全部进场
接地扁铁		2520米	已全部进场
接地线		1431米	已全部进场
箱变		1台	已进场

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1. 箱变进场，吊装就位；
2. 组件安装完成250块；
3. 预制条基完成300米；
4. 桥架安装完成151米。

三、 下周计划主要工作

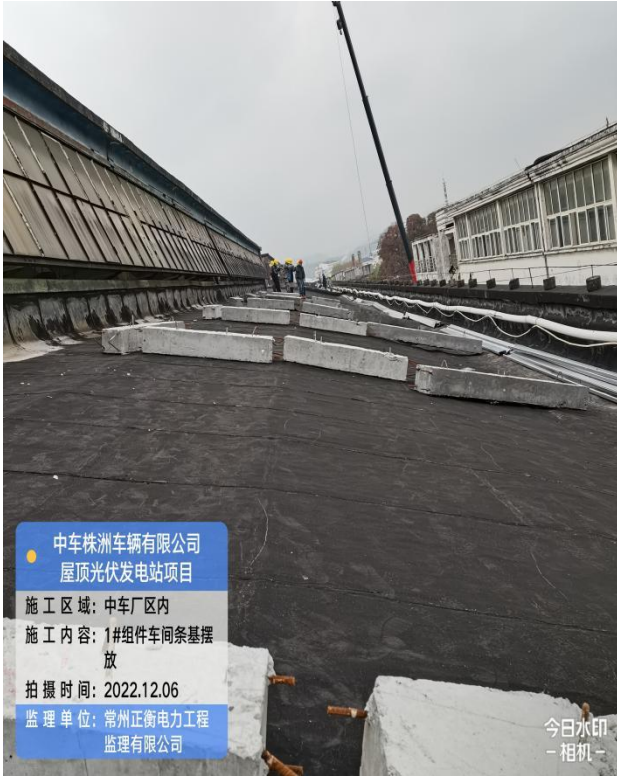
1. 组件安装完成1500块；
2. 预制条基完成250米；
3. 支架安装完成60组；
4. MC4插件完成300套；
5. 光伏电缆敷设7500米；
6. 电力电缆敷设432米；
7. 接地线完成500米；
8. 镀锌扁钢完成1000米；
9. 配电室改造。

填报人： _____

审核人： _____

时间 2022 年 12 月 08 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	安装条基模板 2022年12月05日 星期一	现场条基浇筑 2022年12月05日 星期一
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：安装条基预制模板 拍摄时间：2022.12.05 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：条基浇筑 拍摄时间：2022.12.05 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司
文字描述	1#组装车间吊装条基 2022年12月06日 星期二	1#组装车间屋面条基分散 2022年12月06日 星期二
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：吊装条基 拍摄时间：2022.12.06 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：1#组件车间条基摆放 拍摄时间：2022.12.06 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司

文字描述	箱变进场 2022年12月07日 星期三	箱变就位 2022年12月07日 星期三
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域: 中车厂区内 施工内容: 箱变进场 拍摄时间: 2022.12.07 监理单位: 常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 - 相机 - 真实时间	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域: 中车厂区内 施工内容: 箱变就位 拍摄时间: 2022.12.07 监理单位: 常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 - 相机 - 真实时间
文字描述	条基接头浇筑 2022年12月08日 星期四	檩条打孔 2022年12月08日 星期四
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域: 中车厂区内 施工内容: 条基接头浇筑 拍摄时间: 2022.12.08 监理单位: 常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 - 相机 - 真实时间	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域: 中车厂区内 施工内容: 檩条打孔 拍摄时间: 2022.12.08 监理单位: 常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 - 相机 - 真实时间
