

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2023 年 01月第 02期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2023. 01. 06至 2023. 01. 10	
一、项目总体建设进度汇总：			
项目总体建设进度汇总：			
1、B10-B14屋顶光伏组件安装完成4592块。			
2、B10-B14组串MC4插头完成600套。			
3、B10-B14屋顶电缆桥架安装1000米。			
4、B10-B14屋顶光伏支架安装50%。			
5、B10-B14屋顶光伏电缆敷设完成4000米。			
6、电力电缆敷设完成。			
7、B10-B14屋顶光接地扁铁安装完成1800米。			
8、B10-B14屋顶光伏组件接地线安装完成4000米。			
9、B10-B14屋顶逆变器安装3台。			
2、主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	14200块	已全部进场
支架		2. 5MW	已进场32%
逆变器		60台	已全部进场
MC4接头		4MW	已进场51%
桥架		1. 5MW	已进场19%
直流电缆		1. 5MW	已进场19%
交流电缆		1. 5MW	已进场19%
接地扁铁		2. 5MW	已进场32%
接地线		5MW	已进场64%
并网柜		2台	已进场

二、本周工程建设工作内容及完成情况

- 1、B10-B14屋顶光伏板安装完成4592块。
- 2、B10-B14组串MC4插头完成200套。
- 3、B10-B14屋顶光伏支架安装60%。
- 4、B10-B14屋顶光伏电缆安装完成1000米。
- 5、B10-B14屋顶光接地扁铁安装完成300米。

三、 下周计划主要工作

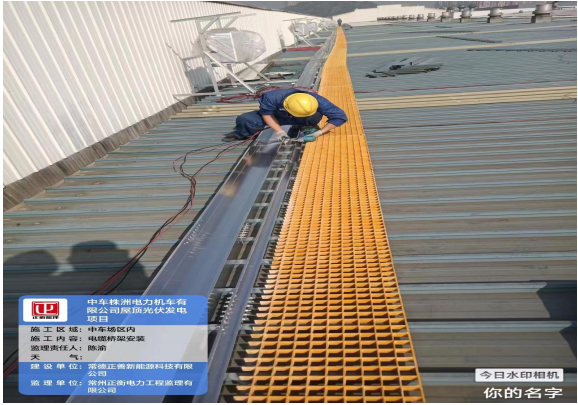
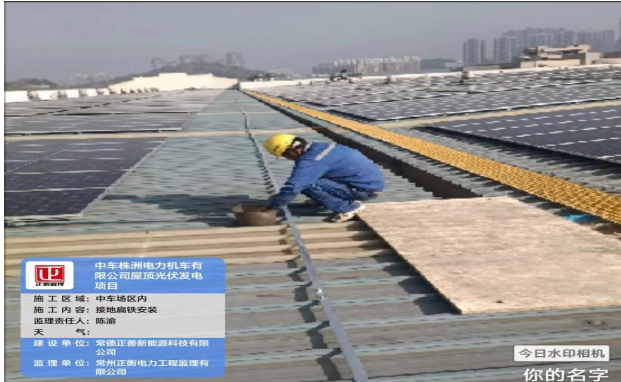
放假

填报人：陈渝

审核人：_____

时间 2023 年 01月 10 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	桥架敷设	组件安装
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：电缆桥架安装 监理责任人：陈渝天 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：光伏组件安装 监理责任人：陈渝天 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司 今日水印相机 你的名字
文字描述	桥架敷设	接地扁铁敷设
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：电缆桥架安装 监理责任人：陈渝天 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：接地扁铁安装 监理责任人：陈渝天 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司 今日水印相机 你的名字
