

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2023 年 03月第 01期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2023. 02. 24至 2023. 03. 03	
一、项目总体建设进度汇总：			
项目总体建设进度汇总：			
1、B10-B14屋顶以安装完成。			
2、B10-15完成直流电缆敷设12100米。			
3、B10-15MC4插头完成90对。			
4、B15屋面光伏支架安装420米。			
5、B07完成桥架封堵完成。			
6、B07完成梯式桥架制作安装12米；			
主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	14200块	已全部进场
支架		2. 5MW	已进场32%
逆变器		60台	已全部进场
MC4接头		4MW	已进场51%
桥架		1. 5MW	已进场19%
直流电缆		1. 5MW	已进场19%
交流电缆		1. 5MW	已进场19%
接地扁铁		2. 5MW	已进场32%
接地线		5MW	已进场64%
并网柜		2台	已进场

二、本周工程建设工作内容及完成情况

- 1、B10-15完成交流电缆敷设2100米；
- 2、并网柜安装到位；
- 3、B07完成并网柜临时雨棚，并网柜到配电室的电缆敷设及电缆头制作安装；

三、 下周计划主要工作

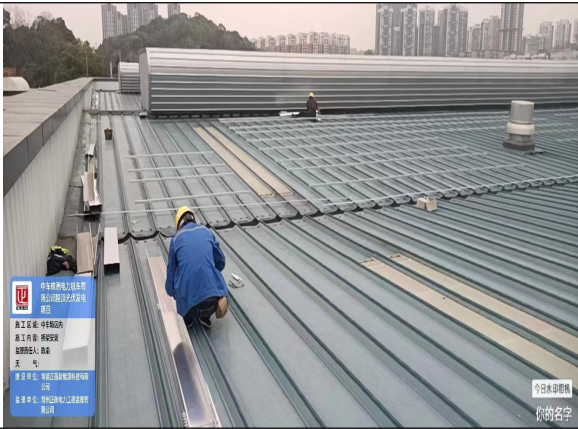
- 1、B10--15：联合厂房变并网柜到配电室进线柜的电缆敷设，并网柜端3*185+2*95电缆的电缆头制作及安装，逆变器到并网柜的电缆头制作安装，B14—15剩余的光伏板吊装及安装，光伏电缆组串。
- 2、C11-24：光伏支架安装，桥架安装，运维通道安装等。

填报人：陈渝

审核人：_____

时间 2023 年 03月 03 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	并网柜电缆连接		电缆沟施工	
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：配电箱电缆连接 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司		 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：配电箱电缆沟施工 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司	
文字描述	支架安装		电缆头制作	
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：光伏支架安装 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司		 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：电缆头制作 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司	
文字描述	桥架敷设		电缆敷设	
	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：桥架敷设 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司		 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：电缆敷设 监理单位：陈渝 建设单位：常德正源新能源科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程监理有限公司	
