

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2023 年 03月第 02期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2023. 03. 03至 2023. 03. 10	
一、项目总体建设进度汇总：			
项目总体建设进度汇总：			
1、B10-B14屋顶以安装完成。			
2、B07屋顶以安装完成。			
3、c11—24支架安装完成；			
4、c11—24组件吊装1560块；			
5、c11—24运维通道吊装780米；			
6、c11—24逆变器吊装6台；			
7、c11—24接地扁铁吊装1500米。			
主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	14200块	已全部进场
支架		2. 5MW	已进场32%
逆变器		60台	已全部进场
MC4接头		4MW	已进场51%
桥架		1. 5MW	已进场19%
直流电缆		1. 5MW	已进场19%
交流电缆		1. 5MW	已进场19%
接地扁铁		2. 5MW	已进场32%
接地线		5MW	已进场64%
并网柜		2台	已进场

二、本周工程建设工作内容及完成情况

- 1、B10-15联合变配电室3*120+1*70电缆头制作安装；
- 2、4*185+1*95电缆敷设40米，电缆头制作安装；
- 3、c11—24支架安装完成；
- 4、c11—24组件吊装1560块；
- 5、c11—24运维通道吊装780米；
- 6、c11—24逆变器吊装6台；
- 7、c11—24接地扁铁吊装1500米。

三、 下周计划主要工作

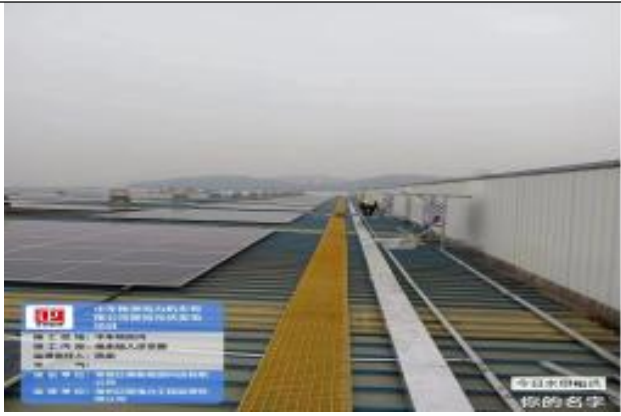
- 1、B10--15：联合厂房变并网柜到配电室进线柜的电缆敷设，并网柜端3*185+2*95电缆的电缆头制作及安装，逆变器到并网柜的电缆头制作安装，B14—15剩余的光伏板吊装及安装，光伏电缆组串。
- 2、C11-24：光伏支架安装，桥架安装，运维通道安装等。

填报人：陈渝

审核人：_____

时间 2023 年 03月 10 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	桥架安装	接地电阻检测
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：桥架安装 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：接地电阻检测 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字
文字描述	支架安装	接入逆变器
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：光伏支架安装 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：逆变器接入 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字
文字描述	组件吊装	桥架敷设
	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：组件吊装 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域：中车场区内 施工内容：桥架敷设 监理单位：陈海 建设单位：株洲正南电力工程有限公司 监理单位：株洲正南电力工程有限公司 今日水印相机 你的名字
