

光伏项目工程建设周报

2023 年 08 月第 5 期

项目：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司 2.29MW 分布式光伏发电项目	填报周期：2023 年 08 月 14 日--08 月 20 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。 2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%； 3、支架安装完成（2.29）MWp，完成总量（100）%； 4、组件安装完成（1.09）MWp，完成总量（47.59）% 5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（20）组，箱变及逆变器安装完成总量（57）%。 6、场内集电线路共计（0）公里，电缆沟开挖（/）公里，完成总量（0）%；电缆敷设完成（5.1）公里，完成总量（85）%。 7、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG 小室等主体工程土建进度简要明晰描述； 8、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/） 9、送出线路共计（/）公里，建设塔基总计（/）基，基础浇筑完成（/）基，完成总量（/）%，杆塔组立完成（/）%，架线完成总量（/）%； 10、升压站原计划反送电时间：（2023 年/月/日），按建设进度计划时间（2023 年/月/日） 11、已并网发电（/）MW，完成总量（/）%。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	

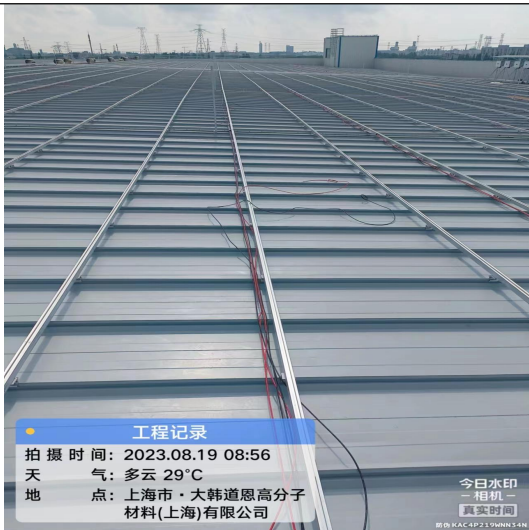
1、道路工程	本项目不涉及																																		
2、开关站/升压站	本项目不涉及																																		
3、综合楼/附属建筑	本项目不涉及																																		
4、场内桩基施工	本项目不涉及																																		
5、支架及组件安装	<table><tr><td>分项工程</td><td>总量</td><td>累计完成</td><td>单位</td><td>已完成比例</td></tr><tr><td>1#车间支架</td><td>7000</td><td>7000</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>2#车间支架</td><td>7000</td><td>7000</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>1#车间组件安装</td><td>2013</td><td>1920</td><td>张</td><td>95.3%</td></tr><tr><td>2#车间组件安装</td><td>2007</td><td>0</td><td>张</td><td>0%</td></tr></table>					分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例	1#车间支架	7000	7000	米	100%	2#车间支架	7000	7000	米	100%	1#车间组件安装	2013	1920	张	95.3%	2#车间组件安装	2007	0	张	0%					
分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例																															
1#车间支架	7000	7000	米	100%																															
2#车间支架	7000	7000	米	100%																															
1#车间组件安装	2013	1920	张	95.3%																															
2#车间组件安装	2007	0	张	0%																															
6、逆变器及箱变	<table><tr><td>分项工程</td><td>总量</td><td>累计完成</td><td>单位</td><td>已完成比例</td></tr><tr><td>1#车间逆变器安装</td><td>18</td><td>18</td><td>台</td><td>100%</td></tr><tr><td>2#车间逆变器安装</td><td>18</td><td>2</td><td>台</td><td>11%</td></tr></table>					分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例	1#车间逆变器安装	18	18	台	100%	2#车间逆变器安装	18	2	台	11%															
分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例																															
1#车间逆变器安装	18	18	台	100%																															
2#车间逆变器安装	18	2	台	11%																															
7、送出工程（含对侧）	未涉及																																		
8、现场调试	未施工																																		
9、设备到货情况	设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设备。 <table><tr><td>设备名称</td><td>总量</td><td>已到货量</td><td>单位</td><td>到货比例</td></tr><tr><td>铝合金支架</td><td>14000</td><td>14000</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏逆变器 50KW</td><td>36</td><td>36</td><td>台</td><td>100%</td></tr><tr><td>接地扁铁</td><td>1800</td><td>1800</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏专用电缆</td><td>60000</td><td>60000</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>3*35+1*16 电缆</td><td>2480</td><td>0</td><td>米</td><td>0%</td></tr></table>					设备名称	总量	已到货量	单位	到货比例	铝合金支架	14000	14000	米	100%	光伏逆变器 50KW	36	36	台	100%	接地扁铁	1800	1800	米	100%	光伏专用电缆	60000	60000	米	100%	3*35+1*16 电缆	2480	0	米	0%
设备名称	总量	已到货量	单位	到货比例																															
铝合金支架	14000	14000	米	100%																															
光伏逆变器 50KW	36	36	台	100%																															
接地扁铁	1800	1800	米	100%																															
光伏专用电缆	60000	60000	米	100%																															
3*35+1*16 电缆	2480	0	米	0%																															

	1*185 电缆	1750	0	米	0%
	570Wp 光伏组件	4020	4020	片	100%
	GDD800A 并网柜	6	0	台	0%
	1*300 电缆	350	0	米	0%
	1*150 电缆	347	0	米	0%
	CT100*100 桥架	800	800	米	100%
	CT200*100 桥架	150	150	米	100%
	CT300*200 桥架	150	150	米	100%
10、人员/机械情况	1. 现场管理人员：3 人 2. 进度：符合进度计划要求 3. 施工人员:11 人 4. 施工机械:25T 吊车一辆				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：					
项目主节点	计划日期	实际完成日期		延误原因及赶工措施（简述）	
1、首个基础施工	不涉及				
2、首套组件安装	2023. 08. 10	2023. 08. 05			
3、线路倒送电	不涉及				
4、首个发电单元并网	2023. 08. 30				
5、全容量并网	2023. 09. 30				
四、主要协调问题及解决情况					

提出需要协调的问题	无
未解决的协调问题 解决进展	无
五、下周计划主要工作内容： 1. 2#车间组件安装	

填报人：高治斌 审核人：奕卓 时间：2023年8月20日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。

	
组件安装	组件安装
	
组件吊装	工程记录 拍摄时间: 2023.08.19 08:56 天气: 多云 29°C 地点: 上海市·大韩道恩高分子材料(上海)有限公司 今日水印相机 真实时间 颜色 KAC 4P21 1000015 4M
	电缆敷设
