

光伏项目工程建设周报

2023 年 第 10 期

项目: 昆山屋顶分布式光伏一期 2.0313 万千瓦发电项目周报		填报周期: 2023 年 4 月 8 日--4 月 15 日	
一、樱花子项目总体建设进度汇总:			
1、基础支墩共计 (0) 个/根, 完成 (0) 个, 完成总量 (0) %;			
2、支架安装: 完成 (1.640) MWp, 完成总量 (100) %;			
3、组件安装: 完成 (1.640) MWp, 完成总量 (100) %;			
4、计划反送电时间 (2022 年 12 月 30 日), 实际完成时间 (2022 年 12 月 30 日);			
5、并网情况: 已并网发电 (1.6401) MW, 完成总量 (100) %;			
6、清洗系统安装: 已通水, 完成总量 (100) %。			
二、旭发子项目总体建设进度汇总:			
1、基础支墩共计 (1729) 个/根, 完成 (1729) 个, 完成总量 (100) %;			
2、支架安装: 完成 (1.612) MWp, 完成总量 (100) %;			
3、组件安装: 完成 (1.612) MWp, 完成总量 (100) %;			
4、计划反送电时间 (2023 年 1 月 2 日), 实际完成时间 (2023 年 1 月 2 日)			
5、并网情况: 已并网发电 (1.6126) MW, 完成总量 (100) %。			
6、清洗系统安装: 已安装完成总量 (81) %。			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、道路工程	无		
2、开关站/升压站	无		
3、综合楼/附属建筑	无		
4、场内桩基施工	无		
5、支架及组件安装	樱花项目: 组件已全部完成 100%;		

	<p>旭发项目：组件已全部完成 100%。</p>
6、逆变器及箱变	<p>樱花项目：逆变器共 27 台，已全部安装完成，完成率 100%；并网柜共计 3 台，已全部安装完成，完成率 100%。全部设备已并网。</p> <p>旭发项目：逆变器共计 30 台。已全部完成安装及并网，完成率 100%；并网柜型号共计 3 台，已全部安装完成，完成率 100%。全部设备已并网</p>
7、送出工程（含对侧）	<p>樱花项目：并网柜至变压器低压侧采用 ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120 单芯电缆双拼联接，已完成并网发电，3 月 26 日完成全容量并网，交流电缆头制作完成 100%，直流电缆 MC4 插头制作完成 100%，防火封堵完成。</p> <p>旭发项目：并网柜至变压器低压侧采用 ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120 单芯双拼电缆联接，已完成安装就位，2023 年 1 月 2 日设备倒送电完成。2023 年 3 月 21 日完成供电公司验收挂表。并网手续已办结。3 月 27 日完成全容量并网。交流电缆制作完成 100%，直流电缆 MC4 插头制作完成 100%，防火封堵完成。</p>
8、现场调试	<p>樱花项目：逆变器单体调试共已完成 27 台，完成率 100%，电缆试验共已完成 27 根，完成率 100%。并网柜调试已完成。</p> <p>旭发项目：逆变器调试共已完成 30 台，完成率 100%；电缆试验已完成 30 根，完成率 100%；并网柜调试已完成。</p>
9、设备到货情况	<p>樱花项目：组件 2982 已到货（100%）、逆变器 27 台已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。监控系统设备已确定，询价中。</p> <p>旭发项目：组件 2932 块已到货（100%）、逆变器 30</p>

	台已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。监控系统、气象站设备已确定，询价中。		
10、人员/机械情况	监理人员 2 名，施工管理人员 2 名 樱花项目：施工总人数 4 人。清洗组件 2 人，屋面修复 2 人。 旭发项目：施工总人数 2 人。清洗系统安装 2 人。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022.11.27	2022.11.27	
2、首套组件安装	2022.12.16	2022.12.16	
3、线路倒送电	2023.01.17	2023.01.17	
4、首个发电单元并网	2022.12.31	2022.12.31	
5、全容量并网	2023.06.30	樱花全容量： 2023.3.26	
		旭发全容量 2023.3.27	
6、清洗系统	2023.4.1	2023.4.2	
	2023.3.30	2023.4.7	
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	剩余容量下阶段的开工批复		

题	(填写本周需要协调的问题)。
未解决的协调问题 解决进展	<p>剩余容量下阶段的开工批复</p> <p>(填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况)</p>
五、下周计划主要工作内容	
<p>樱花项目：初验整改消缺。</p> <p>旭发项目：监初验整改消缺。</p>	

填报人：_____ 审核人：_____ 时间： 2023年4月14日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。

樱花子项目

航拍图



每日站班会



每周项目例会



零星整改




清洗通水




天沟清理

灭火器安装

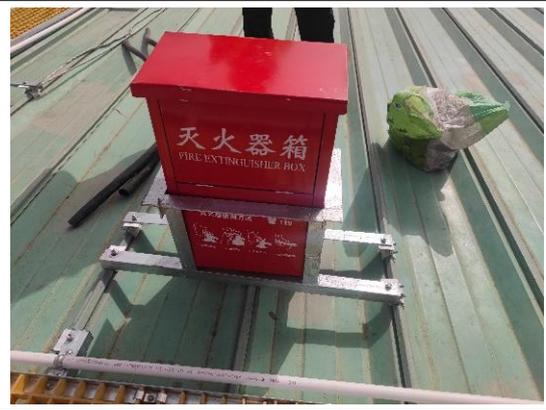


旭发子项目

航拍图

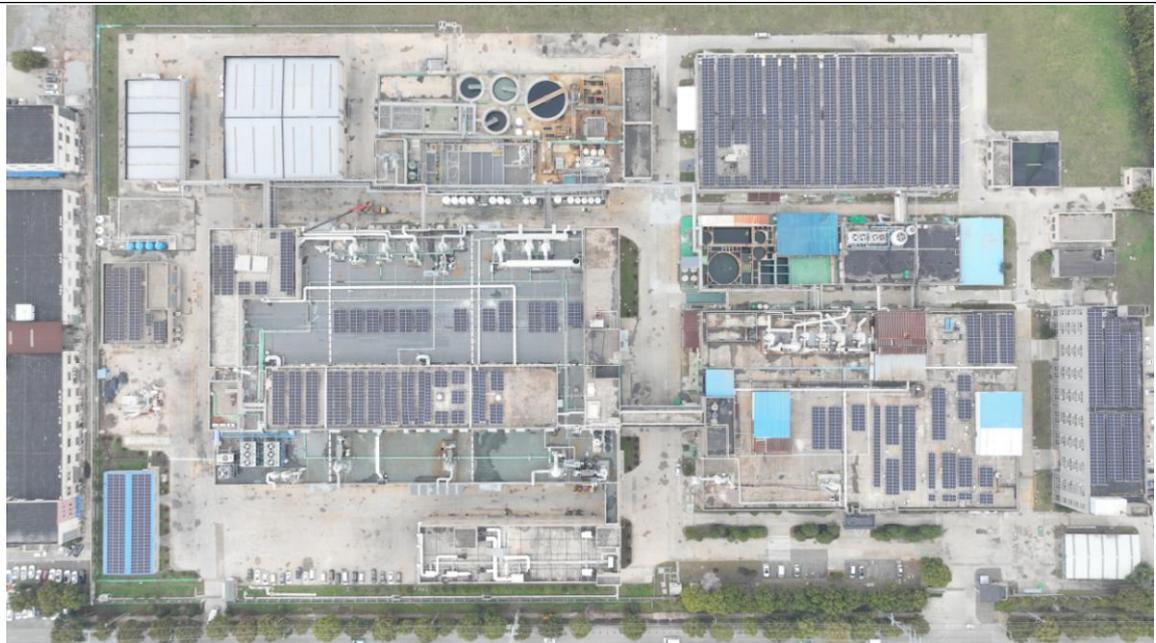

项目每周例会

项目安全例会

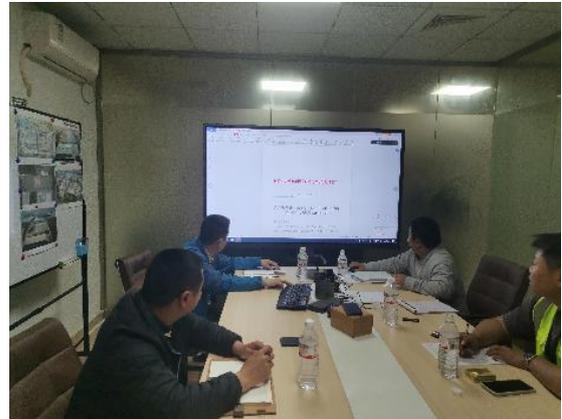

清洗系统通水

防雷接地标识涂刷



防火封堵完成



防火封堵

