

光伏项目工程建设周报

2023 年第 13 期

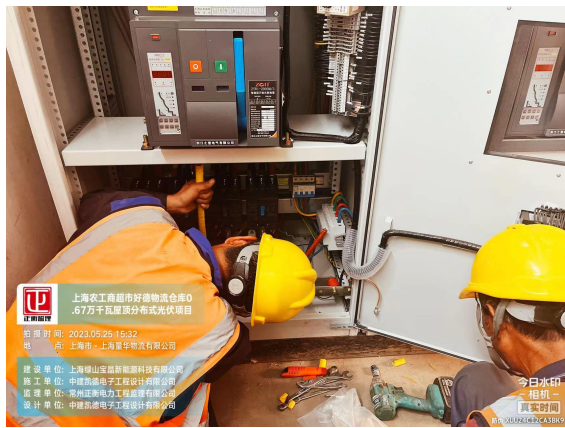
项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目		填报周期：2023 年 05 月 21 日--05 月 27 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%； 2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%； 3、组件安装完成（3.8）MWp，完成一期总量（76）%； 4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%； 5、场内集电线路共计（6666）米，电缆沟开挖（50）米，完成总量（50）%； 电缆敷设完成（5620）米，完成总量（84）%； 6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）； 7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日） 8、已并网发电（1.4）MW，完成总量（28）%； 9、本周安装完成容量（0.4）MW，并网容量（1）MW。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	不涉及	
2、开关站/升压站	未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。	
3、综合楼/附属建筑	不涉及	
4、场内桩基施工	一期桩基已完成 100%。	
5、支架及组件安装	本周支架安装 0mw，组件安装 0.4mw。	

6、逆变器及箱变	本周逆变器安装 0 台。		
7、送出工程（含对侧）	暂不涉及		
8、现场调试	暂未进行		
9、设备到货情况	组件到场 0 片。		
10、人员/机械情况	现场监理 1 人； 施工管理 4 人，施工 15 人； 施工机械：电焊机 1 台；		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及 赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2023. 3. 2	2023. 3. 2	
2、首套组件安装	2023. 3. 24	2023. 3. 24	
3、线路倒送电	2023. 5. 4	2023. 05. 17	
4、首个发电单元并网	2023. 5. 4	2023. 05. 17.	
5、全容量并网	2023. 5. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问	无。		

题	
未解决的协调问题 解决进展	无。
五、下周计划主要工作内容	
京东冷链、丙类仓库交、直流电缆敷设，电缆终端制作，检测调试、验收并网、消缺、整改；	

填报人： 刘德文 审核人： 奕卓 时间： 2023 年 05 月 27 日

工程现场照片：

	
每日早班会	好的常温 1mw 并网
	
交流电缆展放	冷链仓库并网柜安装
