

光伏项目工程建设周报

2023 年第 8 期

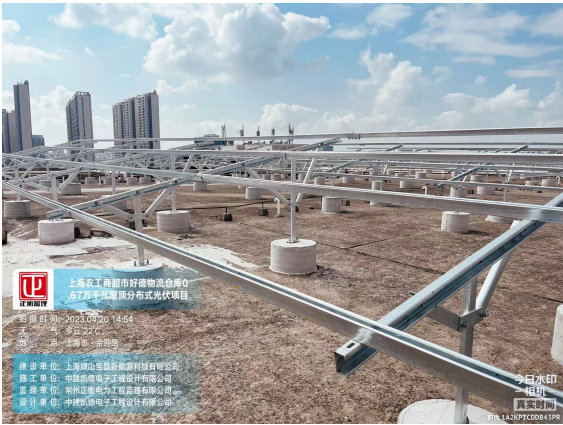
项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目		填报周期：2023 年 04 月 14 日--04 月 21 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%； 2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%； 3、组件安装完成（2.3）MWp，完成一期总量（46）%； 4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%； 5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里，完成总量（/）%； 电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%； 6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）； 7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日） 8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%； 9、本周安装完成容量（1.3）MW，并网容量（0）MW。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	不涉及	
2、开关站/升压站	未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。	
3、综合楼/附属建筑	不涉及	
4、场内桩基施工	一期桩基已完成 100%。	
5、支架及组件安装	本周支架安装 2.45mw, 组件安装 1.3mw.	

6、逆变器及箱变	逆变器支架、电缆桥架支架开始安装		
7、送出工程（含对侧）	暂不涉及		
8、现场调试	暂未进行		
9、设备到货情况	组件到场 3273 片，1.8mw。		
10、人员/机械情况	现场监理 1 人； 施工管理 4 人，施工 15 人； 施工机械：吊车 1 辆，叉车 1 辆，电焊机 1 台；		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2023. 3. 2	2023. 3. 2	
2、首套组件安装	2023. 3. 24		
3、线路倒送电	2023. 5. 4		
4、首个发电单元并网	2023. 5. 4		
5、全容量并网	2023. 5. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问	无。		

题	
未解决的协调问题 解决进展	无。
五、下周计划主要工作内容	
组件安装、消缺、三方质量验收；桥架、逆变器安装；直流电缆敷设；电缆沟开挖等。	

填报人： 刘德文 审核人： 奕卓 时间： 2023 年 04 月 21 日

工程现场照片：

	
每日早班会	支架安装质量检查
	
组件吊装	监理例会
