

光伏项目工程建设周报

2023 年 06 月第 3 期


项目名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		填报周期：2023 年 06 月 12 日--06 月 18 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架基础预制墩共计（1400）个，本期完成（1000）个，完成本期总量（71.4）%； 2、支架安装完成（3.2）MWp，完成本期总量（84.2）%； 3、组件安装完成（3.2）MWp，完成本期总量（84.2）%； 4、箱变、预制舱基础总计（4）基，开挖完成（4）基，砼浇筑完成（4）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%； 5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（1.5）公里，完成总量（100）%；电缆敷设完成（1.5）公里，完成总量（70）%； 6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（否）； 7、升压站原计划反送电时间：（2023 年 06 月 25 日），按建设进度计划时间（2023 年 06 月 25 日） 8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%； 9、本周安装完成容量（0）MW，并网容量（0）MW。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	/	
2、开关站/升压站	设备基础开挖、垫层浇筑、墙砖砌筑浇筑已完成。	
3、综合楼/附属建筑	/	
4、场内桩基施工	/	

5、支架及组件安装	完成彩钢瓦屋面 3.2 兆瓦支架及 3.2 兆瓦组件安装，混凝土屋面支架安装 60%。		
6、逆变器及箱变	完成彩钢瓦屋面 10 台逆变器安装，箱变基础砌筑完成。		
7、送出工程（含对侧）	未施工		
8、现场调试	未施工		
9、设备到货情况	支架、组件、逆变器、直流线缆、交流电缆已全部到货		
10、人员/机械情况	进场人员 15 人		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套支架安装	2023 年 5 月 16 日	2023 年 5 月 16 日	
2、首套组件安装	2023 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 28 日	
3、线路倒送电	2023 年 6 月 25 日		
4、首个发电单元并网	2023 年 6 月 29 日		
5、全容量并网	2023 年 6 月 29 日		
四、主要协调问题及解决情况			

提出需要协调的问题	
未解决的协调问题 解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1. 混凝土屋面支架及组件安装。2. 箱变、预制舱安装及设备调试。	

填报人： 魏巍 审核人： 高治斌 时间： 2023 年 06 月 18 日

工程现场照片：

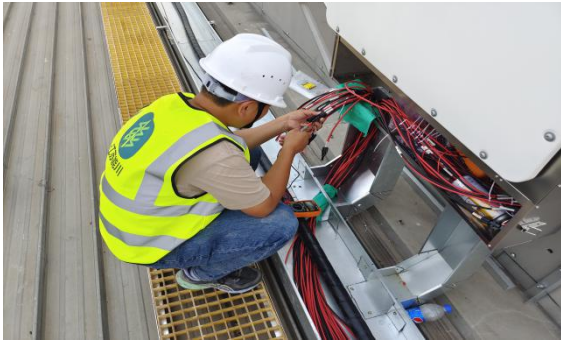
	
安全 检查	组串电压检测
	
混凝土屋面支架安装	
	
设备基础施工	



上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

工 序: 设备基础构造柱、圈梁钢筋验收 天 气: 阴 26°C
拍 摄 时 间: 2023.06.12 11:26 地 点: 青浦区·奎克化学(中国)有限公司
建 设 单 位: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 施 工 单 位: 宝胜系统集成科技股份有限公司
监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

设备基础圈梁浇筑前验收

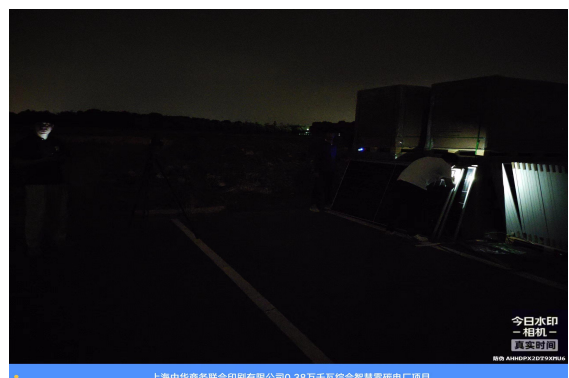

上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

工 序: 组件检测 地 点: 青浦区·上海中华商务联合印刷有限公司
拍 摄 时 间: 2023.06.13 22:06 天 气: 阴 22°C
建 设 单 位: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 施 工 单 位: 宝胜系统集成科技股份有限公司
监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

组件检测



上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

工 序: 支架材料镀锌厚度测量 天 气: 阴 25°C
拍 摄 时 间: 2023.06.12 10:20 地 点: 青浦区·上海中华商务联合印刷有限公司
建 设 单 位: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 施 工 单 位: 宝胜系统集成科技股份有限公司
监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司



上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

工 序: 支架材料镀锌厚度测量 天 气: 阴 25°C
拍 摄 时 间: 2023.06.12 10:22 地 点: 青浦区·奎克化学(中国)有限公司
建 设 单 位: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 施 工 单 位: 宝胜系统集成科技股份有限公司
监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

支架镀锌厚度检测



5 点式安全带及防坠器安全学习



上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

工 序: 支架安装 地 点: 青浦区·上海中华商务联合印刷有限公司
拍 摄 时 间: 2023.06.15 15:43 天 气: 阴 31°C
建 设 单 位: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 施 工 单 位: 宝胜系统集成科技股份有限公司
监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

支架安装
