

工程进度汇报

项目名称	宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2023年05月26日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	75天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	100% 0%		
本周下雨天数	0天	实际可施工天数	7天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、图纸会审及交底已进行。2、项目部已落实。初步具备开会和办公条件。3、项目部五牌一图已制作完成，带落实具体位置后安装展示。4、项目首次例会召开，对项目部建设、开工前资料完善、施工安全和质量要求等进行明确要求。5、材料和设备品牌落实及开始采购。		
投资情况	本周没有材料及设备进场；施工劳务也没有进场；累计完成约0万元，约占总合同价的约0%(按合同价352.81万元计算)。		
下步计划	<p>下周计划：</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工人员进场，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，完成月20-30%。3、并网柜基础基坑进行定位放线完成100%。4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全文明施工措施。		
周工作小结	继续做好防消防和其他安全的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施；项目部建立并进行布置。屋顶安装等开始施工。		
需要协调问题	1、沟通协调好檩条安装方案；		

目前进度：

1、图纸会审及交底已进行。

2、项目部已落实，初步具备开会和办公条件；项目部五牌一图已制作完成，带落实具体位置后安装展示。

3、项目首次例会召开，对项目部建设、开工前资料完善、施工安全和质量要求等进行明确要求。

4、材料和设备品牌落实及开始采购。

投资情况：

本周没有材料及设备进场；施工劳务也没有进场；累计完成约0万元，约占总合同价的约0%(按合同价352.81万元计算)。

下步计划：

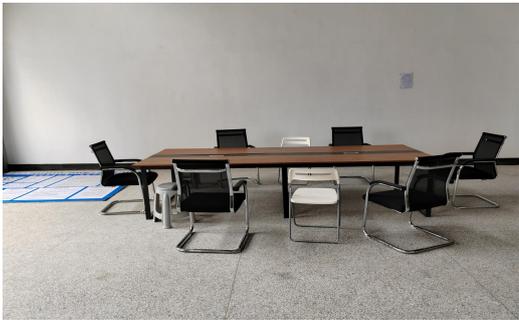
1、施工人员进场，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。

2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，完成月20-30%。

3、并网柜基础基坑进行定位放线完成100%。

4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全文明施工措施。

附现场照片：

文字描述	项目部会议桌设置完成	图纸进行会审中
照片		
文字描述	项目部成立五牌一图	五牌一图待安装
照片		
